



























	Jméno	Trvání	Začátek	Konec	Předchůdci	Jména zdrojů
1		Uzavření smlouvy o realizaci	3 dny	20.6.12 7:00	22.6.12 17:00		
2		Předání staveniště	3 dny	2.7.12 7:00	4.7.12 17:00	1	
3		Zpracování RDS včetně sc...	39 dny	22.6.12 7:00	15.8.12 17:00		
4		Pasportizace dotčených o...	13 dny	22.6.12 7:00	10.7.12 17:00		
5		Vybudování a likvidace ZS	37 dny	20.6.12 7:00	9.8.12 17:00		
6		Vytyčení podzemních sítí v ...	34 dny	20.6.12 7:00	6.8.12 17:00		
7		Provozní řád snižování hla...	19 dny	22.6.12 7:00	18.7.12 17:00		
8		Provizor.dopravní značení ...	12 dny	25.6.12 7:00	10.7.12 17:00		
9		<b>ISO 020 - Příprava stav...</b>	<b>52 dny</b>	<b>2.7.12 7:00</b>	<b>11.9.12 17:00</b>		
10		Kácení zeleně	11 dny	5.7.12 7:00	19.7.12 17:00		
11		Zemní práce	27 dny	5.7.12 7:00	10.8.12 17:00		
12		Ostatní konstrukce - bou...	39 dny	19.7.12 7:00	11.9.12 17:00		
13		Konstrukce zámečnické	6 dny	2.7.12 7:00	9.7.12 17:00		
14		<b>ISO 006 Přemístění ohří...</b>	<b>80 dny</b>	<b>16.7.12 7:00</b>	<b>2.11.12 17:00</b>		
15		Celý objekt	80 dny	16.7.12 7:00	2.11.12 17:00		
16		<b>ISO 101.1 - Větev A - ko...</b>	<b>151 dny</b>	<b>1.11.12 7:00</b>	<b>30.5.13 17:00</b>		
17		Zemní práce	111 dny	1.11.12 7:00	4.4.13 17:00		
18		Zakládání	78 dny	18.11.12 7:00	6.3.13 17:00		
19		Komunikace	139 dny	18.11.12 7:00	30.5.13 17:00		
20		Trubní vedení	83 dny	19.11.12 7:00	13.3.13 17:00		
21		Ostatní konstrukce - bou...	74 dny	1.11.12 7:00	12.2.13 17:00		
22		<b>ISO 101.2 - Větev A - ch...</b>	<b>57 dny</b>	<b>1.3.13 7:00</b>	<b>20.5.13 17:00</b>		
23		Zemní práce	42 dny	1.3.13 7:00	29.4.13 17:00		
24		Komunikace	46 dny	17.3.13 7:00	20.5.13 17:00		
25		Ostatní konstrukce - bou...	23 dny	11.3.13 7:00	10.4.13 17:00		
26		<b>ISO 101.3 - Větev A1 - k...</b>	<b>50,88 dny</b>	<b>1.4.13 7:00</b>	<b>10.6.13 16:00</b>		
27		Zemní práce	23 dny	8.5.13 16:00	10.6.13 16:00		
28		Zakládání	12 dny	13.4.13 7:00	30.4.13 17:00		
29		Komunikace	38 dny	13.4.13 7:00	5.6.13 17:00		
30		Trubní vedení	19 dny	13.4.13 7:00	9.5.13 17:00		
31		Ostatní konstrukce - bou...	33 dny	1.4.13 7:00	15.5.13 17:00		
32		Isolace - voda,vlhkost,plyn	10 dny	22.4.13 7:00	3.5.13 17:00		
33		<b>ISO 102.1 - Komunikace...</b>	<b>84 dny</b>	<b>2.5.13 7:00</b>	<b>27.8.13 17:00</b>		
34		Zemní práce	60 dny	2.5.13 7:00	24.7.13 17:00		









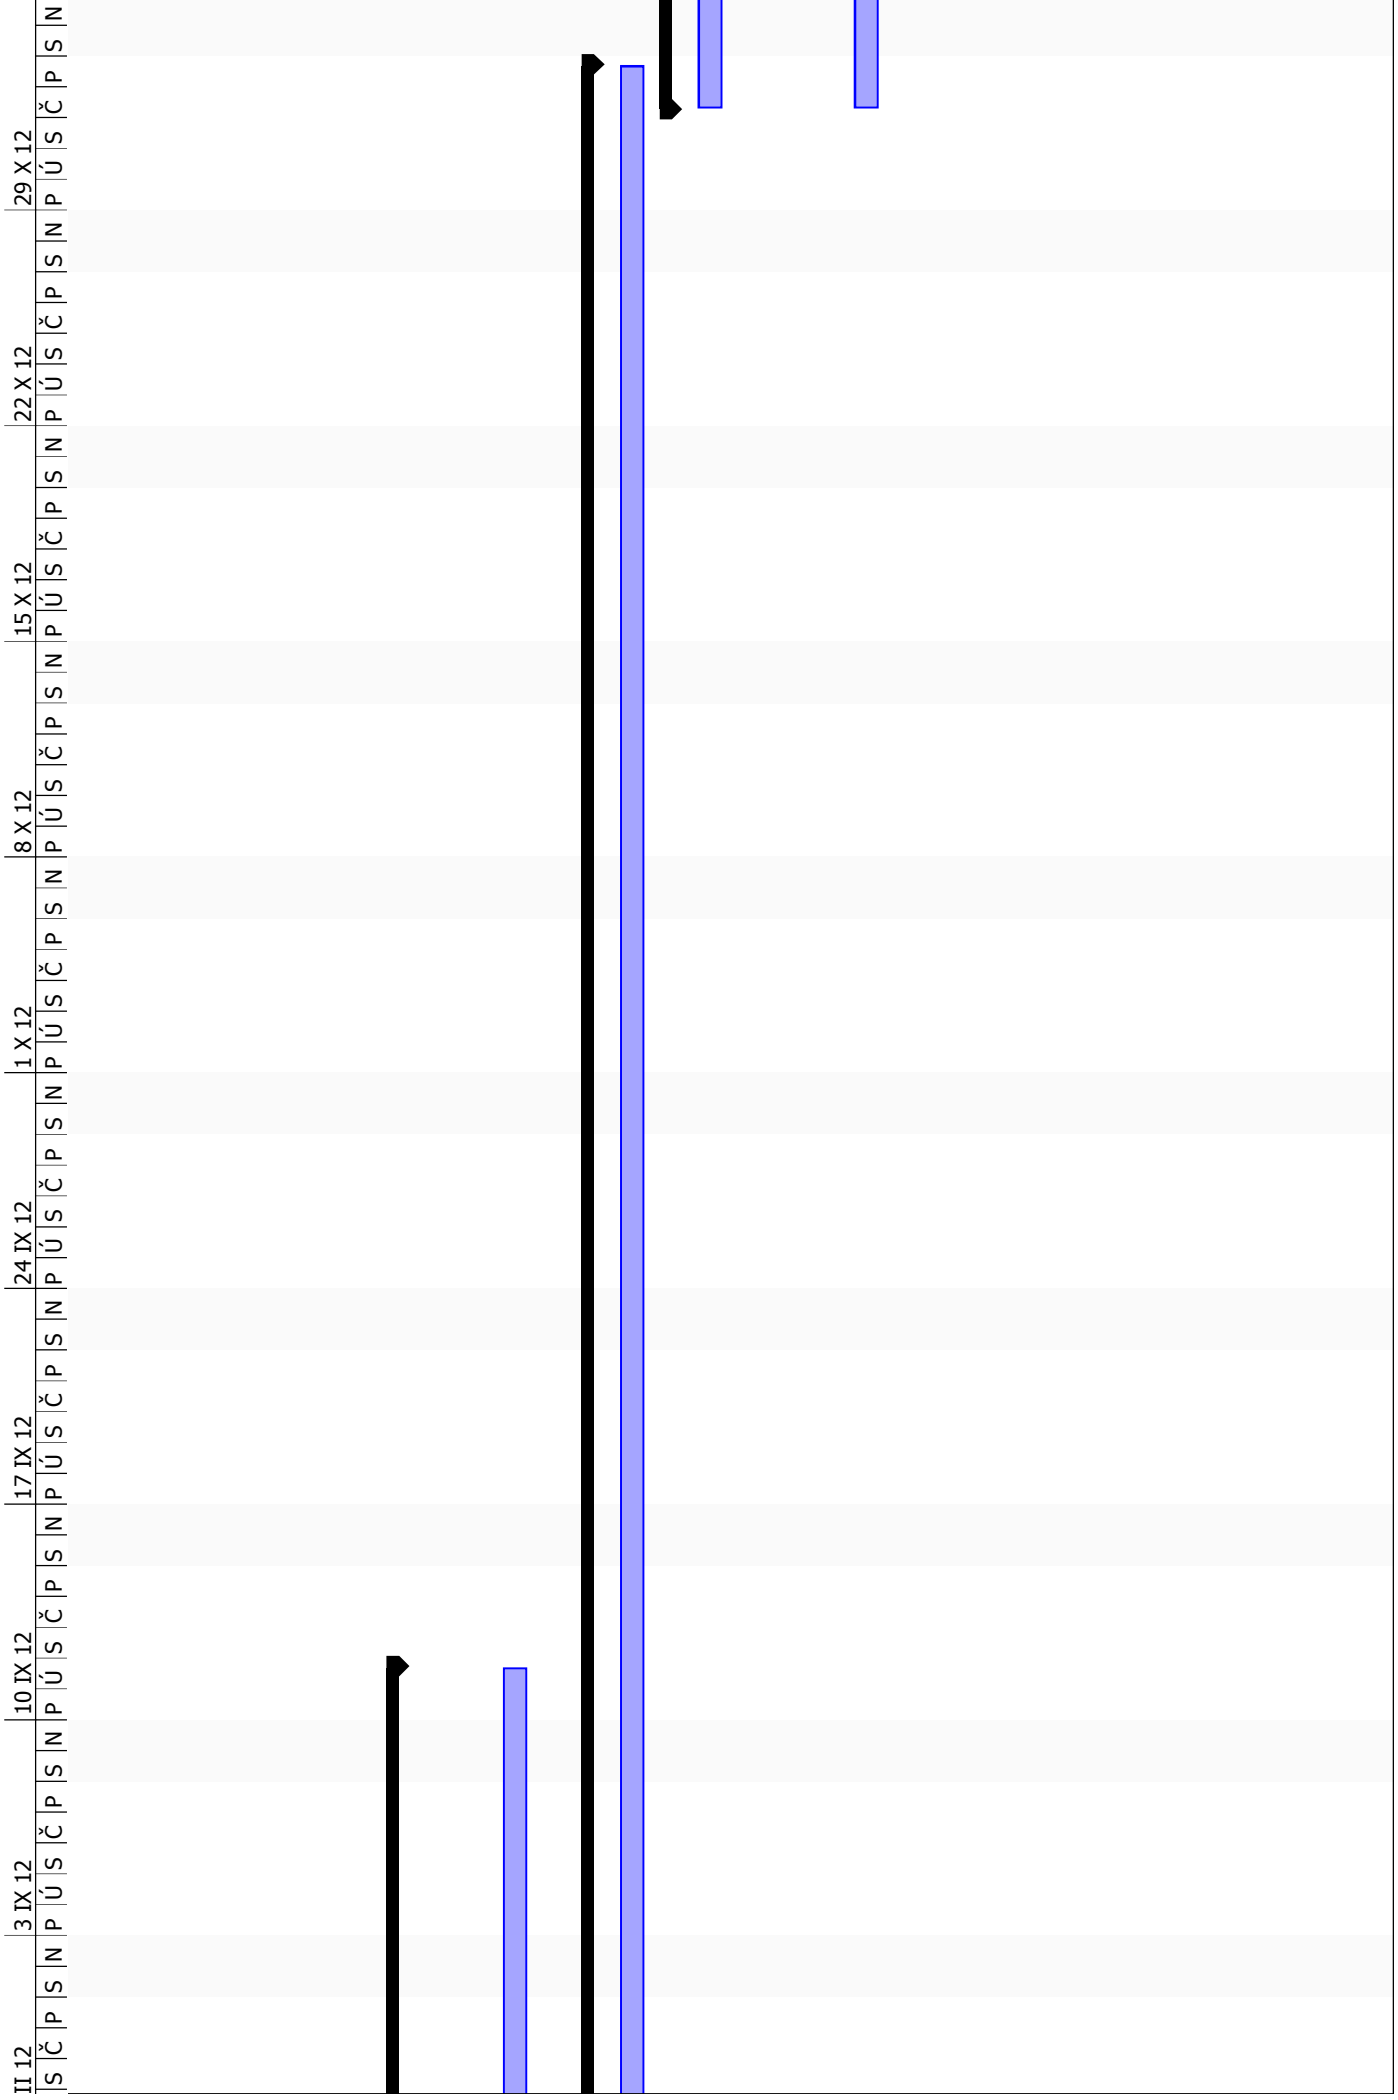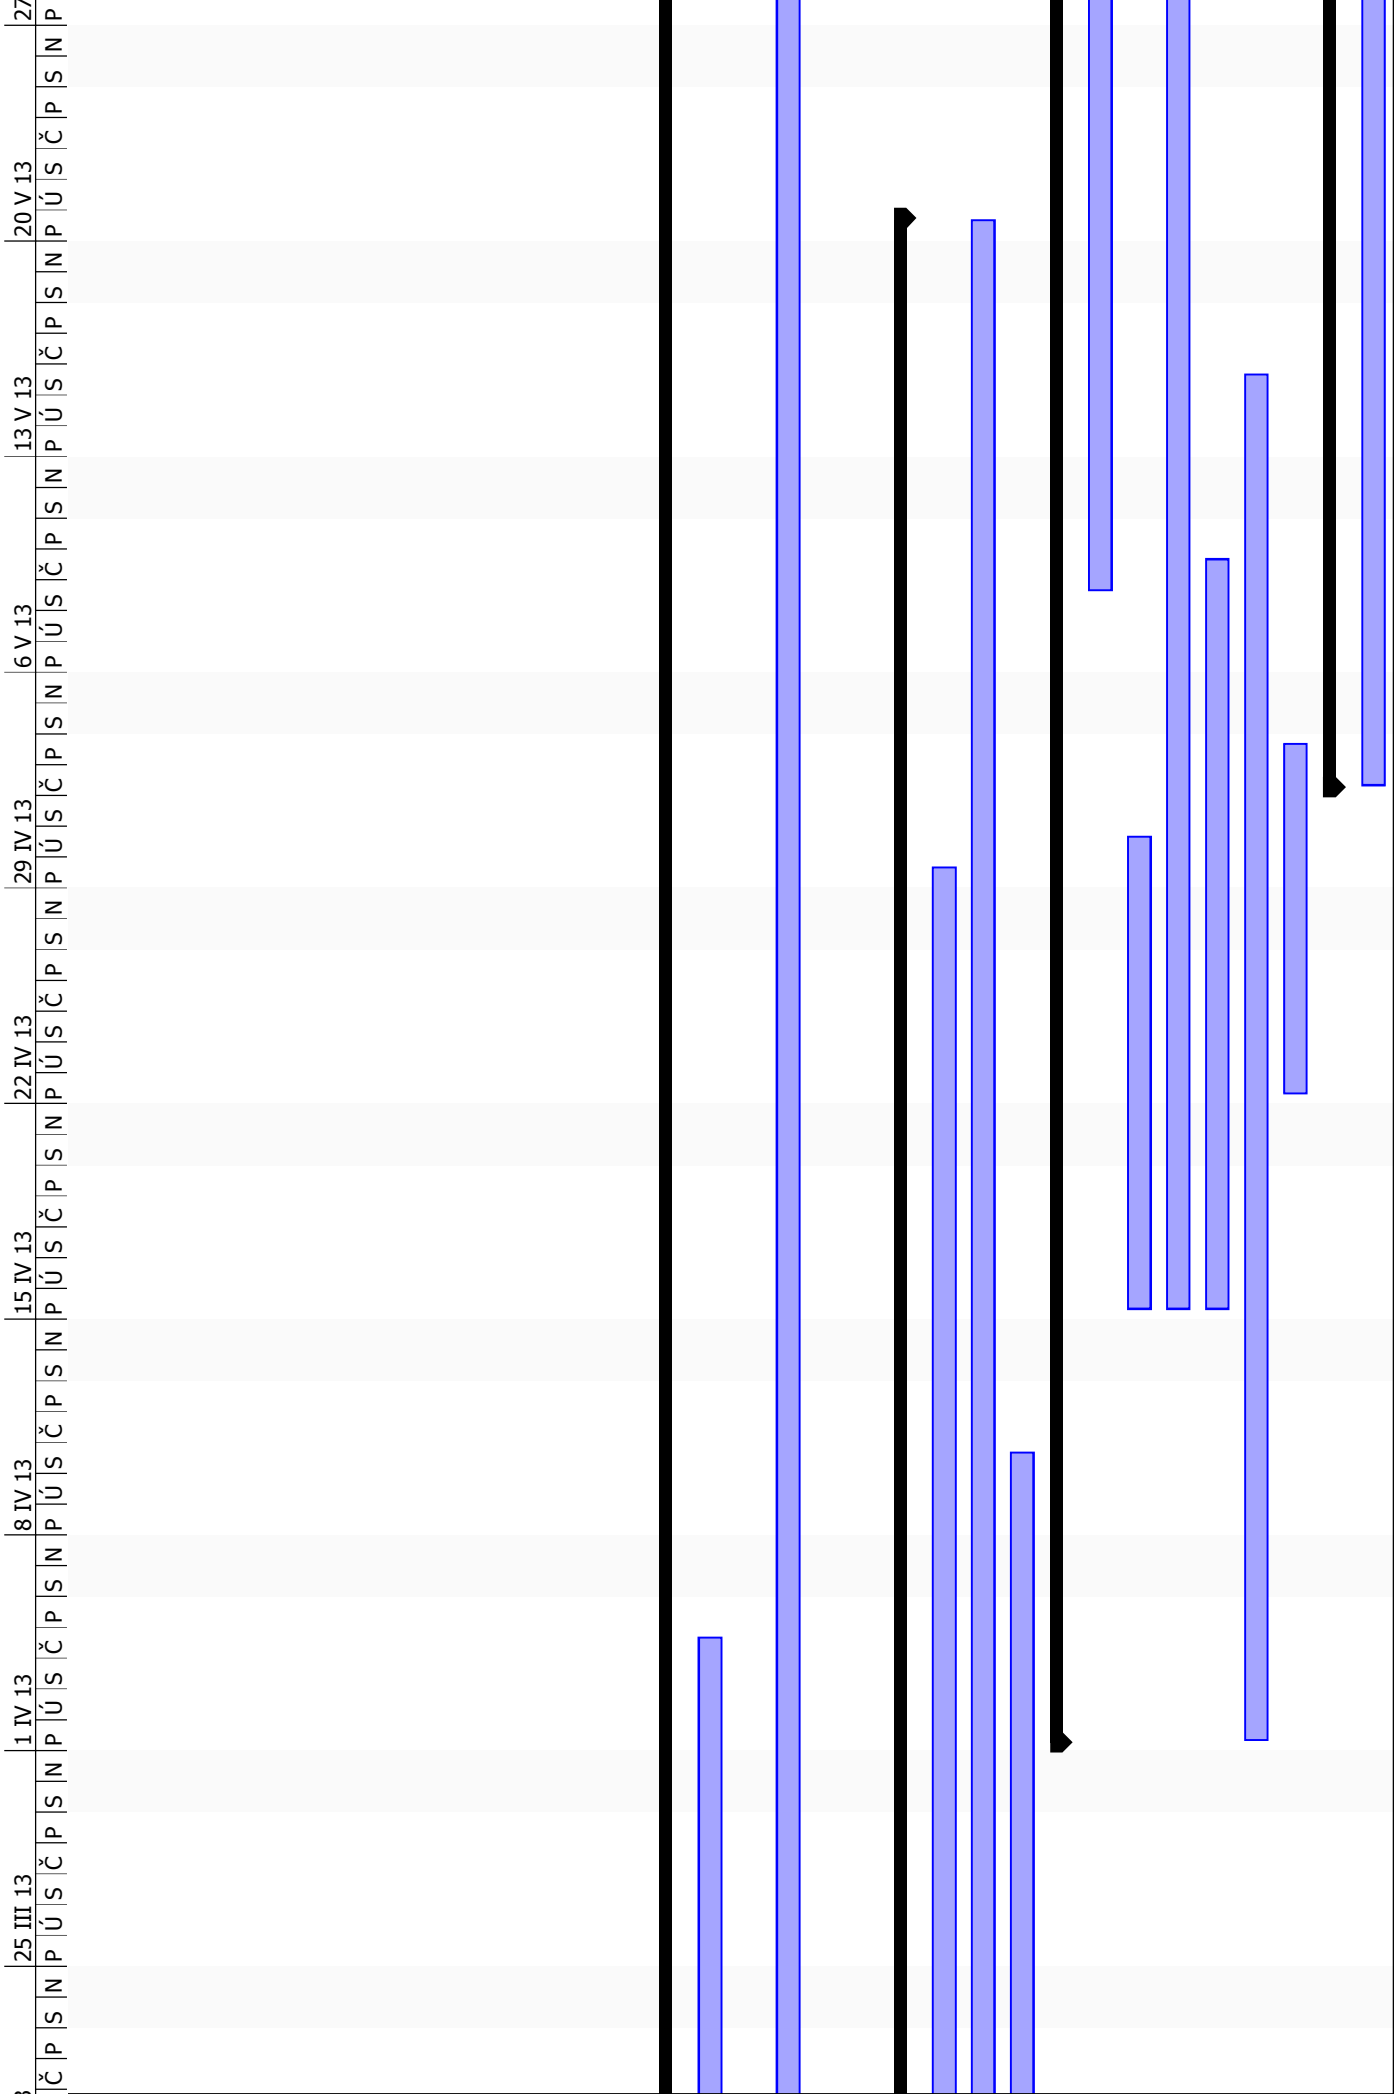














S	N	P	Ú	S	Č	P	S	N	P	Ú	S	Č	P	S	N	P	Ú	S
5 V 14																		
S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S																		
12 V 14																		
S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S																		
19 V 14																		
S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S																		
26 V 14																		
S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S																		

		Jméno	Trvání	Začátek	Konec	Předchůdci	Jména zdrojů
35		Zakládání	77 dní	6.5.13 7:00	20.8.13 17:00		
36		Komunikace	82 dní	6.5.13 7:00	27.8.13 17:00		
37		Trubní vedení	25 dní	2.5.13 7:00	5.6.13 17:00		
38		Ostatní konstrukce - bou...	55 dní	6.5.13 7:00	19.7.13 17:00		
39		<b>ISO 102.2 - Chodníky - v...</b>	<b>80 dní</b>	<b>12.5.13 7:00</b>	<b>30.8.13 17:00</b>		
40		Zemní práce	65 dní	12.5.13 7:00	9.8.13 17:00		
41		Komunikace	77 dní	16.5.13 7:00	30.8.13 17:00		
42		Ostatní konstrukce - bou...	70 dní	16.5.13 7:00	21.8.13 17:00		
43		<b>ISO 103.1 - Komunikace...</b>	<b>67 dní?</b>	<b>10.6.13 7:00</b>	<b>10.9.13 17:00</b>		
44		Zemní práce	28 dní	10.6.13 7:00	17.7.13 17:00		
45		Zakládání	8 dní	30.6.13 7:00	10.7.13 17:00		
46		Komunikace	52 dní	30.6.13 7:00	10.9.13 17:00		
47		Trubní vedení	33 dní	20.6.13 7:00	5.8.13 17:00		
48		Ostatní konstrukce - bou...	40 dní?	23.6.13 7:00	16.8.13 17:00		
49		<b>ISO 103.2 - Přeložky ve...</b>	<b>27 dní</b>	<b>23.7.12 7:00</b>	<b>28.8.12 17:00</b>		
50		Montáže potrubí	27 dní	23.7.12 7:00	28.8.12 17:00		
51		<b>ISO 104.1 - Komunikace...</b>	<b>52 dní</b>	<b>24.9.12 7:00</b>	<b>4.12.12 17:00</b>		
52		Zemní práce	20 dní	30.9.12 7:00	26.10.12 17:00		
53		Zakládání	18 dní	1.10.12 7:00	24.10.12 17:00		
54		Komunikace	52 dní	24.9.12 7:00	4.12.12 17:00	50;71	
55		Trubní vedení	12 dní	16.10.12 8:00	31.10.12 17:00	72FS-1 den	
56		Ostatní konstrukce - bou...	27 dní	24.9.12 7:00	30.10.12 17:00		
57		<b>ISO 104.2 - Zpevněná pl...</b>	<b>34 dní</b>	<b>3.6.13 7:00</b>	<b>18.7.13 17:00</b>		
58		Zemní práce	25 dní	9.6.13 7:00	12.7.13 17:00		
59		Zakládání	14 dní	24.6.13 7:00	11.7.13 17:00		
60		Komunikace	24 dní	17.6.13 7:00	18.7.13 17:00		
61		Trubní vedení	10 dní	24.6.13 7:00	5.7.13 17:00		
62		Ostatní konstrukce - bou...	31 dní	3.6.13 7:00	15.7.13 17:00		
63		<b>ISO 105 - Parkoviště pr...</b>	<b>67 dní</b>	<b>11.7.13 7:00</b>	<b>11.10.13 17:00</b>		
64		Zemní práce	39 dní	11.7.13 7:00	3.9.13 17:00		
65		Zakládání	32 dní	23.7.13 7:00	4.9.13 17:00		
66		Komunikace	30 dní	1.9.13 7:00	11.10.13 17:00		
67		Trubní vedení	14 dní	17.8.13 7:00	5.9.13 17:00		
68		Ostatní konstrukce - bou...	35 dní	15.7.13 7:00	30.8.13 17:00		



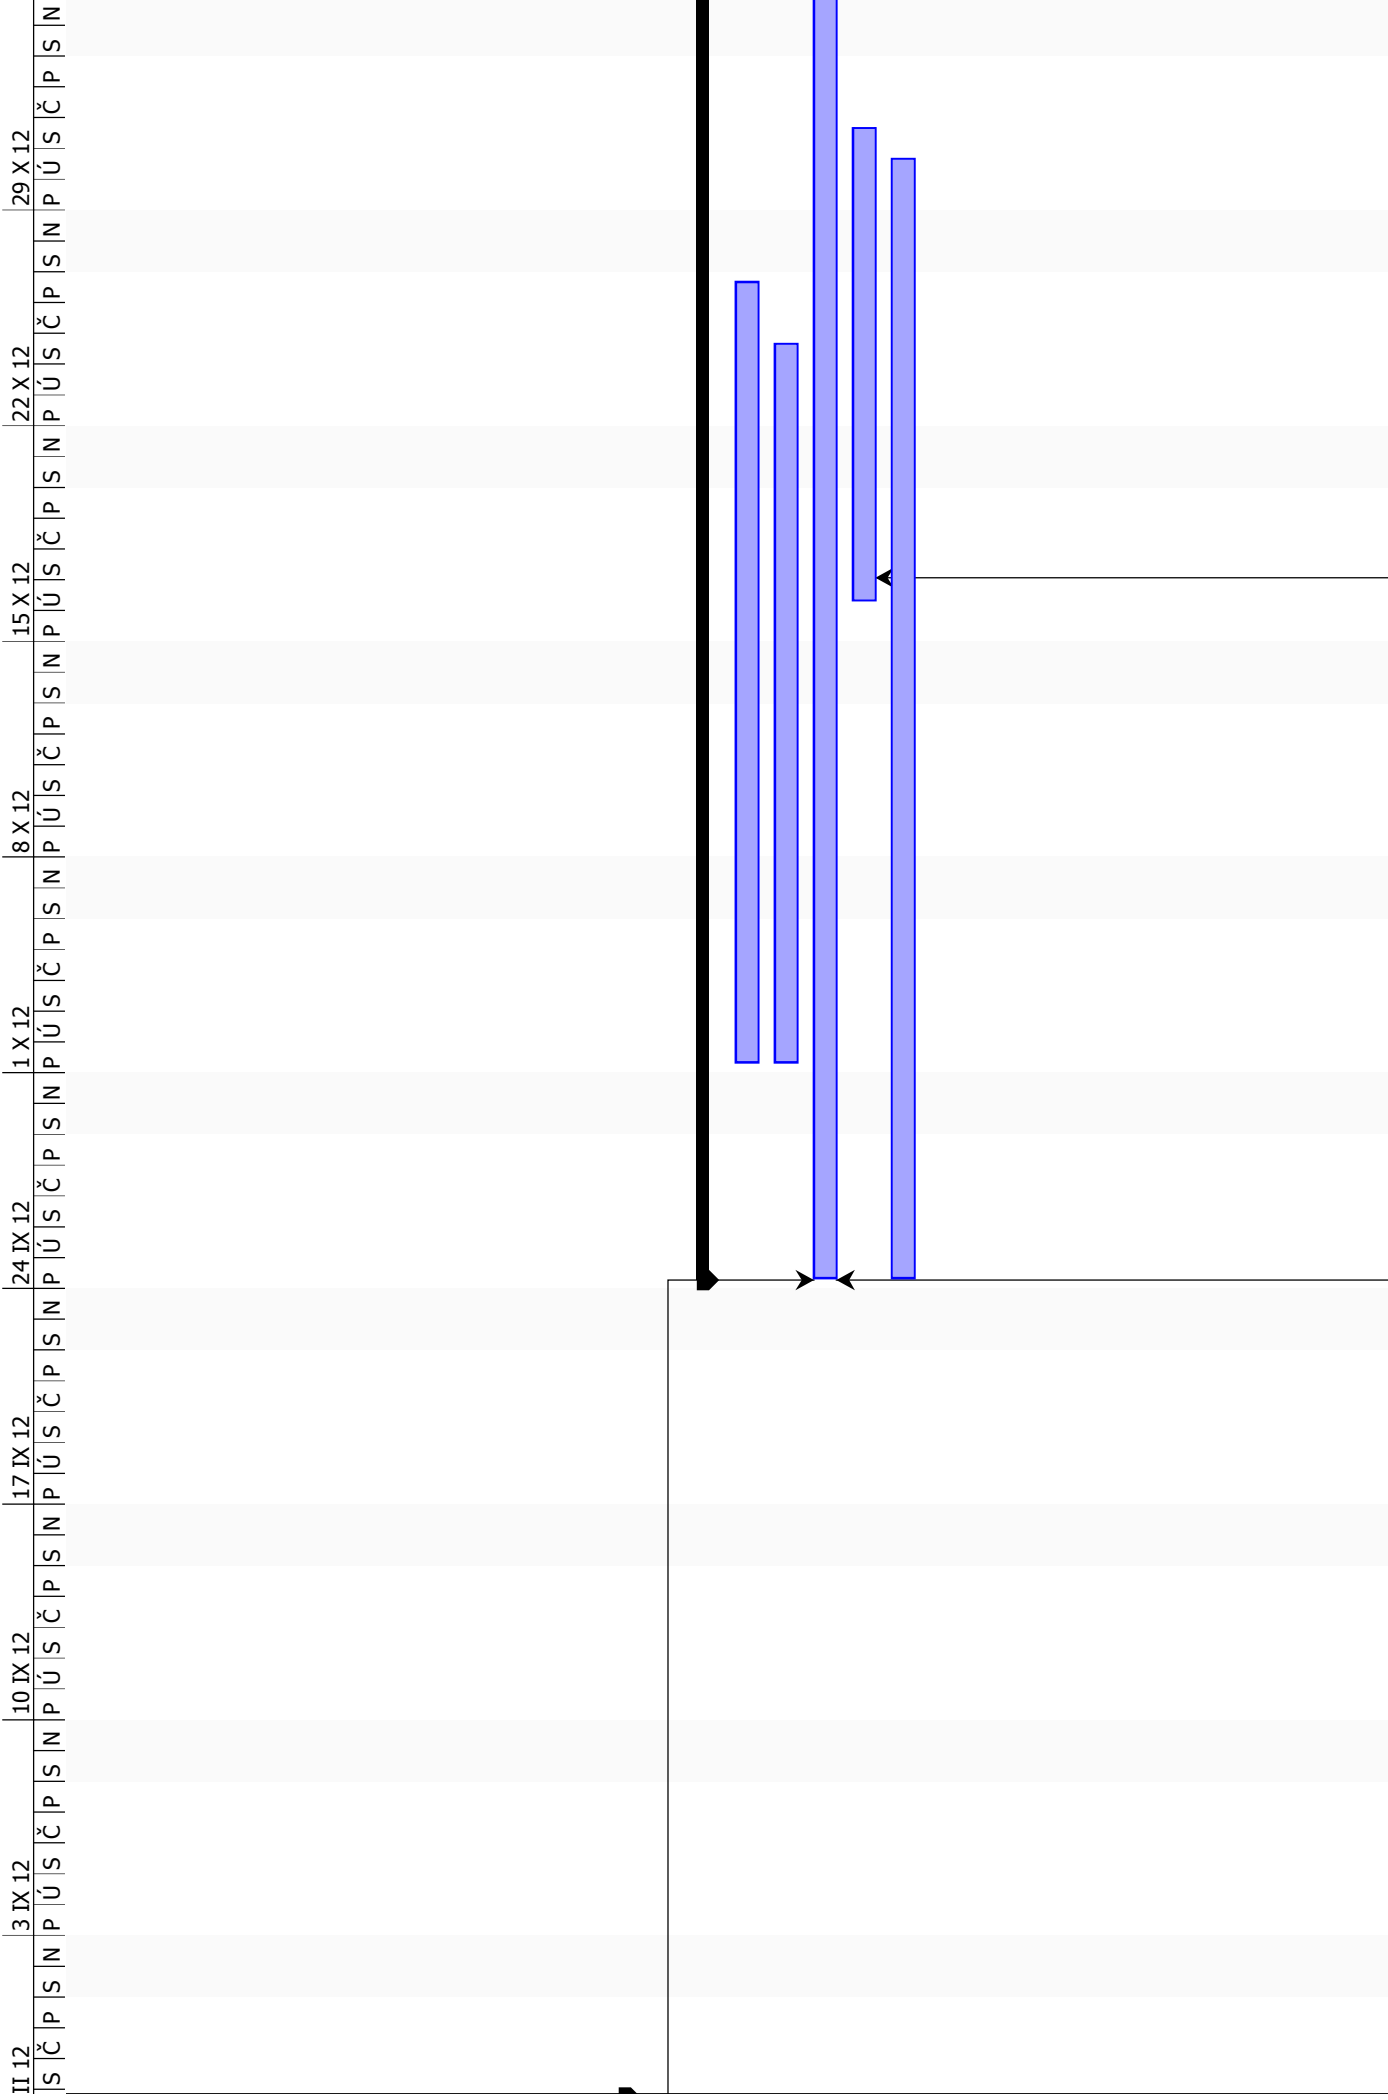


















24 II 14	3 III 14	10 III 14	17 III 14	24 III 14	31 III 14	7 IV 14	14 IV 14	21 IV 14	28 IV 14
P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P	P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P	P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P	P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P	P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P	P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P	P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P	P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P	P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P	P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P


S	N	P	Ú	S	Č	P	S	N	P	Ú	S	Č	P	S	N	P	Ú	S
5 V 14																		
S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S																		
12 V 14																		
S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S																		
19 V 14																		
S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S																		
26 V 14																		
S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S																		




		Jméno	Trvání	Začátek	Konec	Předchůdci	Jména zdrojů
69		<b>ISO 106 - Zpevněné plo...</b>	<b>37 dní</b>	<b>27.8.12 7:00</b>	<b>16.10.12 17:00</b>		
70		Zemní práce	20 dní	27.8.12 7:00	21.9.12 17:00		
71		Zakládání	12 dní	5.9.12 7:00	20.9.12 17:00		
72		Komunikace	26 dní	11.9.12 7:00	16.10.12 17:00		
73		Ostatní konstrukce - bou...	21 dní	3.9.12 7:00	1.10.12 17:00		
74		<b>ISO 107 - Silniční váha</b>	<b>44 dní</b>	<b>1.10.12 7:00</b>	<b>29.11.12 17:00</b>		
75		Zemní práce	10 dní	1.10.12 7:00	12.10.12 17:00	87	
76		Zakládání	10 dní	1.10.12 7:00	12.10.12 17:00	86	
77		Komunikace	8 dní	8.10.12 7:00	17.10.12 17:00		
78		Ostatní konstrukce - bou...	34 dní	15.10.12 7:00	29.11.12 17:00		
79		<b>ISO 301 - Dešťová kana...</b>	<b>138 dní</b>	<b>16.7.12 7:00</b>	<b>23.1.13 17:00</b>		
80		Zemní práce	126 dní	16.7.12 7:00	7.1.13 17:00		
81		Zakládání	116 dní	19.7.12 7:00	27.12.12 17:00		
82		Vodorovné konstrukce	116 dní	19.7.12 7:00	27.12.12 17:00		
83		Trubní vedení	106 dní	22.7.12 7:00	17.12.12 17:00		
84		Ostatní konstrukce - bou...	22 dní	25.12.12 8:00	23.1.13 17:00	82FS-3 dní	
85		<b>ISO 302.1 - Propojení st...</b>	<b>52 dní</b>	<b>23.7.12 7:00</b>	<b>2.10.12 17:00</b>		
86		Zemní práce	28 dní	23.7.12 7:00	29.8.12 17:00		
87		Zakládání	14 dní	6.8.12 7:00	23.8.12 17:00		
88		Svislé a kompletní konstr...	30 dní	13.8.12 7:00	21.9.12 17:00		
89		Vodorovné konstrukce	15 dní	6.8.12 7:00	24.8.12 17:00		
90		Úpravy povrchů,podlahy...	20 dní	3.9.12 7:00	28.9.12 17:00	87	
91		Trubní vedení	8 dní	17.9.12 7:00	26.9.12 17:00	87;89	
92		Ostatní konstrukce - bou...	29 dní	30.7.12 7:00	6.9.12 17:00		
93		Isolace - voda,vlhkost,plyn	7 dní	24.9.12 7:00	2.10.12 17:00		
94		<b>ISO 302.2 - Přeložka jed...</b>	<b>87 dní</b>	<b>1.10.12 7:00</b>	<b>29.1.13 17:00</b>		
95		Zemní práce	87 dní	1.10.12 8:00	29.1.13 17:00	91;90	
96		Vodorovné konstrukce	78 dní	1.10.12 7:00	16.1.13 17:00	92;86	
97		Trubní vedení	78 dní	1.10.12 7:00	16.1.13 17:00		
98		<b>ISO 303 - Přeložka vodo...</b>	<b>90 dní</b>	<b>3.9.12 7:00</b>	<b>4.1.13 17:00</b>		
99		Zemní práce	90 dní	3.9.12 7:00	4.1.13 17:00	113	
100		Zakládání	83 dní	3.9.12 7:00	26.12.12 17:00	115;87	
101		Vodorovné konstrukce	83 dní	3.9.12 7:00	26.12.12 17:00		
102		Trubní vedení	83 dní	3.9.12 7:00	26.12.12 17:00		



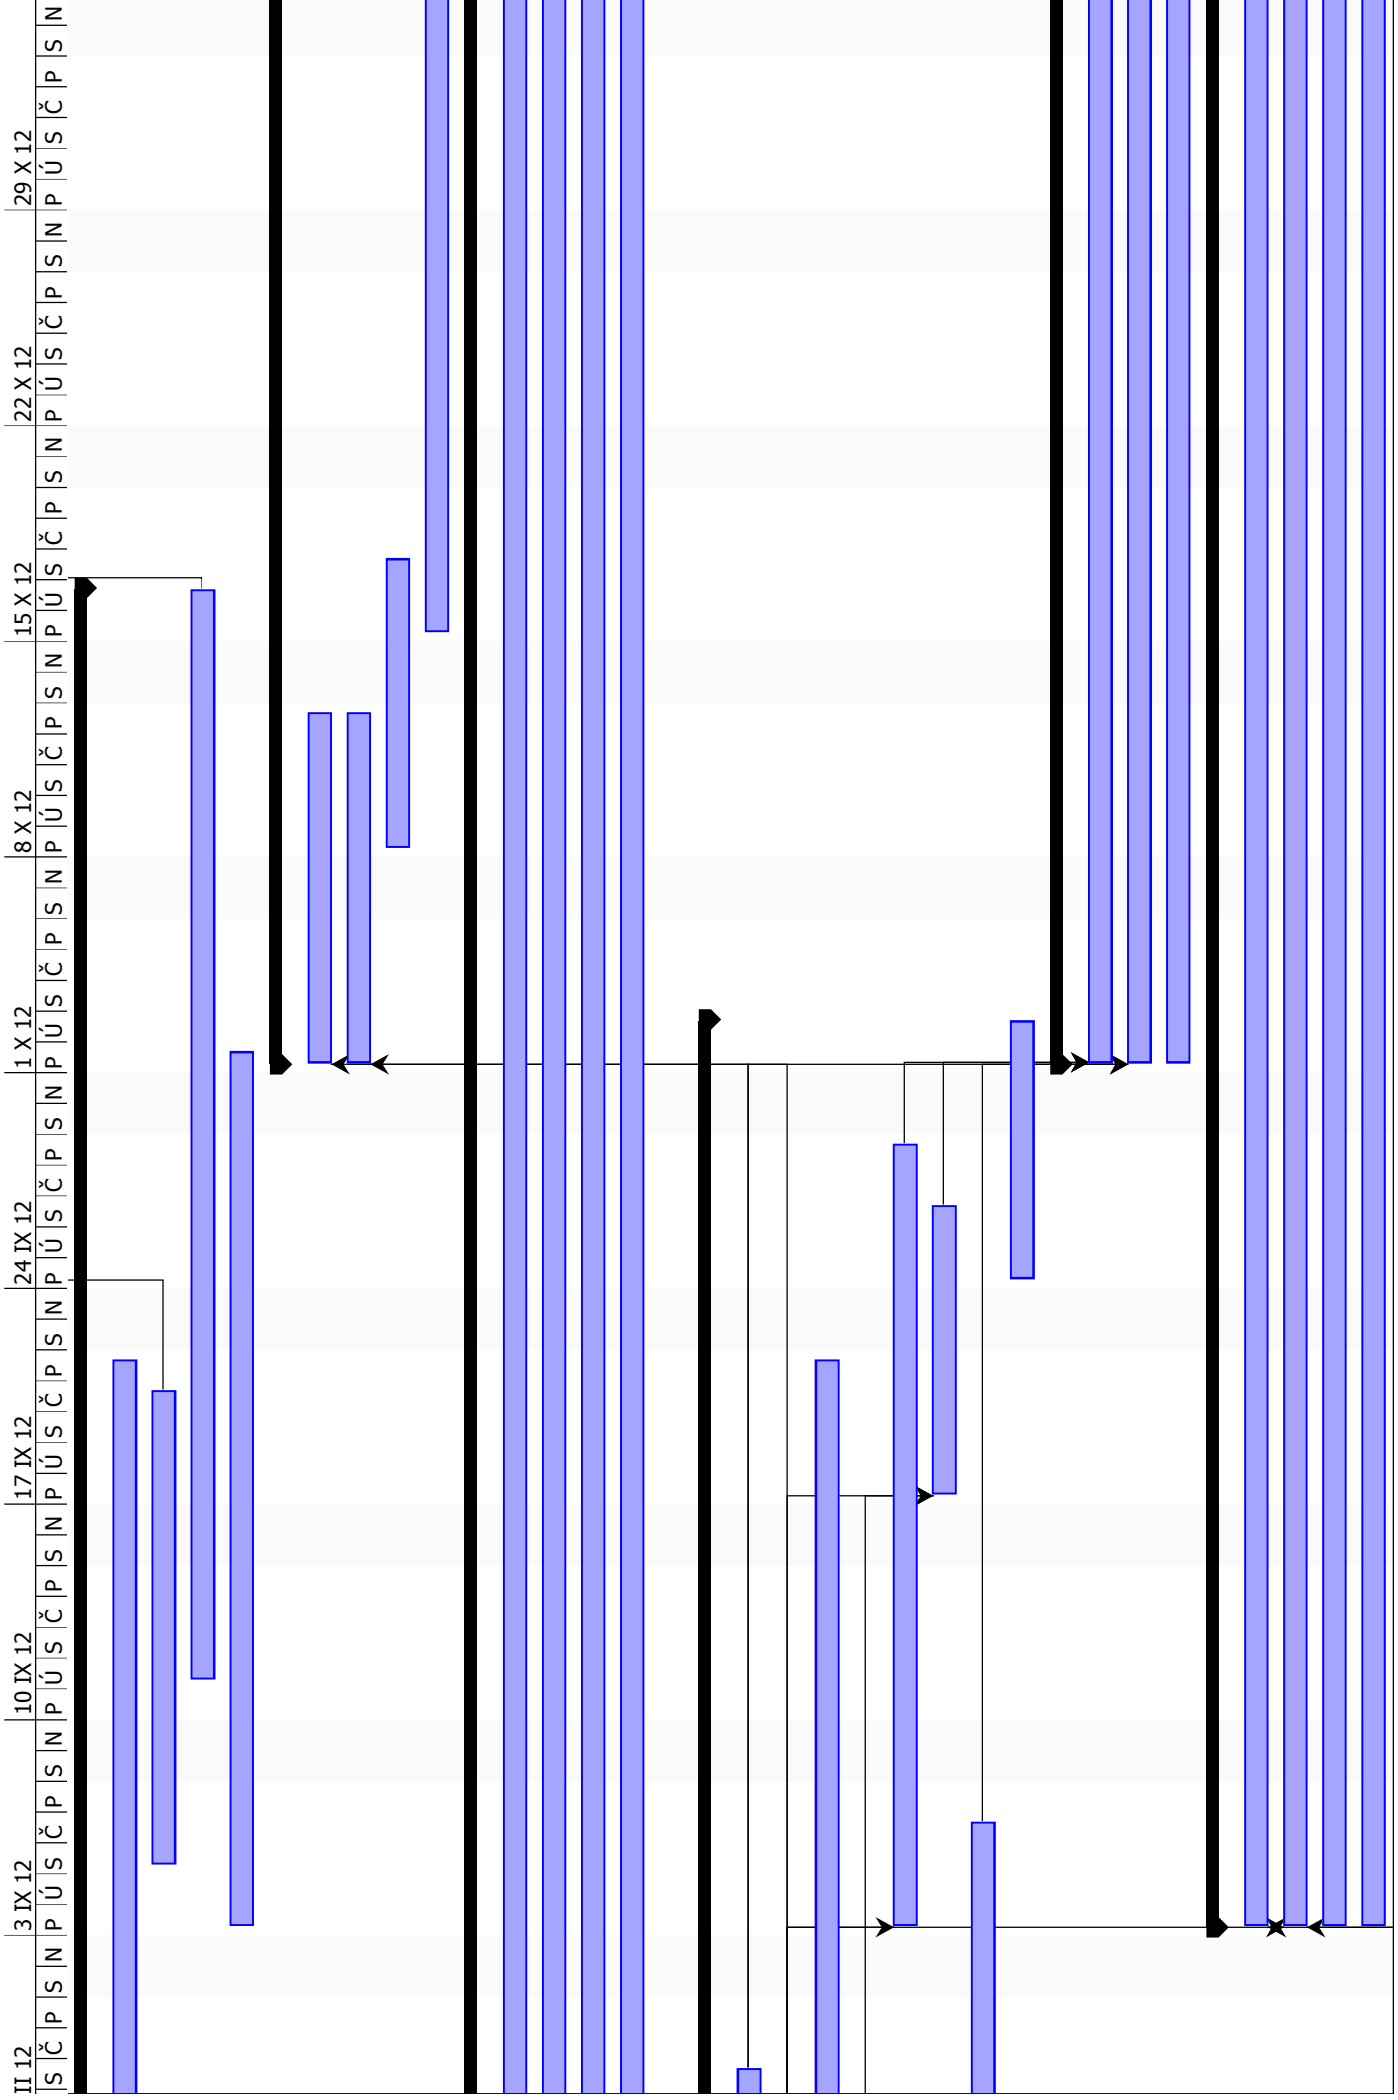

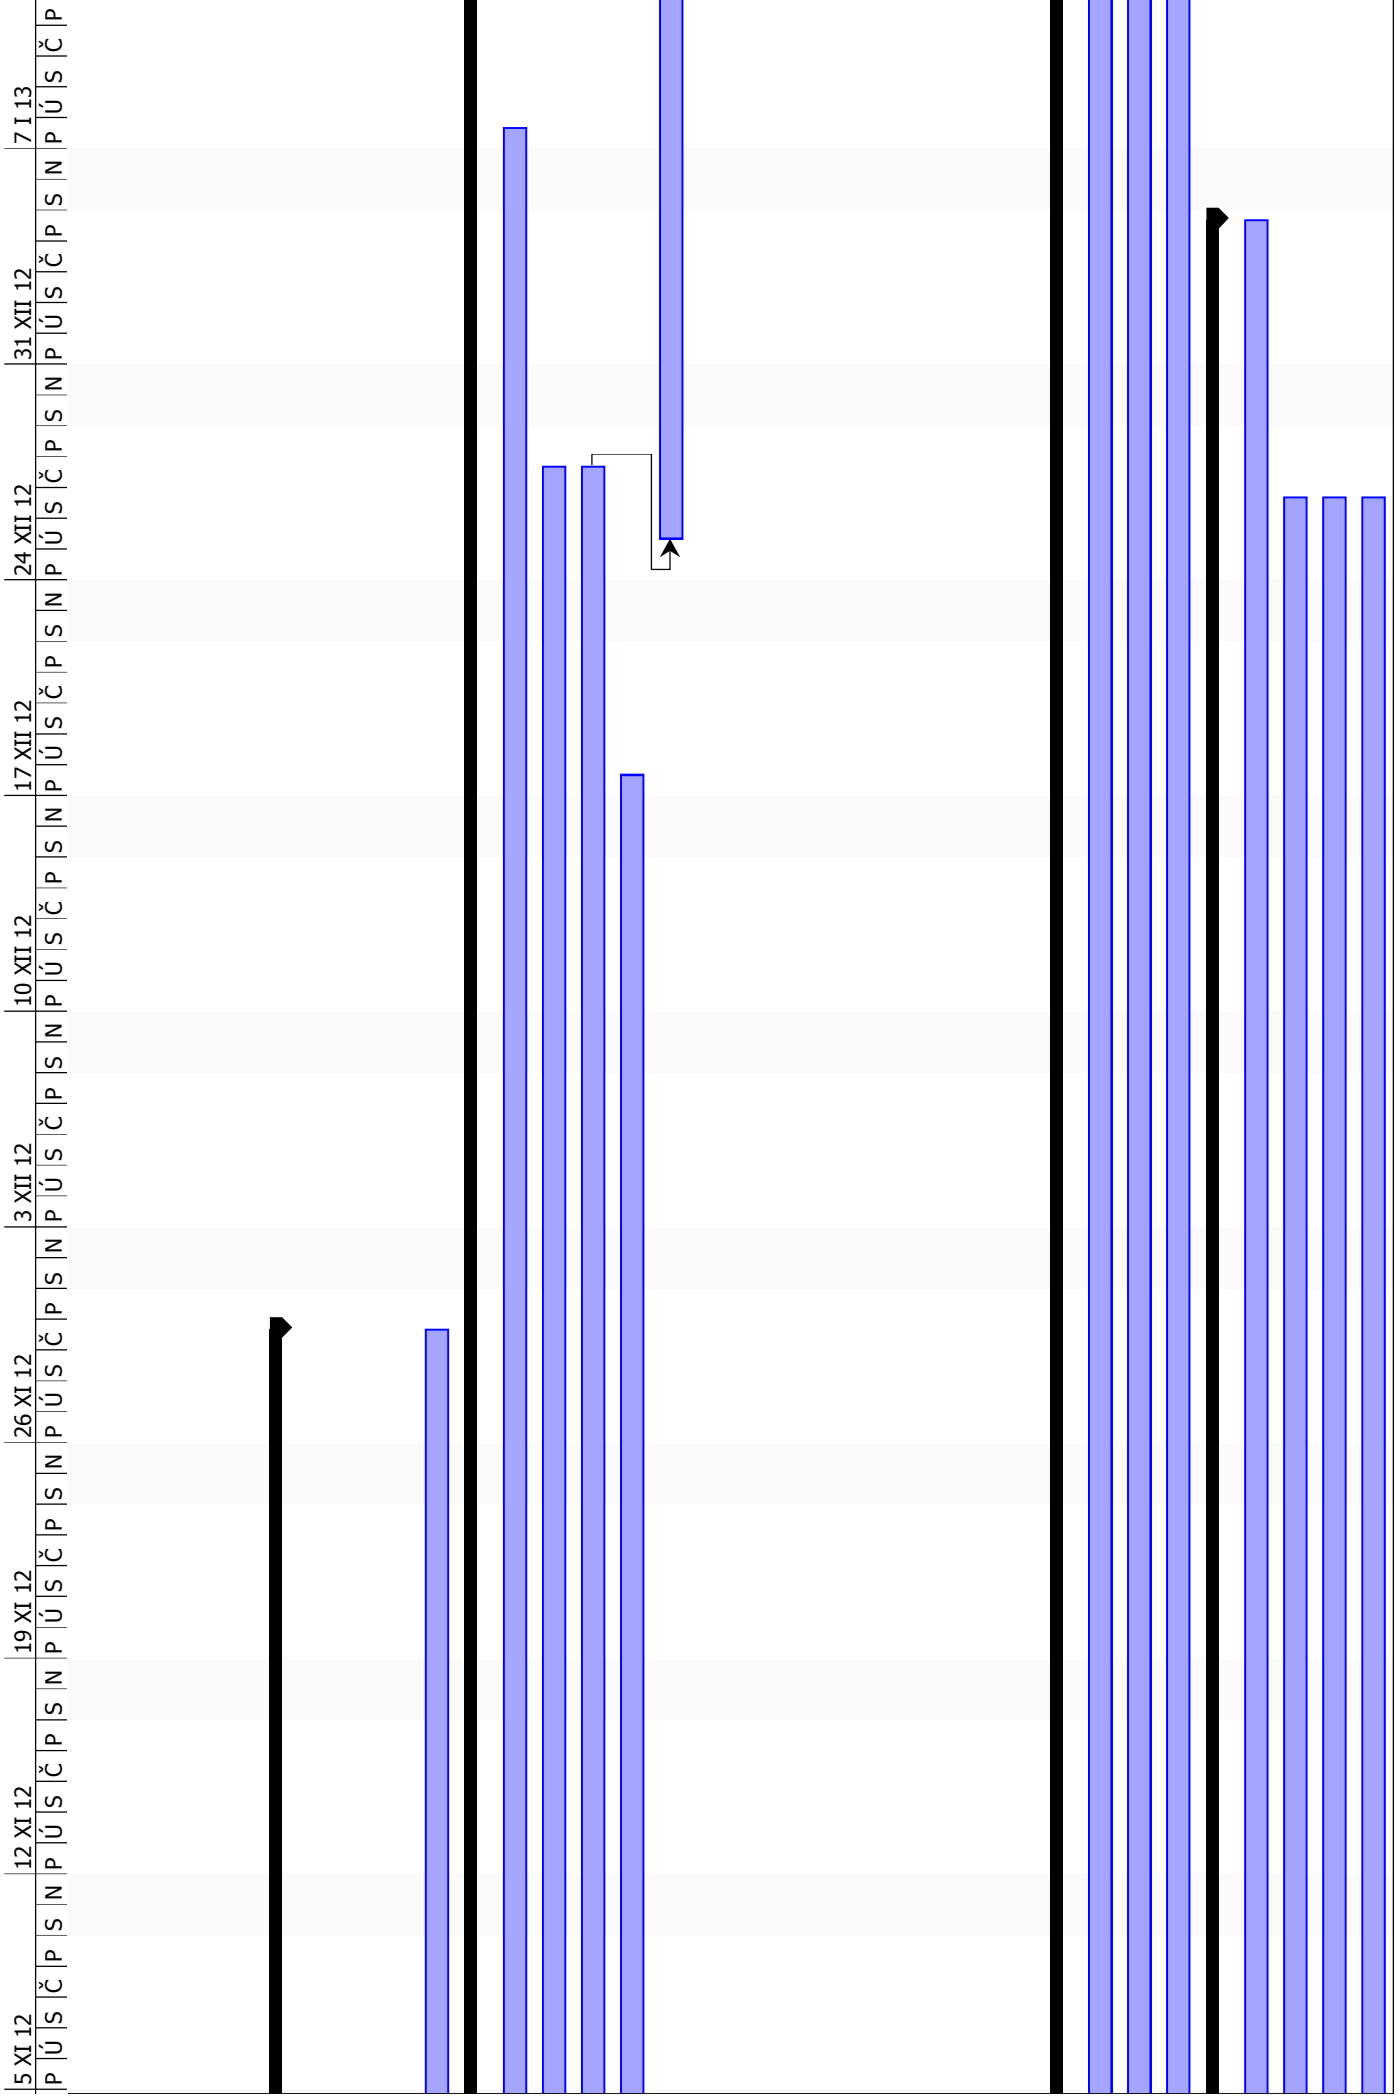

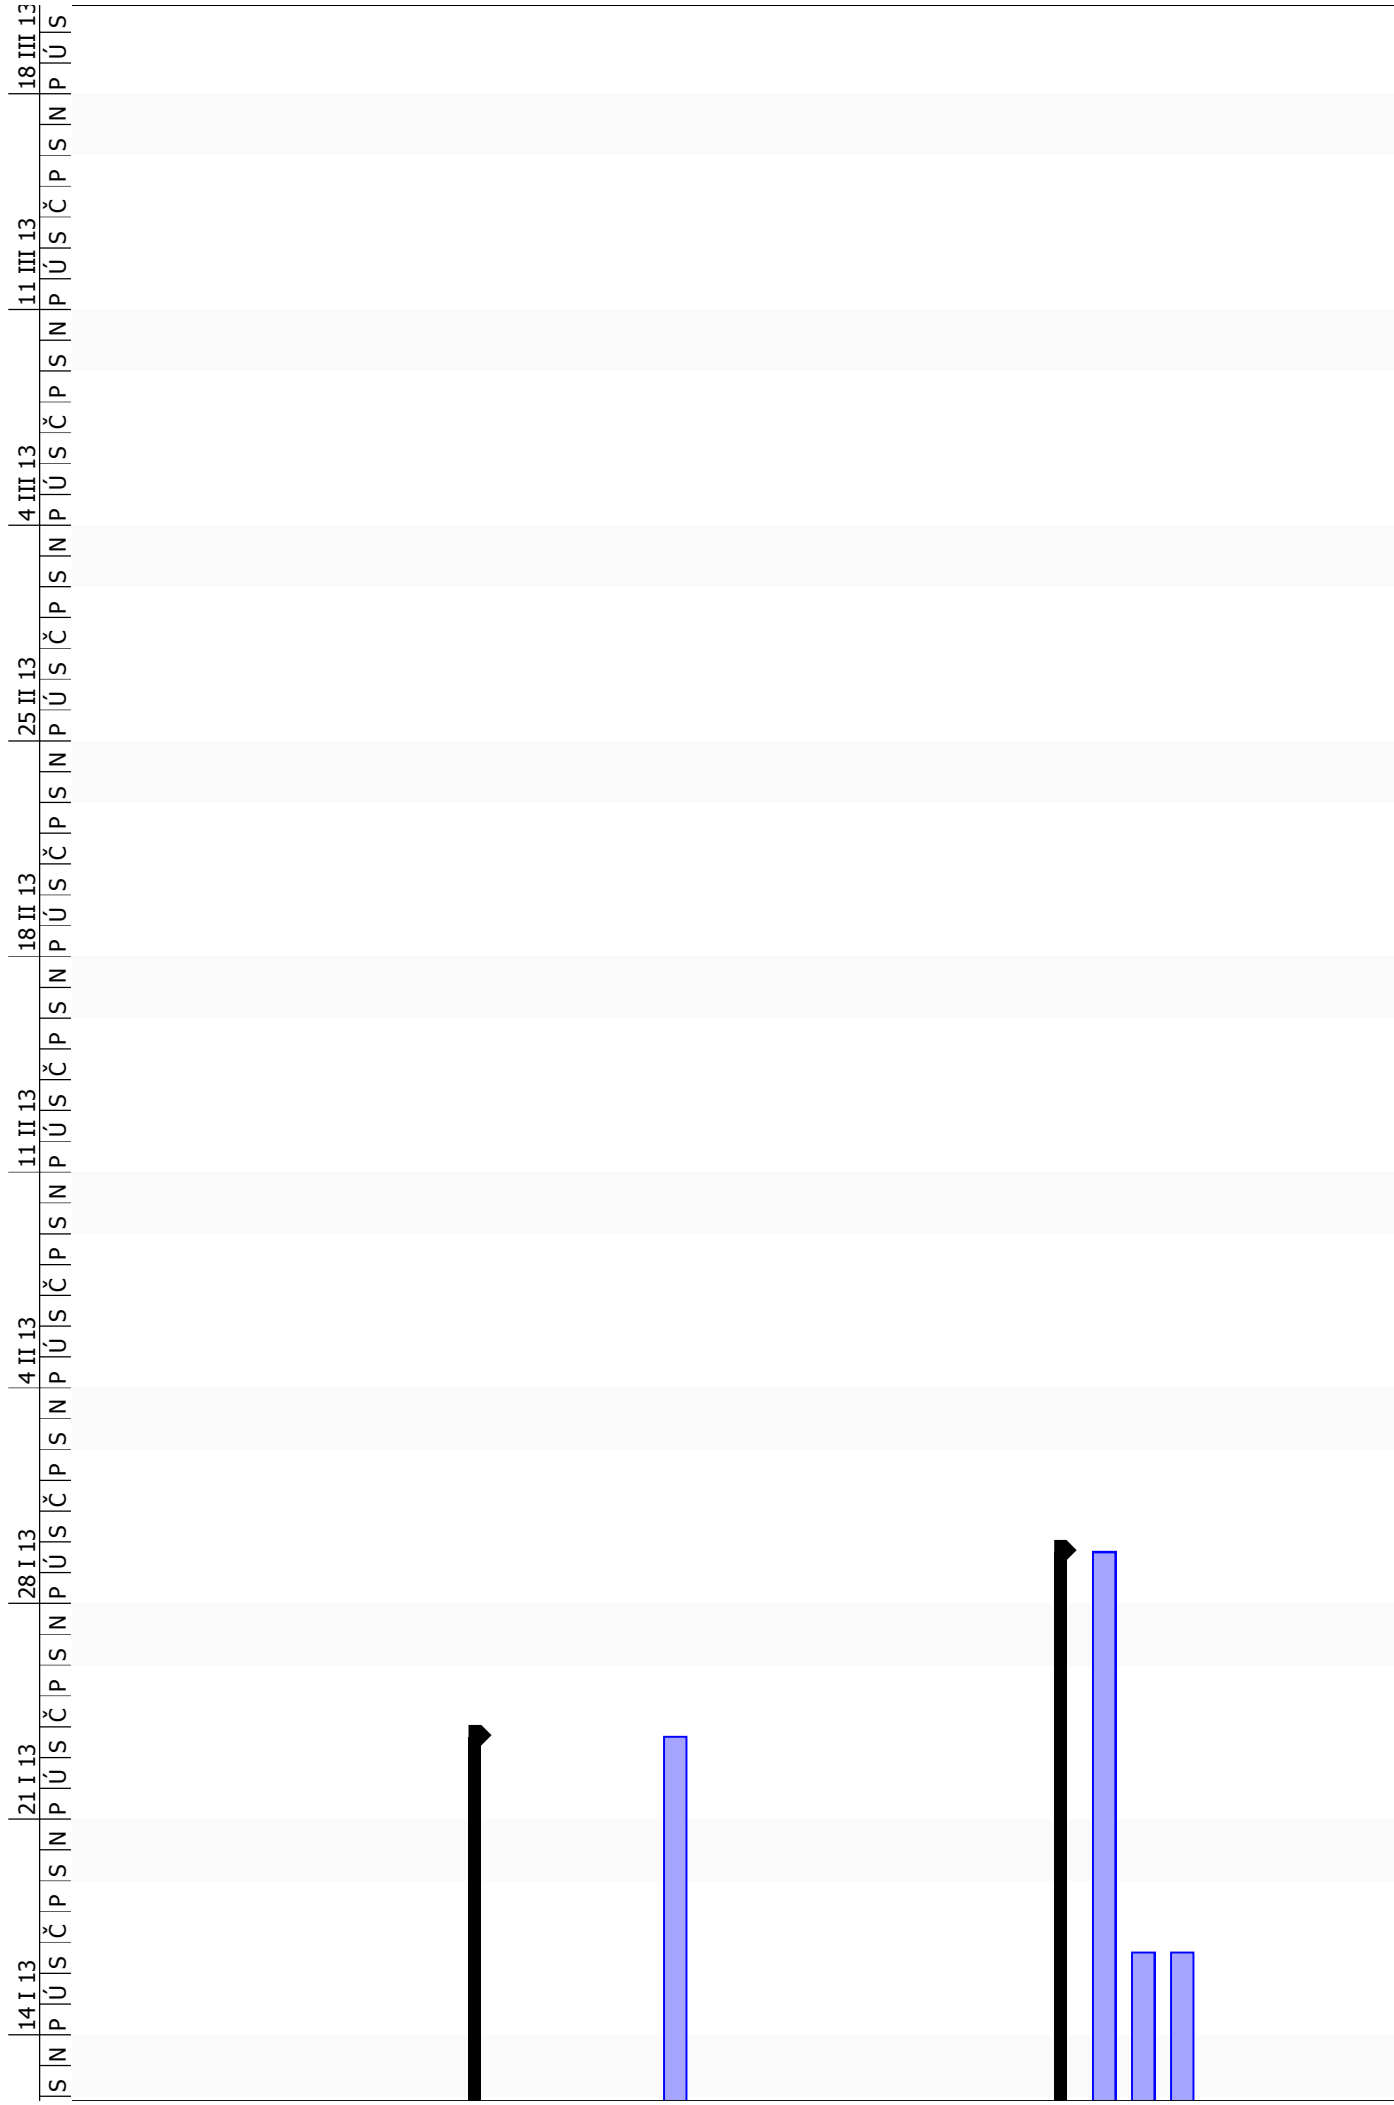



1 V 13	3 VI 13	10 VI 13	17 VI 13	24 VI 13	1 VII 13	8 VII 13	15 VII 13	22 VII 13	29 VII 13	
Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S	P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S	P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S	P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S	P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S	P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S	P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S	P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S	P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S	P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S	P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S













S	N	P	Ú	S	Č	P	S	N	P	Ú	S	Č	P	S	N	P	Ú	S
5 V 14																		
S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S																		
12 V 14																		
S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S																		
19 V 14																		
S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S																		
26 V 14																		
S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S																		


18.VI.12 N   P   Ú   S   Č	Jméno	Trvání	Začátek	Konec	Předchůdci	Jména zdrojů
103	Ostatní konstrukce - bou...	24 dní	15.10.12 7:00	15.11.12 17:00	116	
104	Isolace tepelné	22 dní	15.10.12 7:00	13.11.12 17:00		
105	Zdravotechnika - vnitřní ...	21 dní	5.11.12 7:00	3.12.12 17:00		
106	Montáže potrubí	13 dní	25.10.12 7:00	12.11.12 17:00		
107	☐SO 304 - Přeložka vodo...	32 dní	1.11.12 7:00	14.12.12 17:00		
108	Zemní práce	32 dní	1.11.12 7:00	14.12.12 17:00		
109	Vodorovné konstrukce	25 dní	1.11.12 7:00	5.12.12 17:00		
110	Trubní vedení	32 dní	1.11.12 7:00	14.12.12 17:00		
111	Montáže potrubí	20 dní	10.11.12 7:00	7.12.12 17:00		
112	☐SO 305 - Přeložka vodo...	27 dní	10.7.12 7:00	15.8.12 17:00		
113	Zemní práce	22 dní	16.7.12 7:00	14.8.12 17:00		
114	Vodorovné konstrukce	16 dní	16.7.12 7:00	6.8.12 17:00		
115	Trubní vedení	22 dní	17.7.12 7:00	15.8.12 17:00		
116	Ostatní konstrukce - bou...	24 dní	10.7.12 7:00	10.8.12 17:00		
117	Montáže potrubí	12 dní	10.7.12 7:00	25.7.12 17:00		
118	☐SO 401 - Veřejné osvět...	294 dní	10.7.12 7:00	23.8.13 17:00		
119	Demontáže	48 dní	10.7.12 7:00	13.9.12 17:00		
120	Montáže + nosný materiál	108 dní	14.10.12 7:00	13.3.13 17:00		
121	Uzemnění - montáž + no...	106 dní	15.10.12 7:00	11.3.13 17:00		
122	Zemní práce	128 dní	24.9.12 7:00	20.3.13 17:00	114	
123	Dodávka	60 dní	10.9.12 7:00	30.11.12 17:00	116,132	
124	Hod.zúčt.sazba	60 dní	1.6.13 7:00	23.8.13 17:00		
125	☐SO 402 - Venkovní areá...	238 dní	25.9.12 7:00	22.8.13 17:00		
126	Montáže + nosný materiál	94 dní	14.10.12 7:00	21.2.13 17:00		
127	Uzemnění - montáž + no...	89 dní	14.10.12 7:00	14.2.13 17:00		
128	Zemní práce	115 dní	25.9.12 7:00	4.3.13 17:00	131,135	
129	Hod.zúčt.sazba	59 dní	3.6.13 7:00	22.8.13 17:00		
130	☐SO 403 - Přeložka VN Č...	15 dní	9.7.12 7:00	27.7.12 17:00		
131	Zemní práce	15 dní	9.7.12 7:00	27.7.12 17:00		
132	Silnoproud montáže + sp...	14 dní	9.7.12 7:00	26.7.12 17:00		
133	Ostatní	15 dní	9.7.12 7:00	27.7.12 17:00		
134	☐SO 404 - Přeložka NN Ví...	22 dní	9.7.12 7:00	7.8.12 17:00		
135	Zemní práce	22 dní	9.7.12 7:00	7.8.12 17:00		
136	Silnoproud montáže + sp...	22 dní	9.7.12 7:00	7.8.12 17:00		

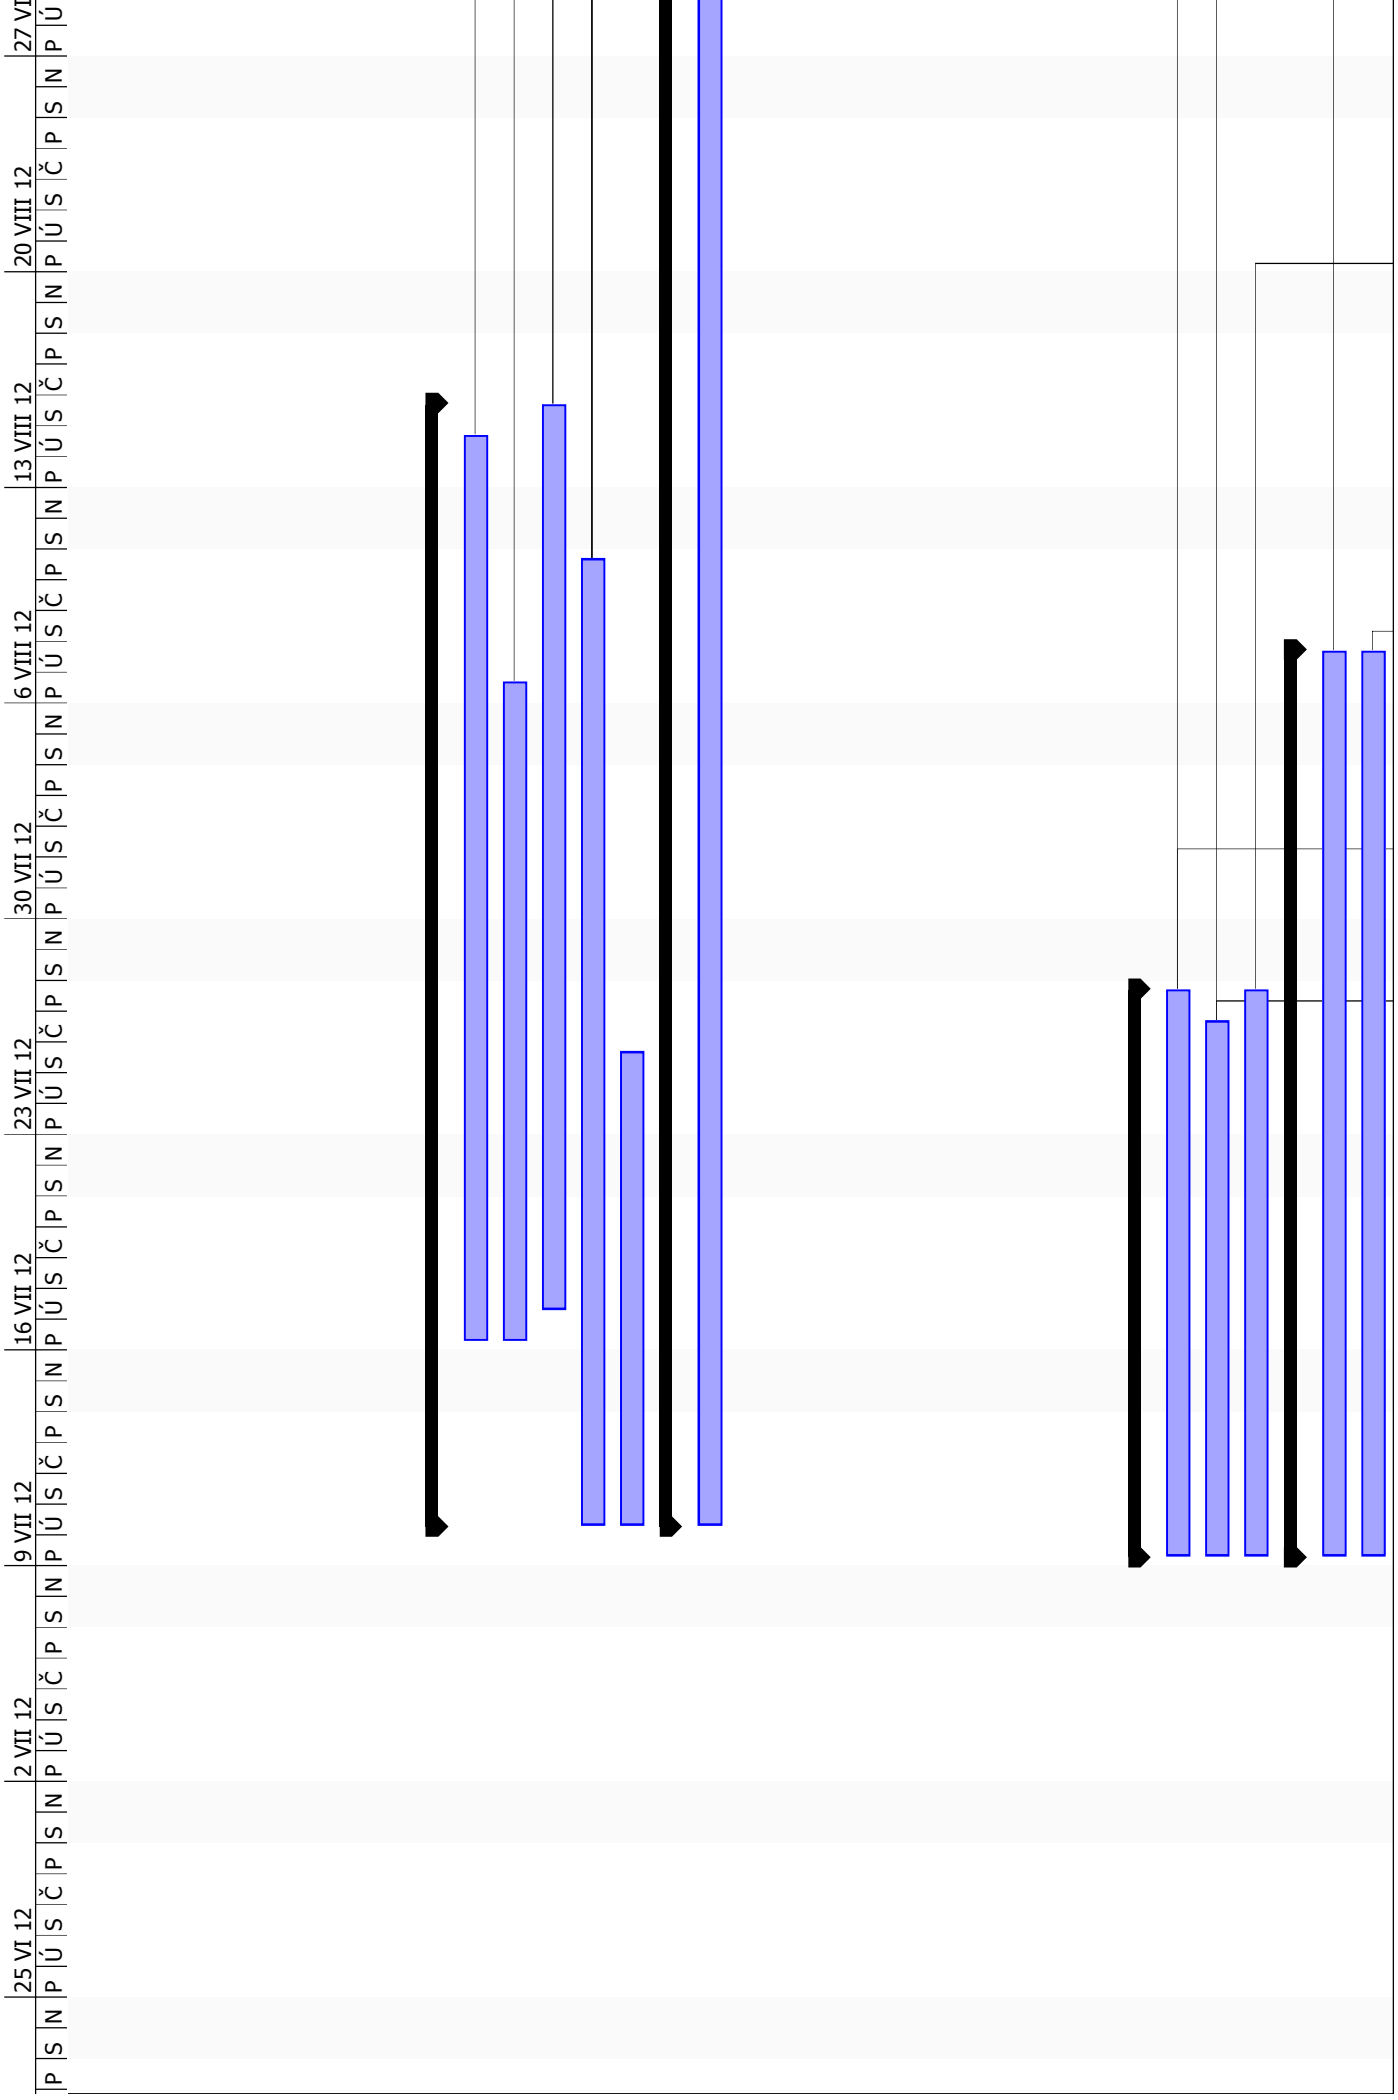

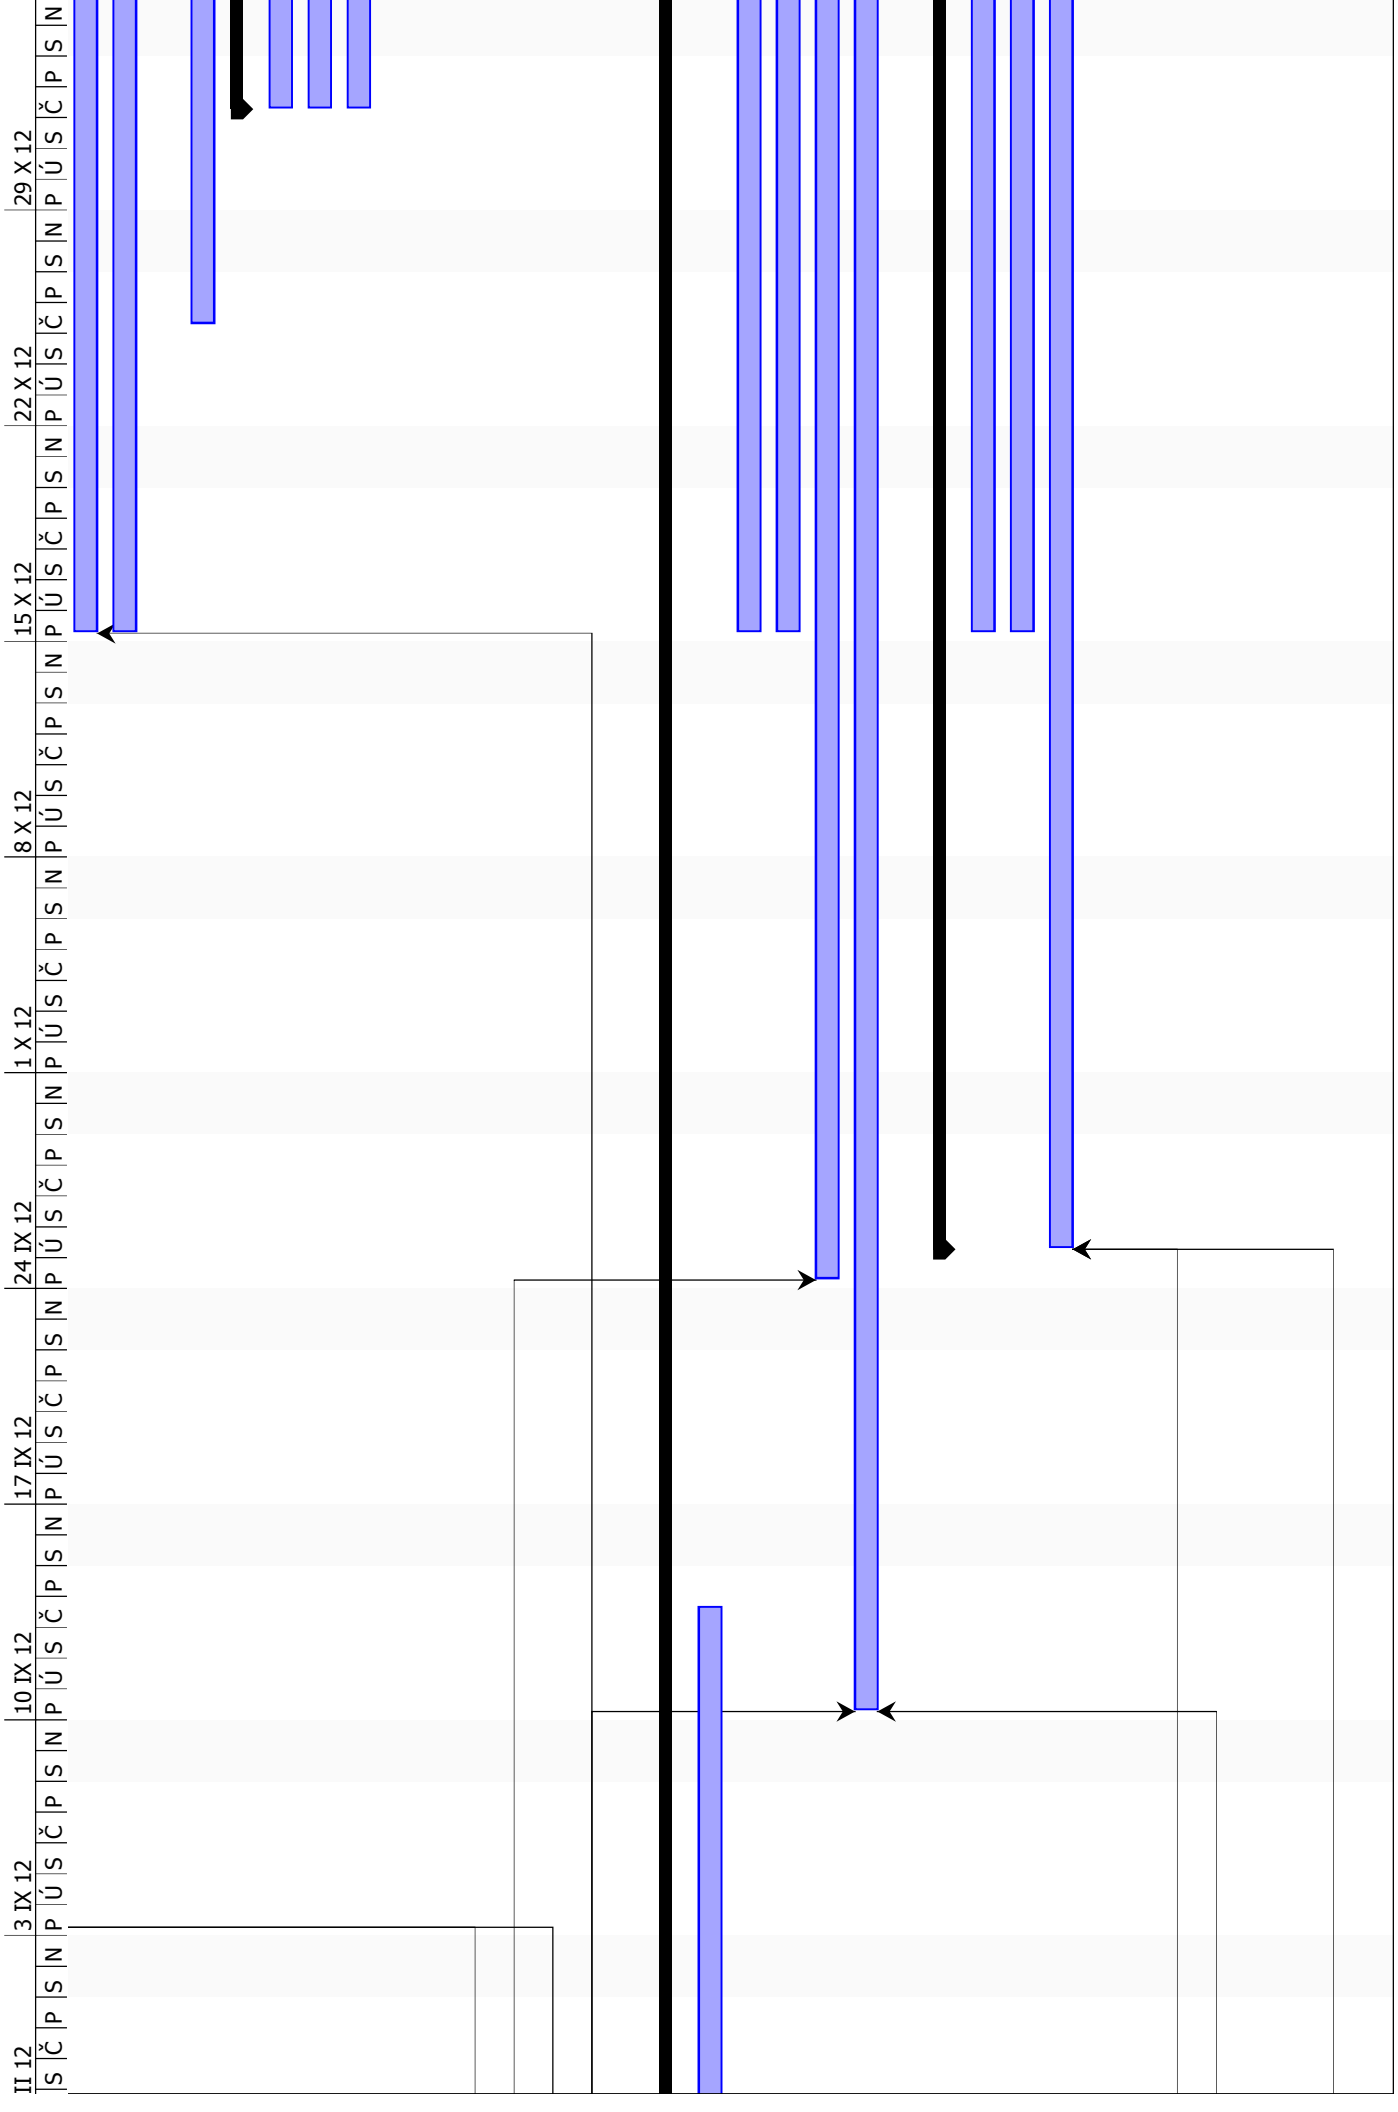





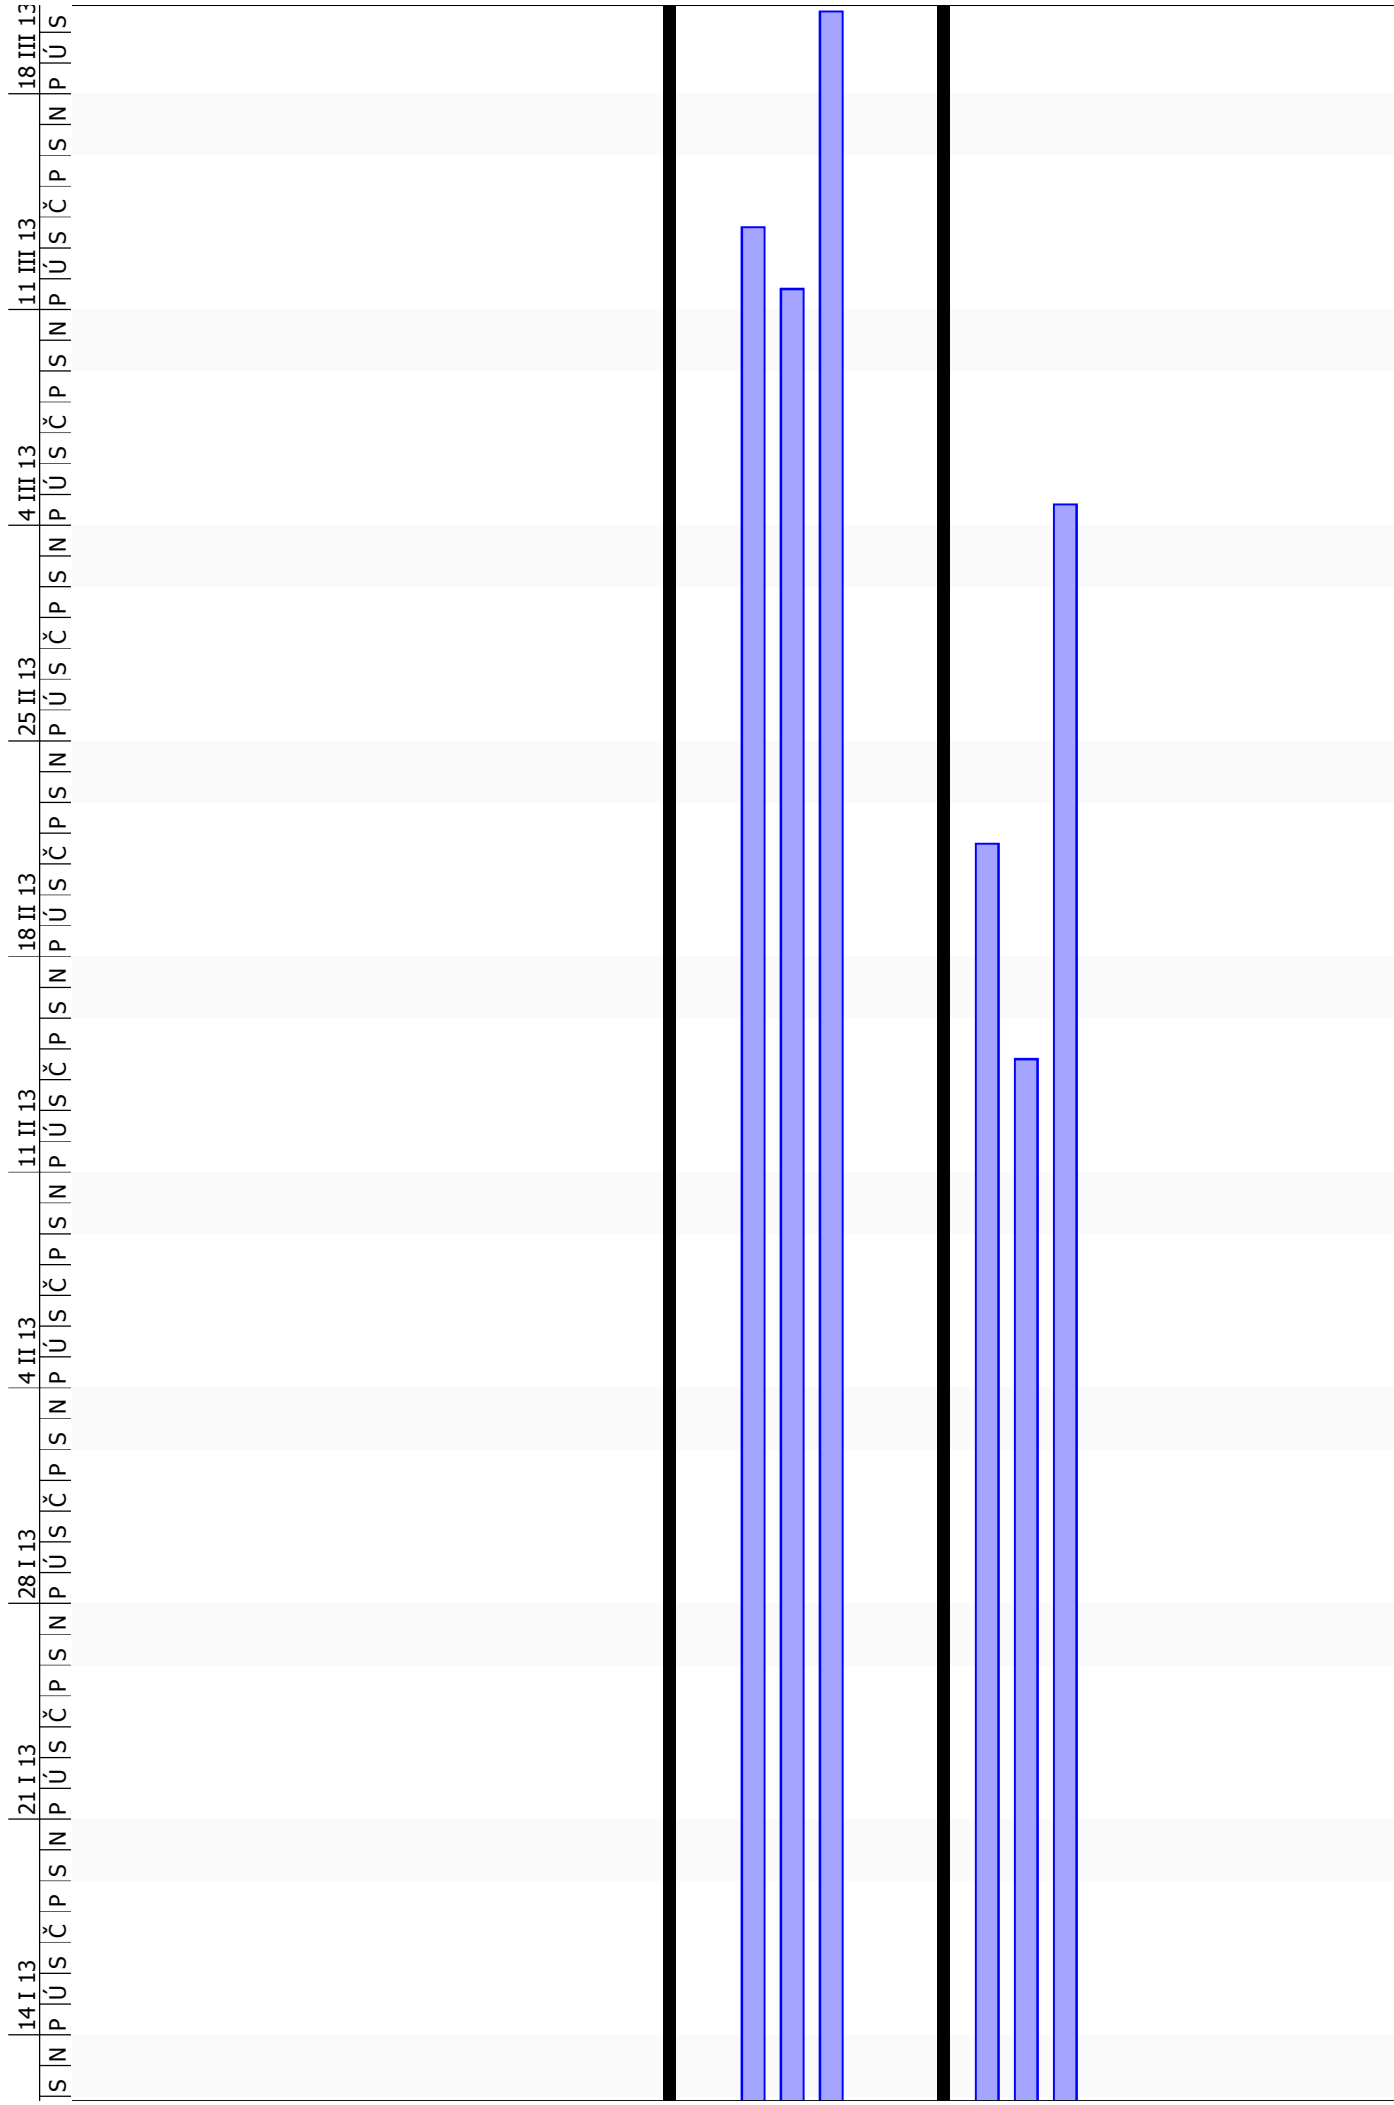










I 13	23 XII 13	30 XII 13	6 I 14	13 I 14	20 I 14	27 I 14	3 II 14	10 II 14	17 II 14	
S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N	S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N	S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N	S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N	S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N	S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N	S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N	S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N	S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N	S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N	S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N




S	N	P	Ú	S	Č	P	S	N	P	Ú	S	Č	P	S	N	P	Ú	S
5 V 14																		
S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S																		
12 V 14																		
S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S																		
19 V 14																		
S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S																		
26 V 14																		
S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S																		





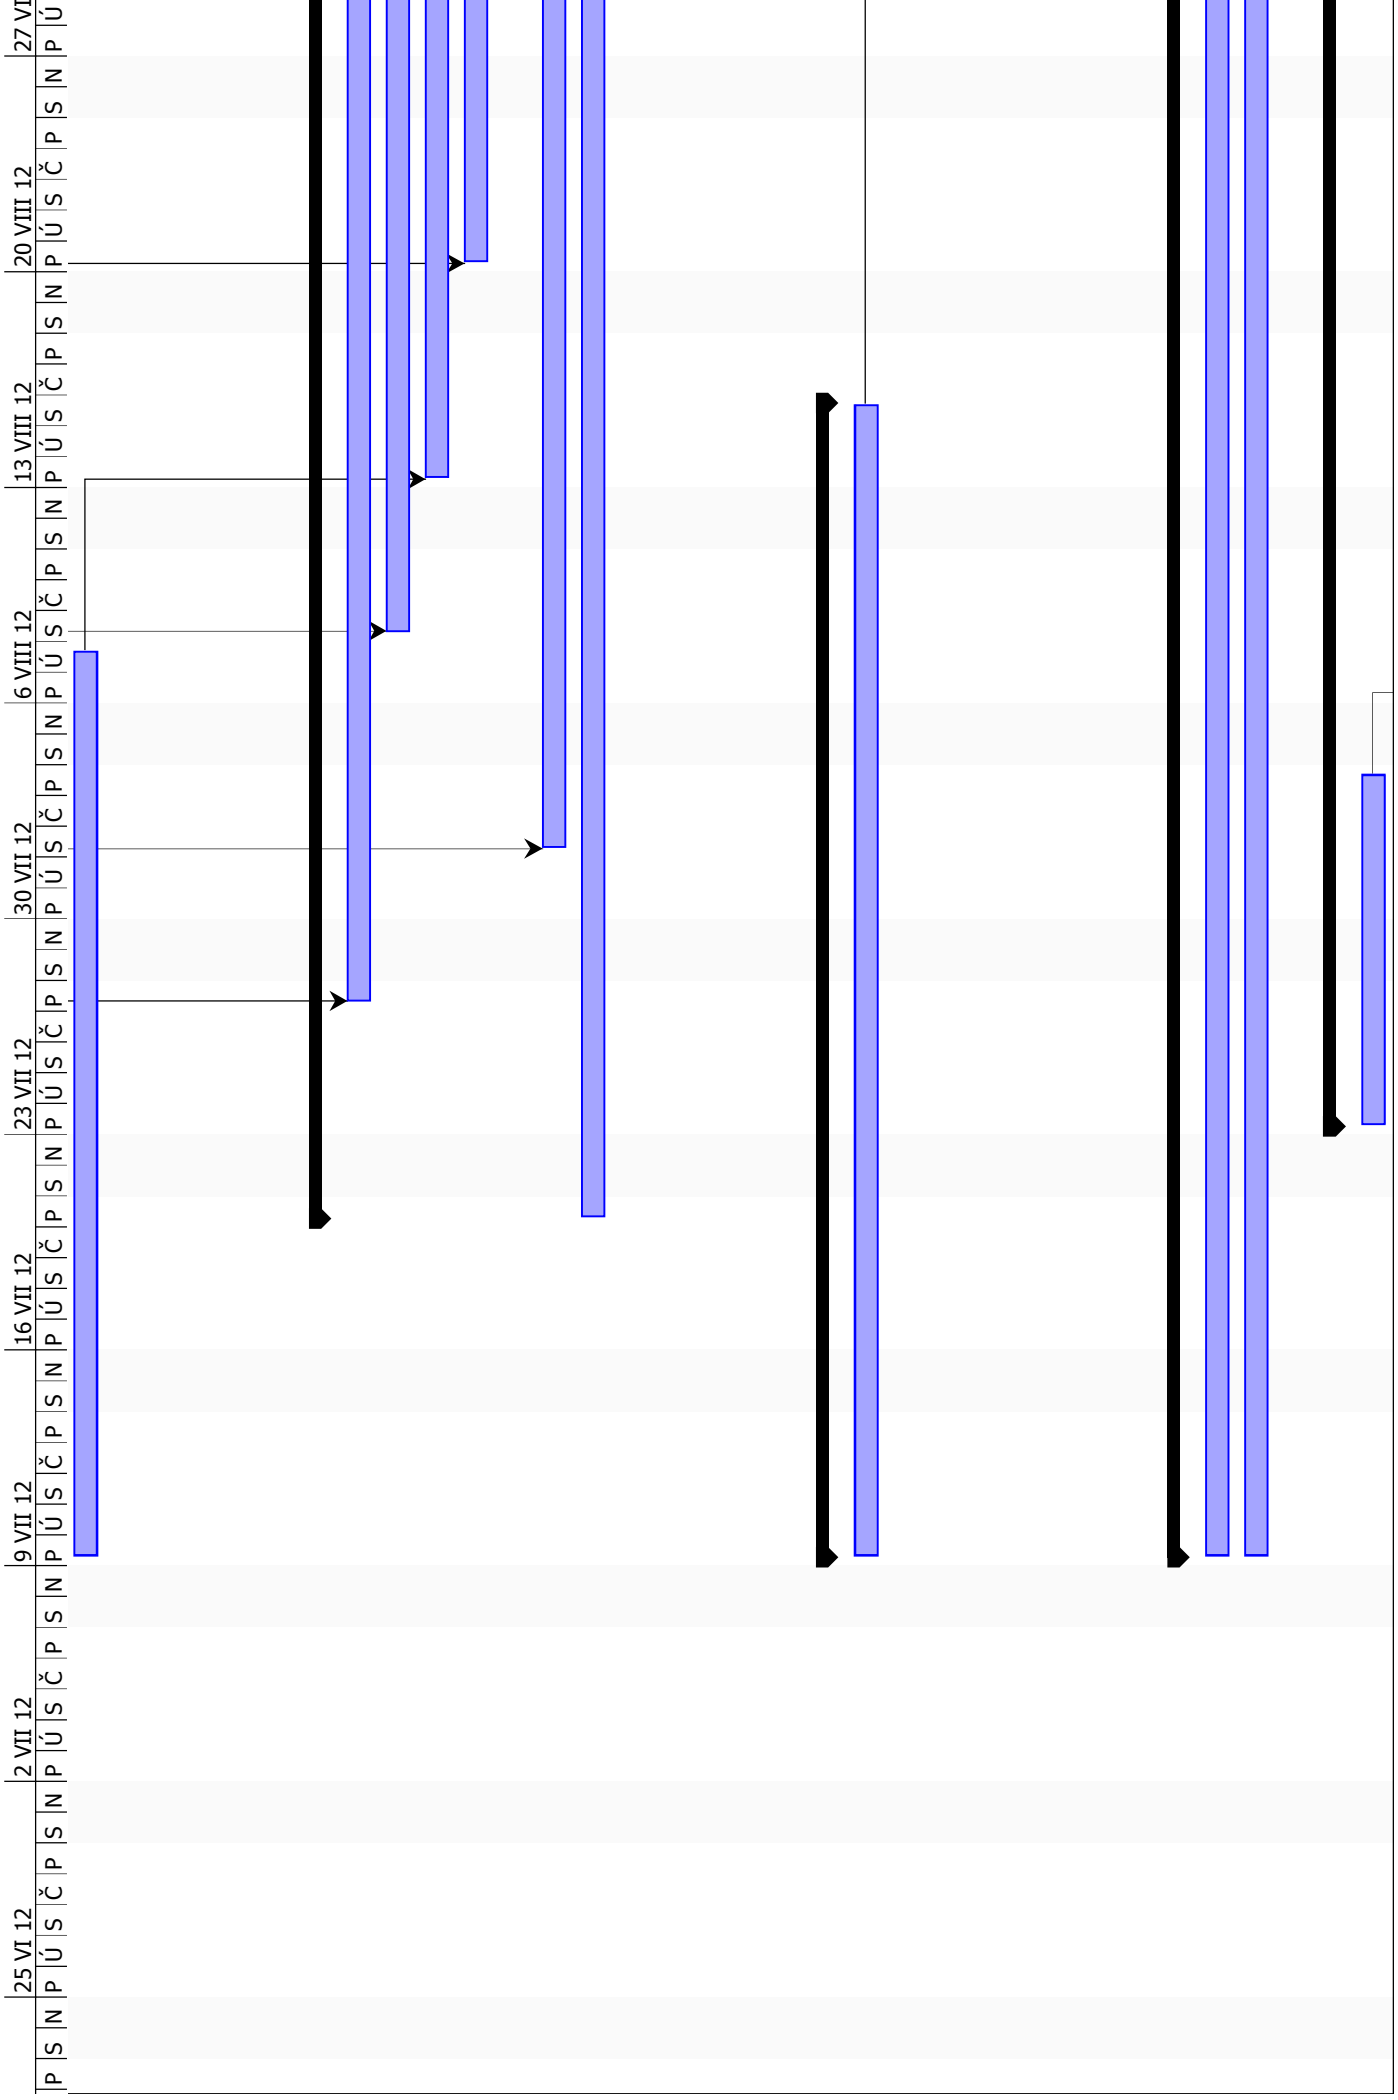

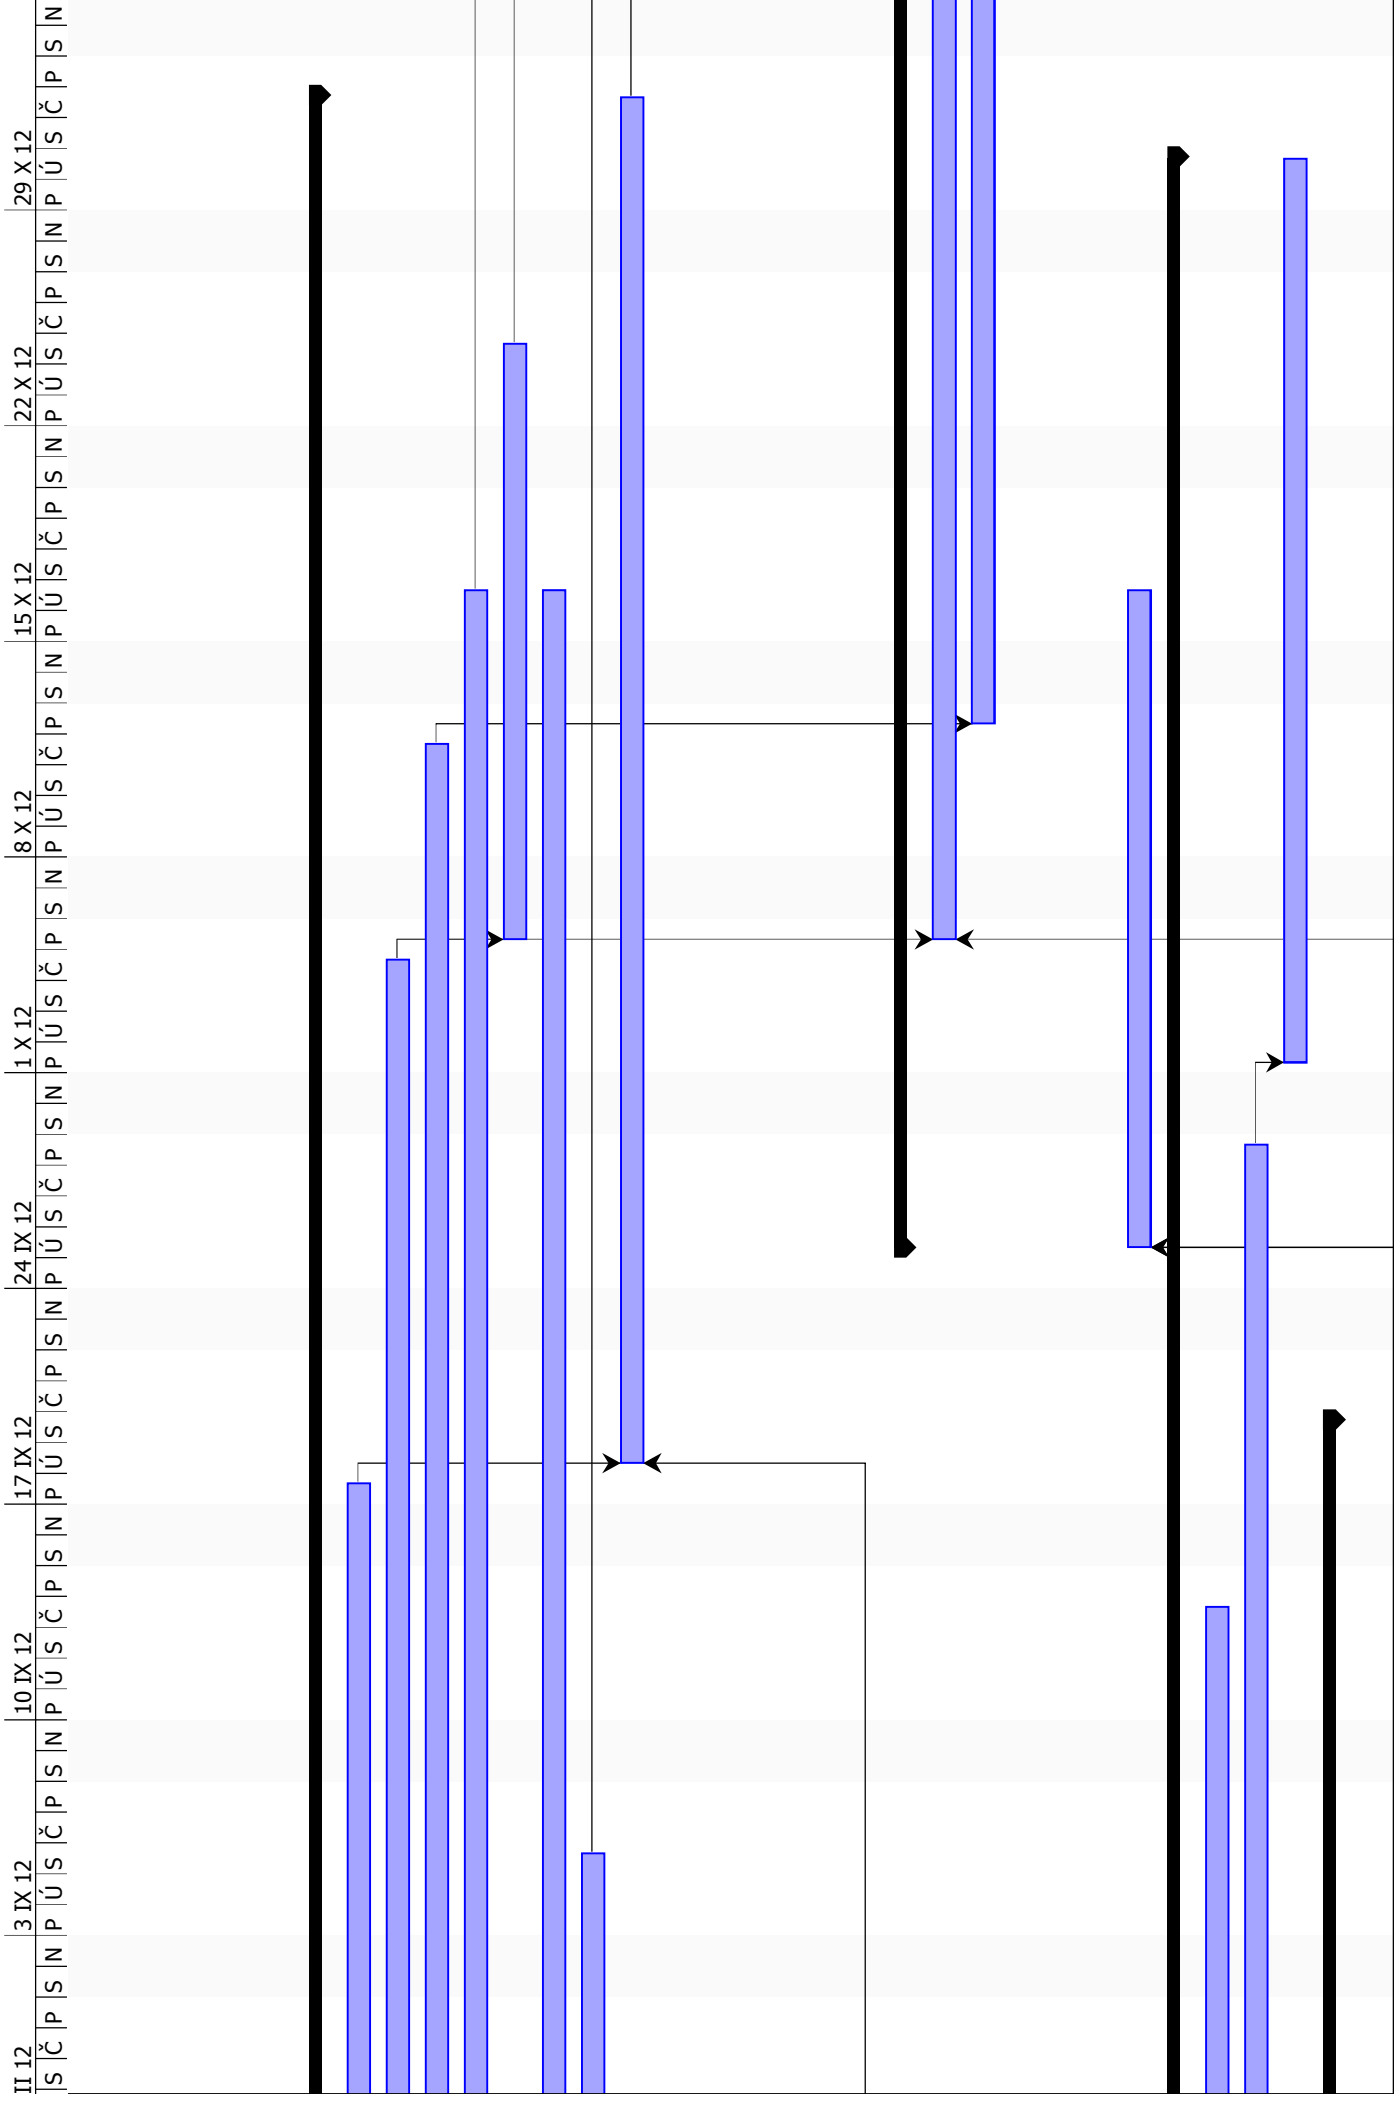
18.VI.12	N	P	Ú	S	Č	Jméno	Trvání	Začátek	Konec	Předchůdci	Jména zdrojů
137		Ostatní	22 dní	9.7.12 7:00	7.8.12 17:00						
138		ISO 406 - Přeložka obch...	24 dny	11.3.13 7:00	11.4.13 17:00						
139		Nová rozvodnice MR1 - ...	10 dní	11.3.13 7:00	22.3.13 17:00						
140		Kabelové trasy	10 dní	11.3.13 7:00	22.3.13 17:00						
141		Montáže a demontáže	15 dní	22.3.13 8:00	11.4.13 17:00	153					
142		Ostatní náklady	11 dní	25.3.13 8:00	8.4.13 17:00	140;153					
143		ISO 501 - Přeložka STL ...	75 dny	20.7.12 7:00	1.11.12 17:00						
144		Potrubí ZP na stěně haly...	37 dní	27.7.12 8:00	17.9.12 17:00	132					
145		Potrubí ZP DN 300 mezi ...	42 dní	8.8.12 8:00	4.10.12 17:00	136					
146		Potrubí ZP DN 500 od hal...	44 dní	13.8.12 7:00	11.10.12 17:00	137					
147		Zkoušky potrubí	42 dní	20.8.12 7:00	16.10.12 17:00	133					
148		Nátěry a značení	14 dní	5.10.12 8:00	24.10.12 17:00	145					
149		Zemní práce	55 dní	1.8.12 7:00	16.10.12 17:00	131					
150		Lešení	34 dní	20.7.12 7:00	5.9.12 17:00						
151		Demontáže	33 dní	18.9.12 8:00	1.11.12 17:00	144;157					
152		ISO 502 - Přeložka stlač...	54 dny	7.1.13 7:00	21.3.13 17:00						
153		Montáž potrubí	54 dní	7.1.13 7:00	21.3.13 17:00						
154		ISO 503 - Přeložka potr...	62 dny	14.1.13 7:00	9.4.13 17:00						
155		Montáž potrubí	62 dní	14.1.13 7:00	9.4.13 17:00						
156		ISO 504 - Přeložka NTL ...	28 dny	9.7.12 7:00	15.8.12 17:00						
157		Montáž potrubí	28 dní	9.7.12 7:00	15.8.12 17:00						
158		ISO 505 - STL plynovod ...	47 dny	25.9.12 8:00	28.11.12 17:00						
159		Potrubí plynovodu	24 dní	5.10.12 8:00	7.11.12 17:00	145;174					
160		Uložení nadzemní části	17 dní	12.10.12 8:00	5.11.12 17:00	146					
161		Uzemnění	7 dní	6.11.12 8:00	14.11.12 17:00	160;151;150;189					
162		Zkoušky potrubí	8 dní	8.11.12 8:00	19.11.12 17:00	159;147;174					
163		Nátěry a značení	7 dní	20.11.12 8:00	28.11.12 17:00	162;148					
164		Zemní práce	16 dní	25.9.12 8:00	16.10.12 17:00	184;174					
165		ISO 651 - Úprava koleje...	82 dny	9.7.12 7:00	30.10.12 17:00						
166		Zemní práce	49 dní	9.7.12 7:00	13.9.12 17:00						
167		Komunikace	60 dní	9.7.12 7:00	28.9.12 17:00						
168		Úpravy povrchů, podlahy...	22 dní	1.10.12 8:00	30.10.12 17:00	167					
169		ISO 701.1.2 - Zastřešení...	43 dny	23.7.12 7:00	19.9.12 17:00						
170		Zemní práce	10 dní	23.7.12 7:00	3.8.12 17:00						







14 I 13	21 I 13	28 I 13	4 II 13	11 II 13	18 II 13	25 II 13	4 III 13	11 III 13	18 III 13
S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S	S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S	S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S	S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S	S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S	S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S	S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S	S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S	S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S	S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S
									
									
									
									

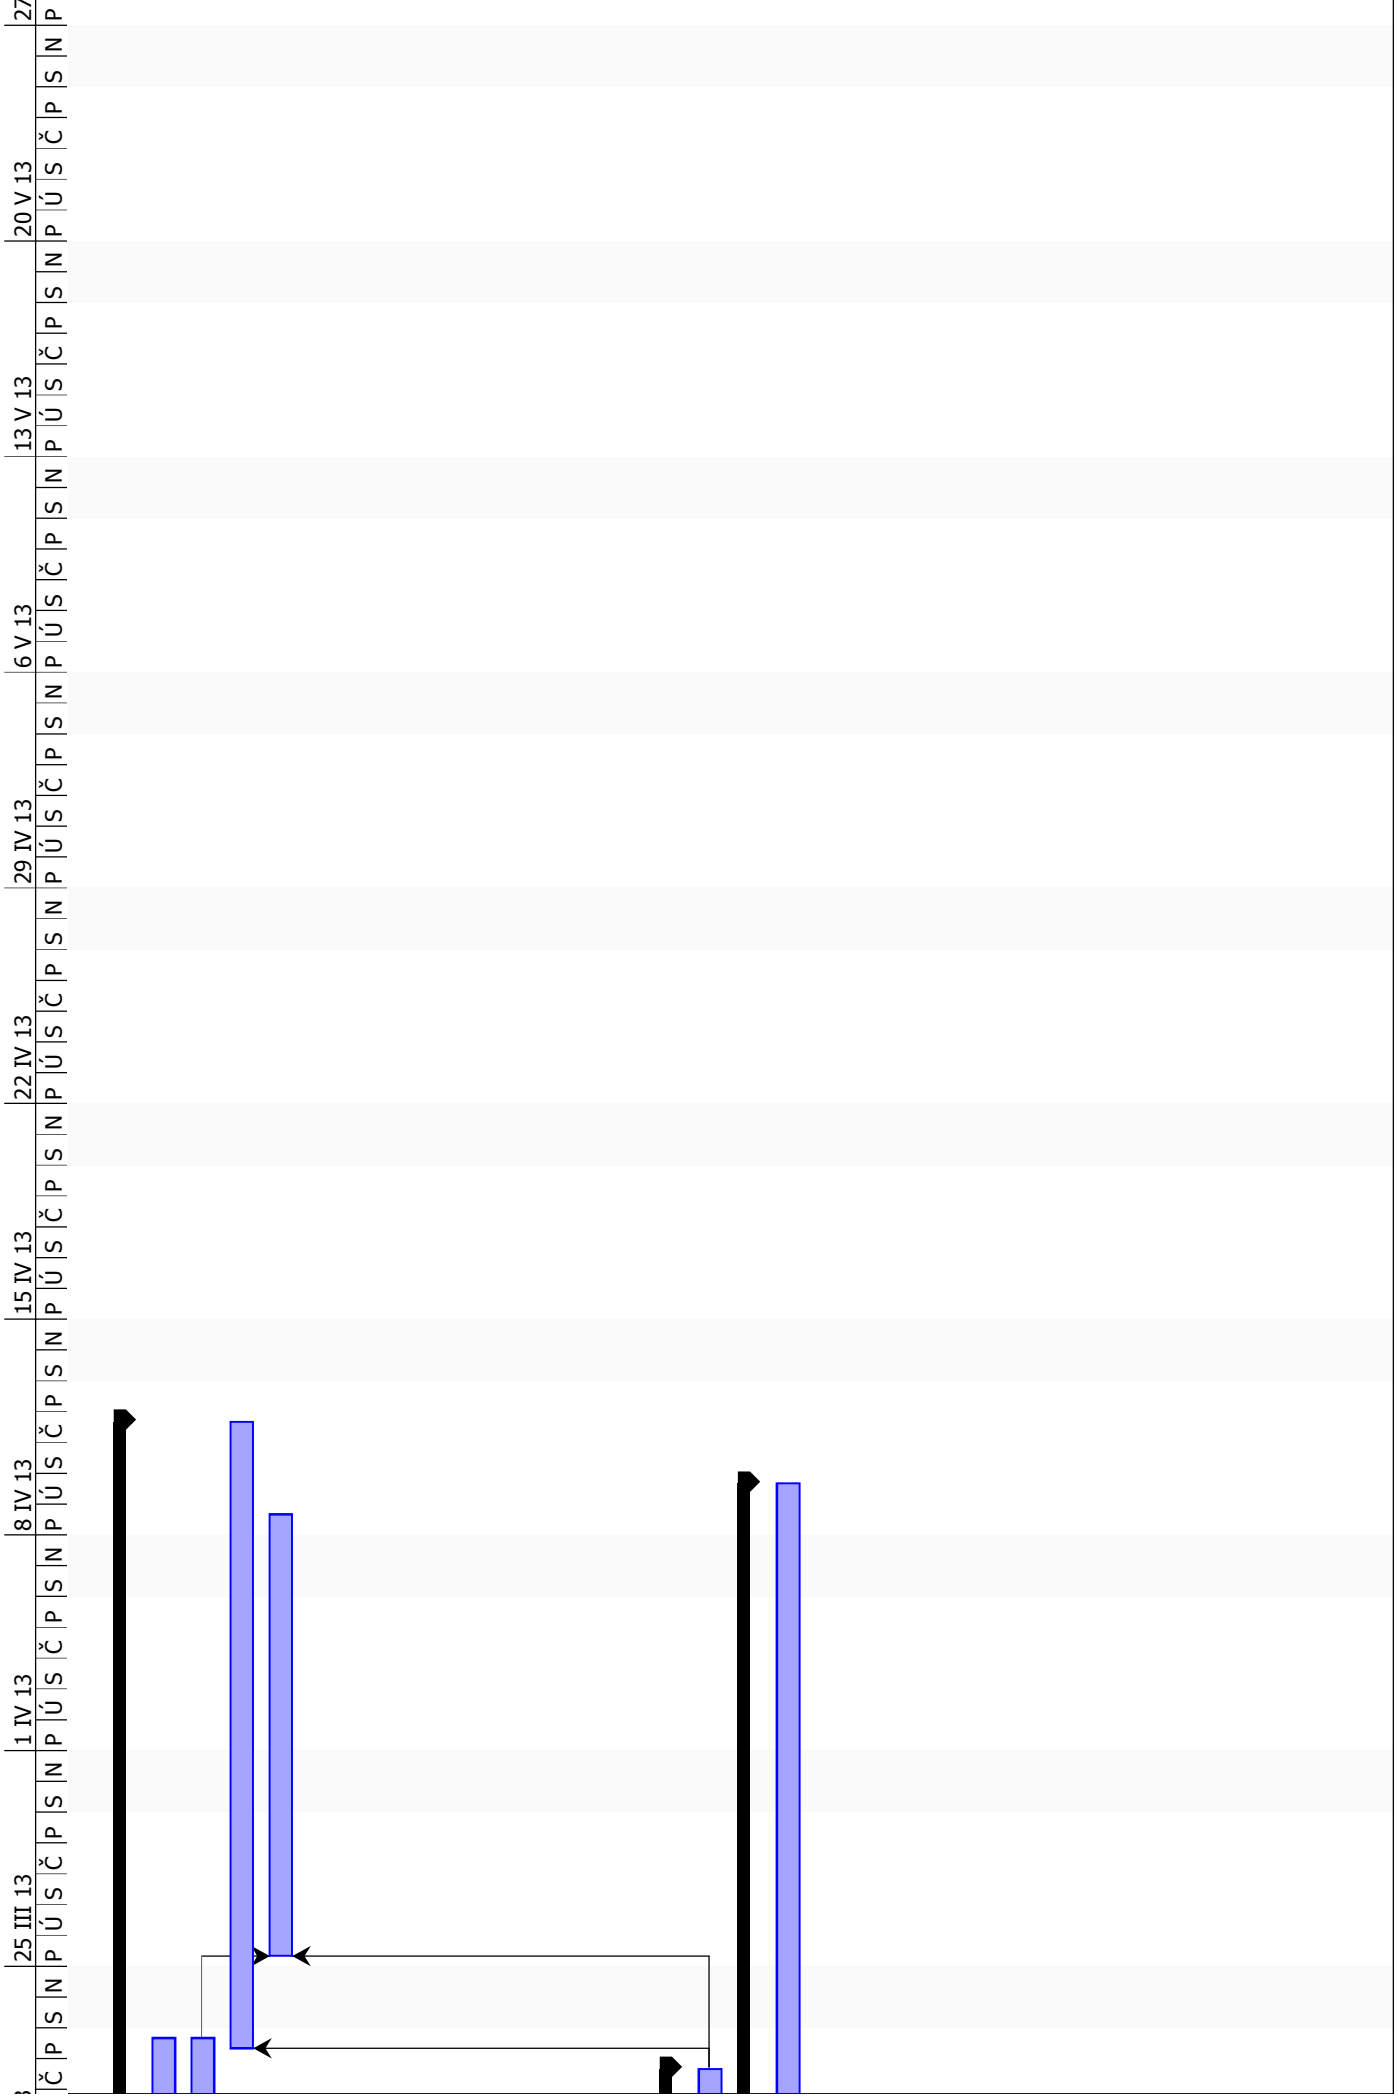

V 13	3 VI 13	10 VI 13	17 VI 13	24 VI 13	1 VII 13	8 VII 13	15 VII 13	22 VII 13	29 VII 13
Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S	P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S	P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S	P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S	P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S	P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S	P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S	P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S	P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S	P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S

5 VIII 13	N	P	Ú	S	Č	P	S	N	P	Ú	S	Č	P	S	N	P	Ú	S	Č	7 X 13
12 VIII 13	P	Ú	S	Č	P	S	N	P	Ú	S	Č	P	S	N	P	Ú	S	Č	P	30 IX 13
19 VIII 13	P	Ú	S	Č	P	S	N	P	Ú	S	Č	P	S	N	P	Ú	S	Č	P	23 IX 13
26 VIII 13	P	Ú	S	Č	P	S	N	P	Ú	S	Č	P	S	N	P	Ú	S	Č	P	16 IX 13
2 IX 13	P	Ú	S	Č	P	S	N	P	Ú	S	Č	P	S	N	P	Ú	S	Č	P	9 IX 13
9 IX 13	P	Ú	S	Č	P	S	N	P	Ú	S	Č	P	S	N	P	Ú	S	Č	P	2 IX 13
16 IX 13	P	Ú	S	Č	P	S	N	P	Ú	S	Č	P	S	N	P	Ú	S	Č	P	16 IX 13
23 IX 13	P	Ú	S	Č	P	S	N	P	Ú	S	Č	P	S	N	P	Ú	S	Č	P	16 IX 13
30 IX 13	P	Ú	S	Č	P	S	N	P	Ú	S	Č	P	S	N	P	Ú	S	Č	P	16 IX 13
7 X 13	P	Ú	S	Č	P	S	N	P	Ú	S	Č	P	S	N	P	Ú	S	Č	P	16 IX 13




P	S	N	Ú	S	Č	P	S	N	Ú	S	Č	P	S	N	Ú	S	Č	P	S	N	Ú	S	Č	P	S	N	Ú	14 X 13
P	S	N	Ú	S	Č	P	S	N	Ú	S	Č	P	S	N	Ú	S	Č	P	S	N	Ú	S	Č	P	S	N	Ú	21 X 13
P	S	N	Ú	S	Č	P	S	N	Ú	S	Č	P	S	N	Ú	S	Č	P	S	N	Ú	S	Č	P	S	N	Ú	28 X 13
P	S	N	Ú	S	Č	P	S	N	Ú	S	Č	P	S	N	Ú	S	Č	P	S	N	Ú	S	Č	P	S	N	Ú	4 X 13
P	S	N	Ú	S	Č	P	S	N	Ú	S	Č	P	S	N	Ú	S	Č	P	S	N	Ú	S	Č	P	S	N	Ú	11 X 13
P	S	N	Ú	S	Č	P	S	N	Ú	S	Č	P	S	N	Ú	S	Č	P	S	N	Ú	S	Č	P	S	N	Ú	18 X 13
P	S	N	Ú	S	Č	P	S	N	Ú	S	Č	P	S	N	Ú	S	Č	P	S	N	Ú	S	Č	P	S	N	Ú	25 X 13
P	S	N	Ú	S	Č	P	S	N	Ú	S	Č	P	S	N	Ú	S	Č	P	S	N	Ú	S	Č	P	S	N	Ú	2 XII 13
P	S	N	Ú	S	Č	P	S	N	Ú	S	Č	P	S	N	Ú	S	Č	P	S	N	Ú	S	Č	P	S	N	Ú	9 XII 13
P	S	N	Ú	S	Č	P	S	N	Ú	S	Č	P	S	N	Ú	S	Č	P	S	N	Ú	S	Č	P	S	N	Ú	16 XI


I 13	23 XII 13	30 XII 13	6 I 14	13 I 14	20 I 14	27 I 14	3 II 14	10 II 14	17 II 14
S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N	S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N	S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N	S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N	S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N	S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N	S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N	S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N	S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N	S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N

24 II 14	3 III 14	10 III 14	17 III 14	24 III 14	31 III 14	7 IV 14	14 IV 14	21 IV 14	28 IV 14
P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P	P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P	P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P	P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P	P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P	P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P	P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P	P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P	P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P	P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P

S	N	P	Ú	S	Č	P	S	N	P	Ú	S	Č	P	S	N	P	Ú	S
5 V 14																		
12 V 14																		
19 V 14																		
26 V 14																		

		Jméno	Trvání	Začátek	Konec	Předchůdci	Jména zdrojů
171		Zakládání	20 dní	26.7.12 7:00	22.8.12 17:00		
172		Úpravy povrchů,podlahy...	11 dní	23.8.12 8:00	6.9.12 17:00	171	
173		Ostatní konstrukce	11 dní	8.8.12 7:00	22.8.12 17:00		
174		PSV nátery	8 dní	5.9.12 7:00	14.9.12 17:00		
175		PSV montáž ocel.konstru...	9 dní	7.9.12 8:00	19.9.12 17:00	172;171;179;173	
176		<b>ISO 701.1.3 - Vrátnice č.1</b>	<b>56 dní?</b>	<b>2.8.12 7:00</b>	<b>18.10.12 17:00</b>		
177		Zemní práce	9 dní	6.8.12 8:00	16.8.12 17:00	170	
178		Zakládání	9 dní	6.8.12 7:00	16.8.12 17:00		
179		Úpravy povrchů,podlahy...	8 dní	27.8.12 8:00	5.9.12 17:00	178FS-1 den;192FS-2 dní	
180		Ostatní konstrukce	8 dní	28.8.12 8:00	6.9.12 17:00	181;173	
181		Isolace - voda,vlhkost,plyn	7 dní	17.8.12 8:00	27.8.12 17:00	178	
182		Podlahové krytiny	8 dní	27.9.12 8:00	8.10.12 17:00	183	
183		Isolace tepelné	13 dní	9.9.12 7:00	26.9.12 17:00	175	
184		Konstrukce tesařské	12 dní	7.9.12 7:00	24.9.12 17:00	175FS-4 dní;179	
185		Montované konstrukce - ...	12 dní	10.9.12 7:00	25.9.12 17:00		
186		Konstrukce truhlářské	9 dní	1.10.12 8:00	11.10.12 17:00	187	
187		Konstrukce zámečnické	6 dní	21.9.12 8:00	28.9.12 17:00	191FS-2 dní;180	
188		Podlahy povlakové	13 dní	18.9.12 7:00	4.10.12 17:00		
189		Podlahy lité	23 dní	18.9.12 7:00	18.10.12 17:00		
190		Dokonč.práce - malby	5 dní	9.10.12 8:00	15.10.12 17:00	186FS-3 dní	
191		Montáž a dod. Ocel.kons...	12 dní	7.9.12 8:00	24.9.12 17:00	180;192	
192		Vnitřní kanalizace	8 dní	17.8.12 8:00	28.8.12 17:00	177	
193		vnitřní vodovod	11 dní	20.8.12 8:00	3.9.12 17:00	198	
194		Zařizovací předměty - do...	10 dní	25.9.12 8:00	8.10.12 17:00	184	
195		Ústřední vytápění - otop...	8 dní	26.9.12 8:00	5.10.12 17:00	185	
196		Elektro - Dodávky a mon...	9 dní	17.9.12 7:00	27.9.12 17:00		
197		Vzduchotechnika	8 dní	5.10.12 8:00	16.10.12 17:00	199	
198		Přípojka kanalizace a vo...	12 dní?	2.8.12 7:00	17.8.12 17:00		
199		Přípojka elektro a slabop...	8 dní?	25.9.12 8:00	4.10.12 17:00	191	
200		<b>ISO 702.1 - Vrátnice 3</b>	<b>49 dní?</b>	<b>24.9.12 7:00</b>	<b>29.11.12 17:00</b>		
201		Zemní práce	7 dní	24.9.12 7:00	2.10.12 17:00		
202		Zakládání	21 dní	28.9.12 8:00	26.10.12 17:00	196	
203		Ostatní konstrukce - kon...	15 dní	29.10.12 8:00	16.11.12 17:00	202	
204		Konstrukce zámečnické	11 dní	30.10.12 8:00	13.11.12 17:00	206	

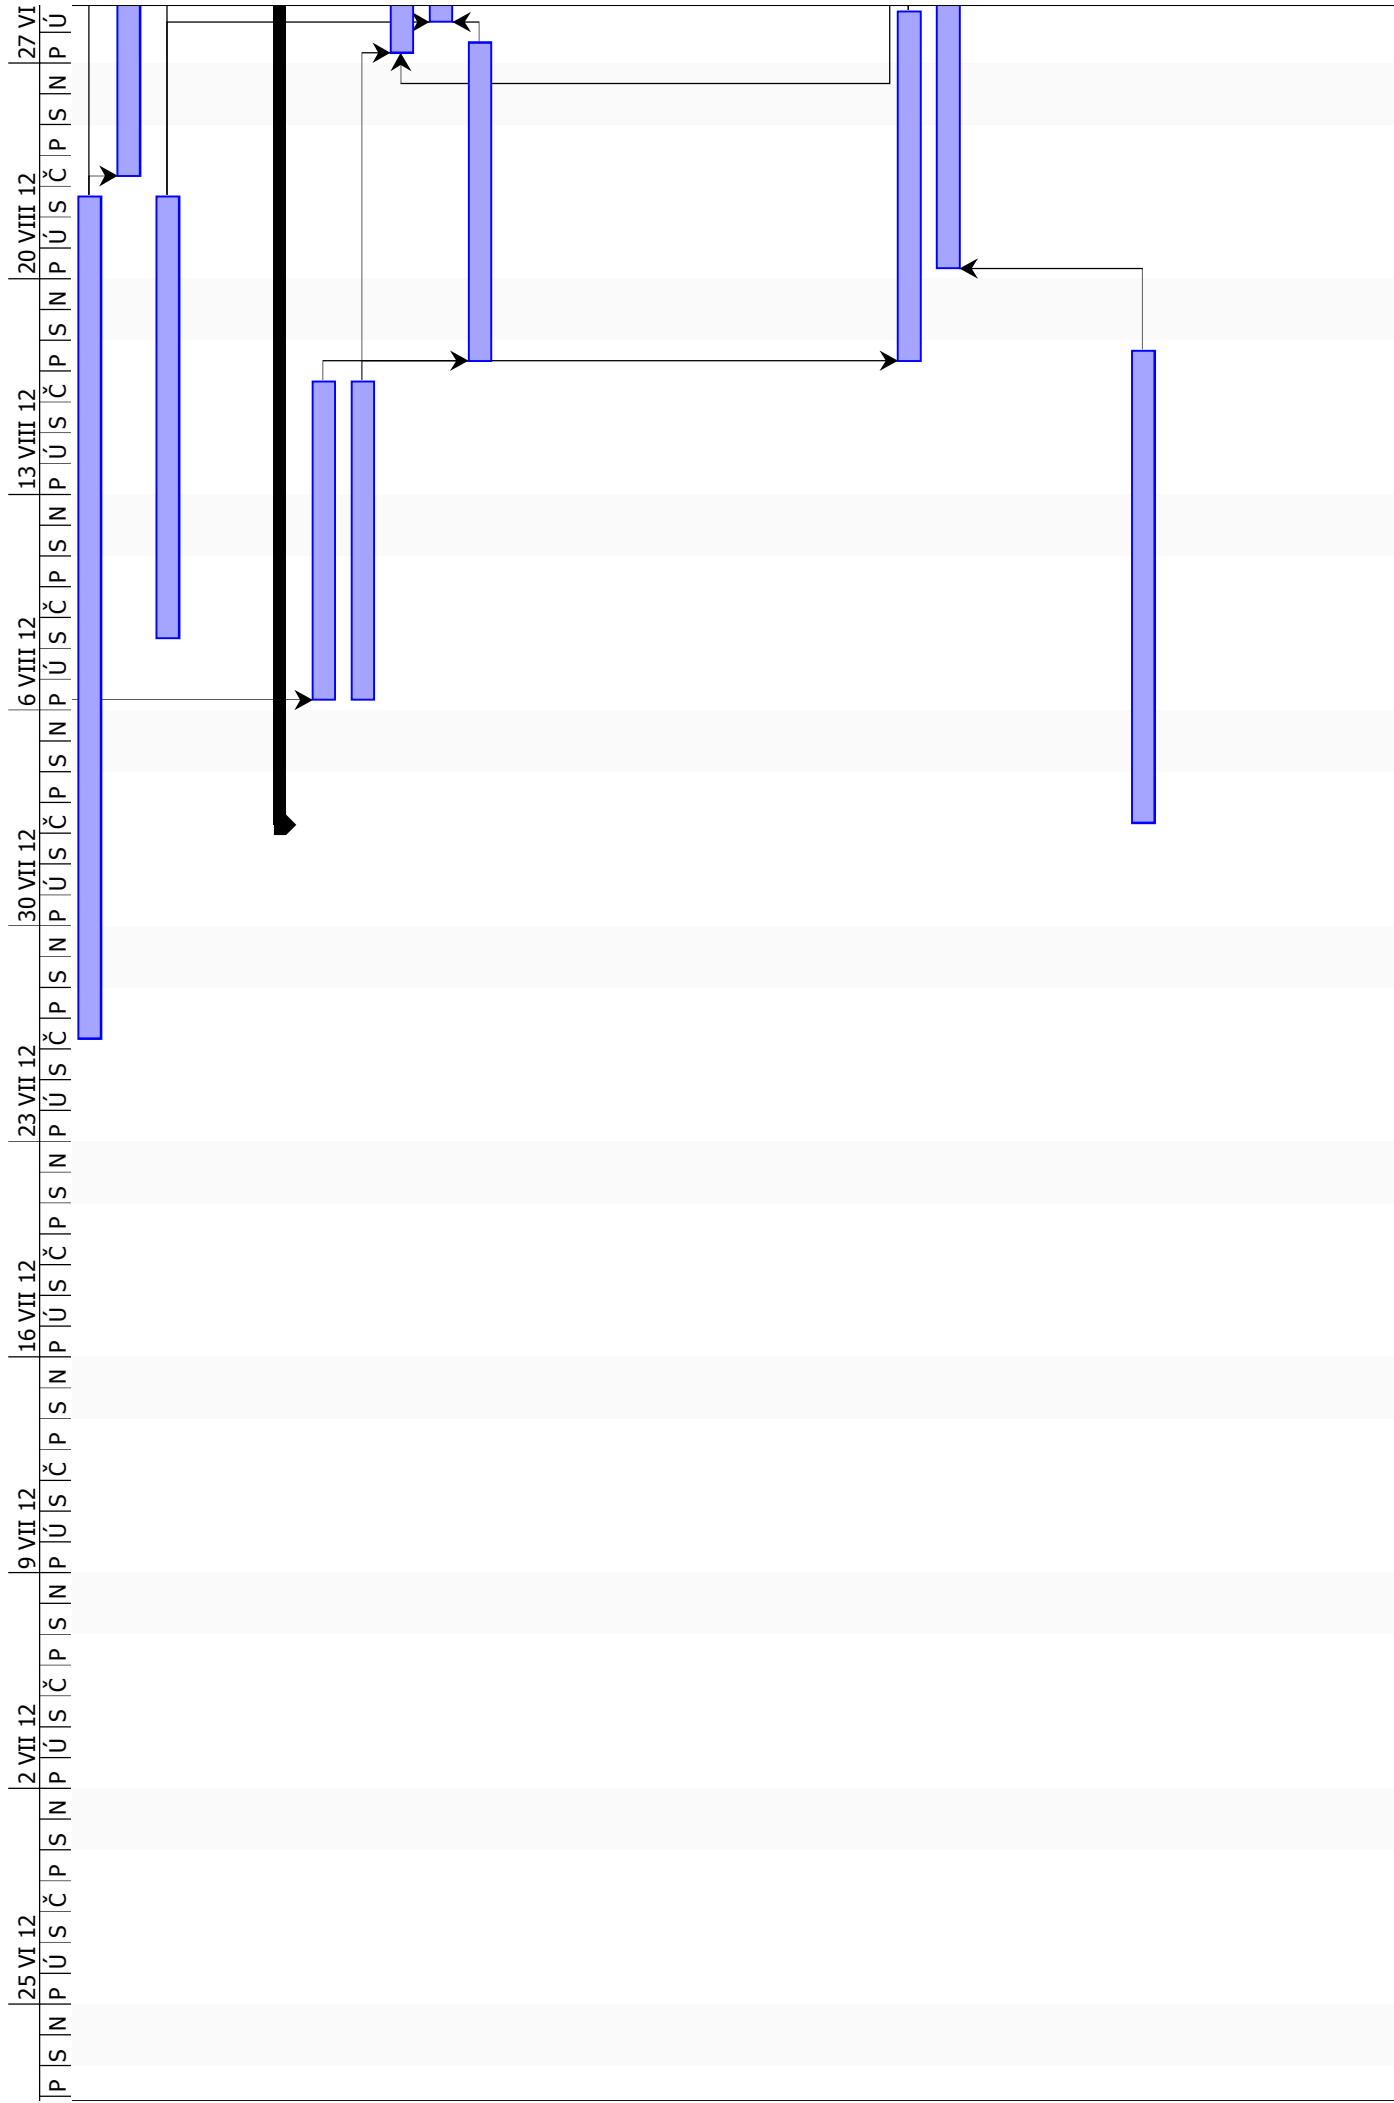

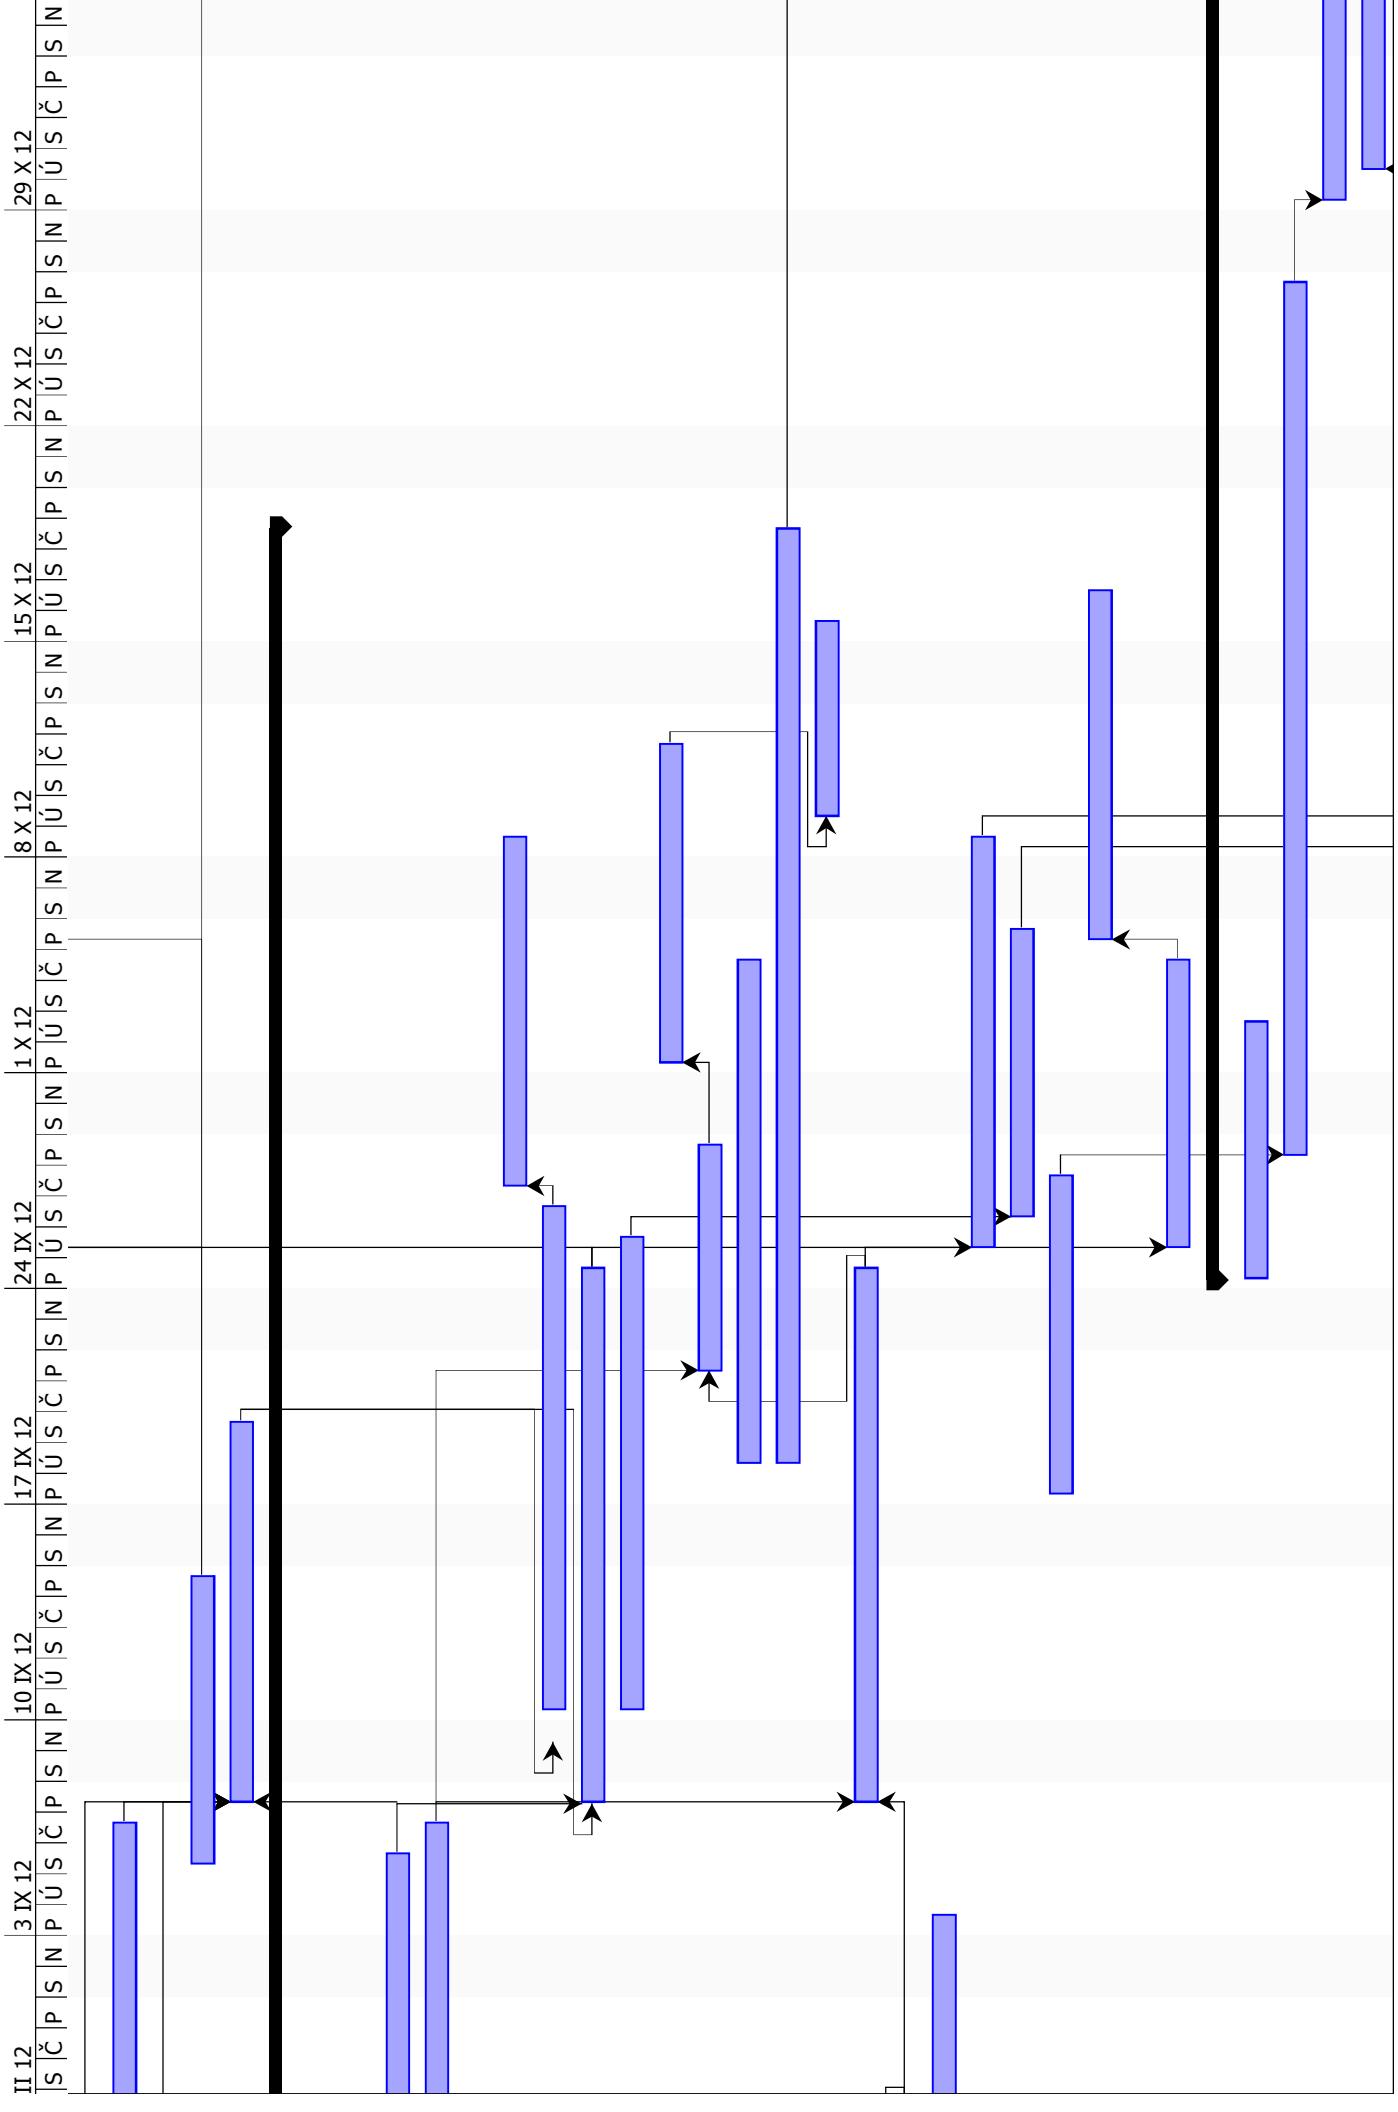

5 XI 12	12 XI 12	19 XI 12	26 XI 12	3 XII 12	10 XII 12	17 XII 12	24 XII 12	31 XII 12	7 I 13
P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
Ú	Ú	Ú	Ú	Ú	Ú	Ú	Ú	Ú	Ú
S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Č	Č	Č	Č	Č	Č	Č	Č	Č	Č
P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Ú	Ú	Ú	Ú	Ú	Ú	Ú	Ú	Ú	Ú
S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Č	Č	Č	Č	Č	Č	Č	Č	Č	Č
P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Ú	Ú	Ú	Ú	Ú	Ú	Ú	Ú	Ú	Ú
S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Č	Č	Č	Č	Č	Č	Č	Č	Č	Č
P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Ú	Ú	Ú	Ú	Ú	Ú	Ú	Ú	Ú	Ú
S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Č	Č	Č	Č	Č	Č	Č	Č	Č	Č
P	P	P	P	P	P	P	P	P	P





25 III 13	1 IV 13	8 IV 13	15 IV 13	22 IV 13	29 IV 13	6 V 13	13 V 13	20 V 13	27	
Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P	Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P	Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P	Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P	Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P	Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P	Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P	Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P	Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P	Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P	Č P S N P

V 13	3 VI 13	10 VI 13	17 VI 13	24 VI 13	1 VII 13	8 VII 13	15 VII 13	22 VII 13	29 VII 13
Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S									

5 VIII 13	N	P	Ú	S	Č	P	S	N	P	Ú	S	Č	P	S	N	P	Ú	S	Č	7 X 13
12 VIII 13	P	Ú	S	Č	P	S	N	P	Ú	S	Č	P	S	N	P	Ú	S	Č	P	30 IX 13
19 VIII 13	P	Ú	S	Č	P	S	N	P	Ú	S	Č	P	S	N	P	Ú	S	Č	P	23 IX 13
26 VIII 13	P	Ú	S	Č	P	S	N	P	Ú	S	Č	P	S	N	P	Ú	S	Č	P	16 IX 13
2 IX 13	P	Ú	S	Č	P	S	N	P	Ú	S	Č	P	S	N	P	Ú	S	Č	P	9 IX 13
9 IX 13	P	Ú	S	Č	P	S	N	P	Ú	S	Č	P	S	N	P	Ú	S	Č	P	2 IX 13
16 IX 13	P	Ú	S	Č	P	S	N	P	Ú	S	Č	P	S	N	P	Ú	S	Č	P	16 IX 13
23 IX 13	P	Ú	S	Č	P	S	N	P	Ú	S	Č	P	S	N	P	Ú	S	Č	P	23 IX 13
30 IX 13	P	Ú	S	Č	P	S	N	P	Ú	S	Č	P	S	N	P	Ú	S	Č	P	30 IX 13
7 X 13	P	Ú	S	Č	P	S	N	P	Ú	S	Č	P	S	N	P	Ú	S	Č	P	7 X 13

14 X 13

P S N

21 X 13

P S N

28 X 13

P S N

4 X 13

P S N

11 X 13

P S N

18 X 13

P S N

25 X 13

P S N

2 X XII 13

P S N

9 XII 13

P S N

16 XI

P S N


I 13	23 XII 13	30 XII 13	6 I 14	13 I 14	20 I 14	27 I 14	3 II 14	10 II 14	17 II 14
S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N	S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N	S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N	S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N	S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N	S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N	S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N	S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N	S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N	S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N


24 II 14	3 III 14	10 III 14	17 III 14	24 III 14	31 III 14	7 IV 14	14 IV 14	21 IV 14	28 IV 14
P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P	P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P	P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P	P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P	P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P	P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P	P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P	P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P	P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P	P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P


S	N	P	Ú	S	Č	P	S	N	P	Ú	S	Č	P	S	N	P	Ú	S
5 V 14																		
S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S																		
12 V 14																		
S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S																		
19 V 14																		
S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S																		
26 V 14																		
S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S																		



		Jméno	Trvání	Začátek	Konec	Předchůdci	Jména zdrojů
205		Konstrukce klempířské	13 dní	29.10.12 7:00	14.11.12 17:00		
206		Vnitřní kanalizace	16 dní	8.10.12 8:00	29.10.12 17:00	195	
207		vnitřní vodovod	16 dní	9.10.12 8:00	30.10.12 17:00	194;222	
208		Zařizovací předměty - do...	12 dní	30.10.12 8:00	14.11.12 17:00	206	
209		Isolace tepelné	6 dní	14.11.12 8:00	21.11.12 17:00	204;210	
210		Strojovna	11 dní?	30.10.12 8:00	13.11.12 17:00	206	
211		Vytápění - potrubí + arm...	14 dní	31.10.12 8:00	19.11.12 17:00	207	
212		Nátěry	9 dní	19.11.12 8:00	29.11.12 17:00	203;213	
213		Rozvody elektro	11 dní	26.10.12 8:00	9.11.12 17:00	215	
214		Rozvody slaboproudé	10 dní	26.10.12 8:00	8.11.12 17:00	216	
215		Přípojka kanalizace a vo...	9 dní	13.10.12 7:00	25.10.12 17:00	222	
216		Přípojka horkovodu	7 dní	17.10.12 8:00	25.10.12 17:00	217	
217		Přípojka elektro	7 dní	8.10.12 7:00	16.10.12 17:00	222	
218		Přípojka slaboproudu	7 dní	8.10.12 7:00	16.10.12 17:00		
219		<b>ISO 703.1 - Stavební úp...</b>	<b>177 dní?</b>	<b>1.8.12 7:00</b>	<b>4.4.13 17:00</b>		
220		Zemní práce	8 dní	1.8.12 7:00	10.8.12 17:00		
221		Zakládání	10 dní	1.8.12 7:00	14.8.12 17:00		
222		Svislé a kompletní konstr...	32 dní	13.8.12 8:00	25.9.12 17:00	220	
223		Vodorovné konstrukce	24 dní	10.8.12 8:00	12.9.12 17:00	221FS-3 dní	
224		Komunikace	13 dní	19.3.13 7:00	4.4.13 17:00		
225		Úpravy povrchů, podlahy...	133 dní	25.9.12 8:00	28.3.13 17:00	222FS-1 den	
226		Trubní vedení	12 dní	26.11.12 8:00	11.12.12 17:00	223;233	
227		Ostatní konstrukce a práce	71 dní	13.8.12 7:00	19.11.12 17:00		
228		Isolace proti vodě, vlhko...	16 dní	15.8.12 8:00	5.9.12 17:00	221	
229		Povlakové krytiny	44 dní	15.10.12 8:00	13.12.12 17:00	228;232	
230		Isolace tepelné	20 dní	9.8.12 7:00	5.9.12 17:00		
231		Konstrukce tesařské	47 dní	6.9.12 8:00	9.11.12 17:00	230	
232		Konstrukce montované z...	27 dní	6.9.12 8:00	12.10.12 17:00	228	
233		Konstrukce klempířské	30 dní	15.10.12 8:00	23.11.12 17:00	232;236FS-1 den;222	
234		Konstrukce truhlářské	43 dní	14.8.12 7:00	11.10.12 17:00		
235		Konstrukce zámečnické	33 dní	13.8.12 7:00	26.9.12 17:00		
236		Plastové výrobky	16 dní	8.9.12 7:00	1.10.12 17:00		
237		Podlahy z dlaždic	65 dní	25.9.12 8:00	24.12.12 17:00	222FS-1 den	
238		Podlahy povlakové	20 dní	19.8.12 7:00	14.9.12 17:00		

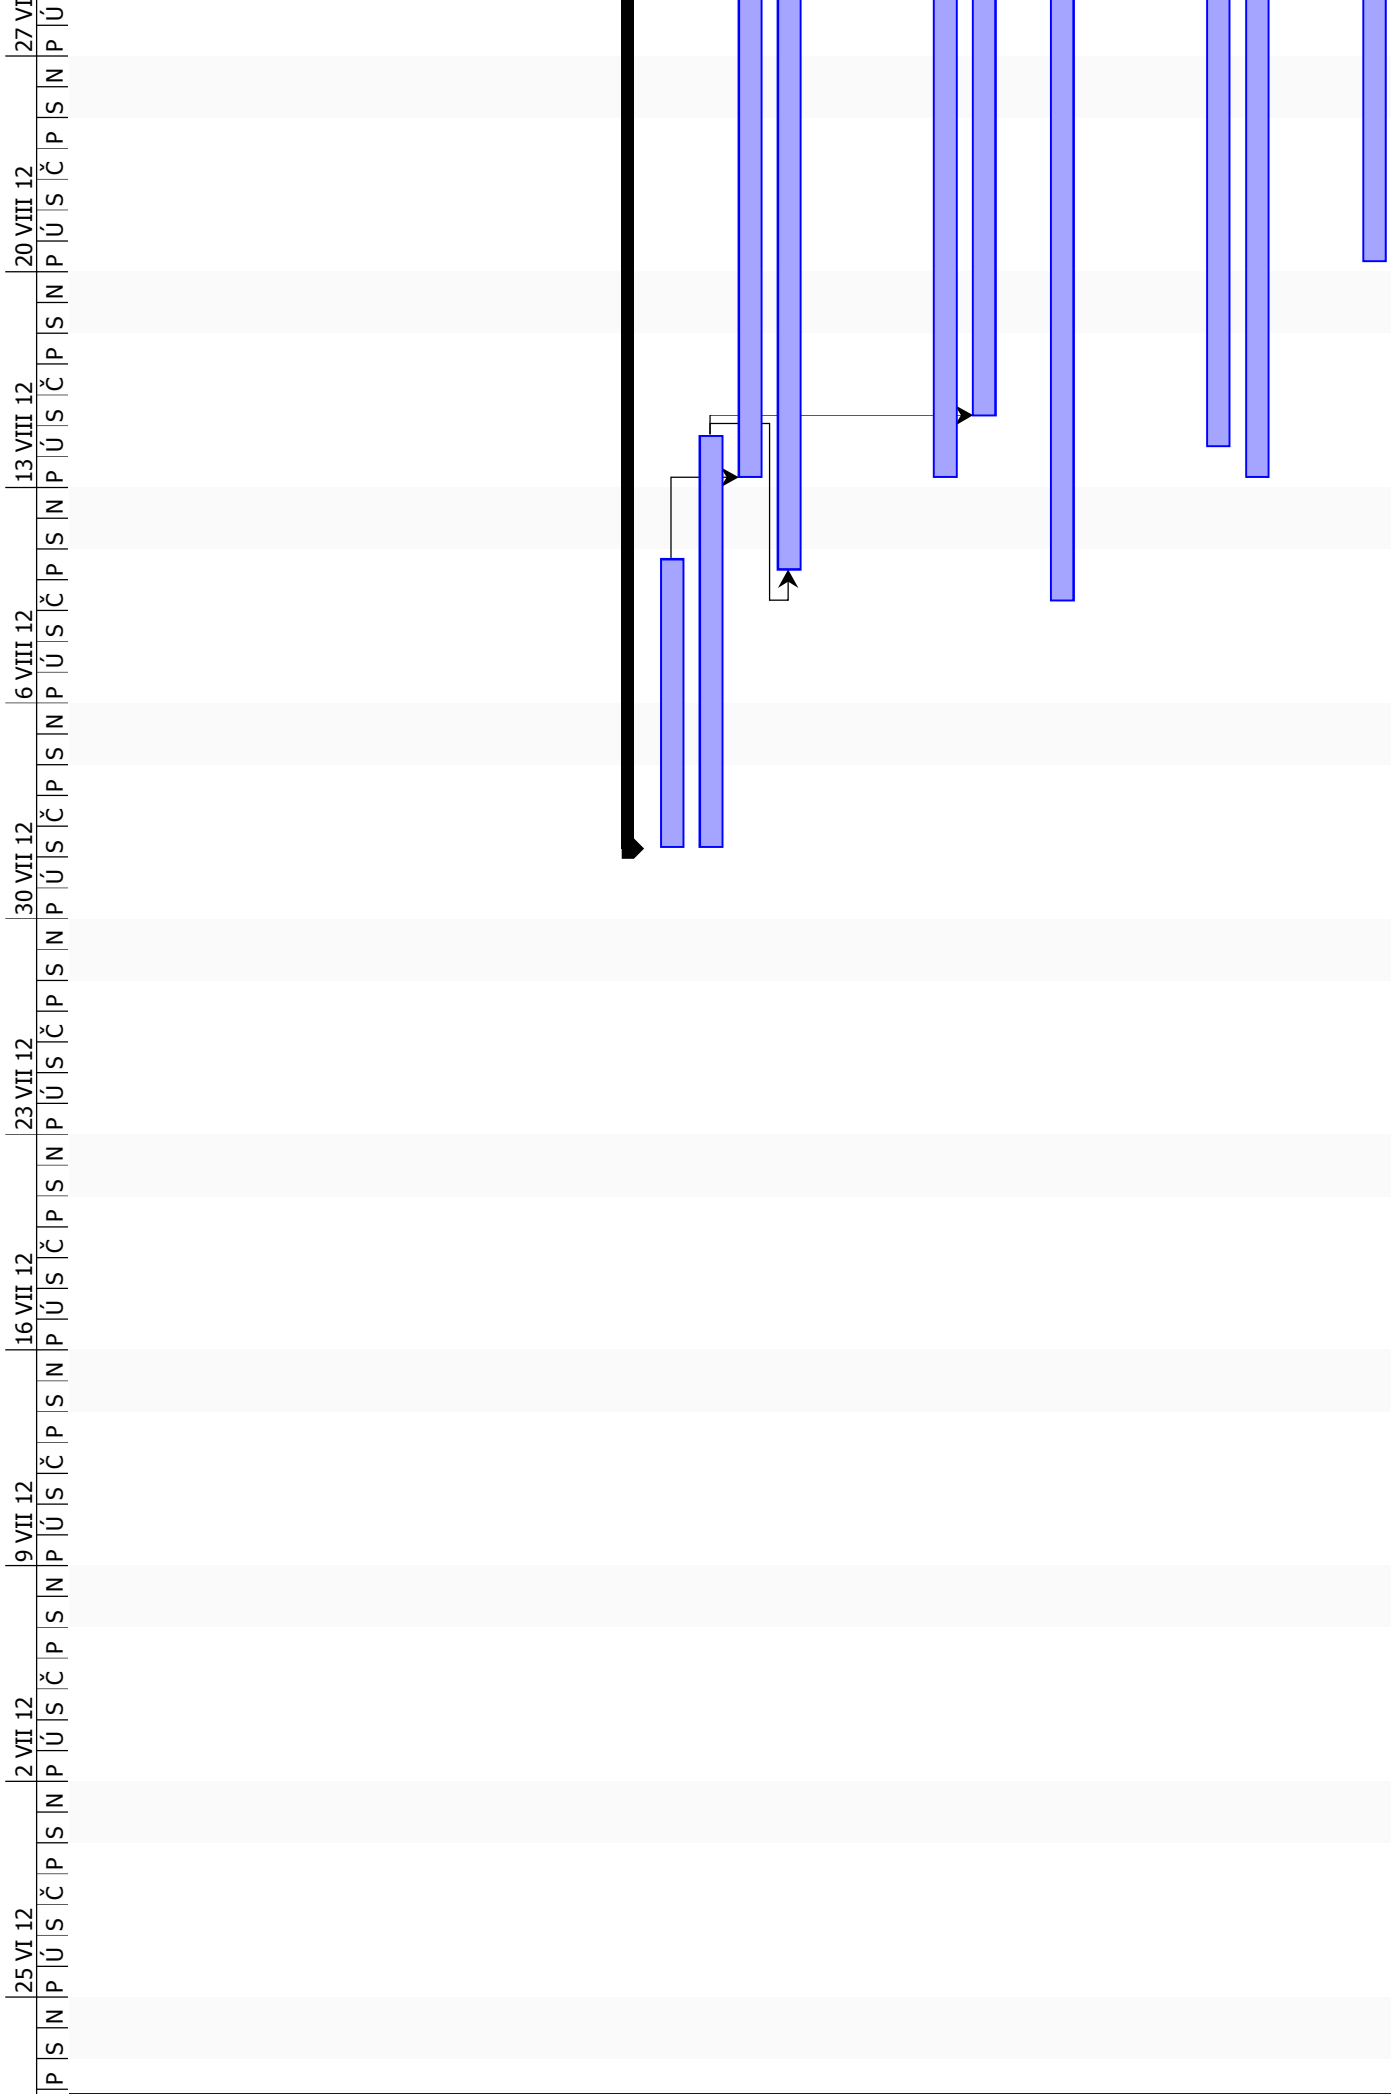

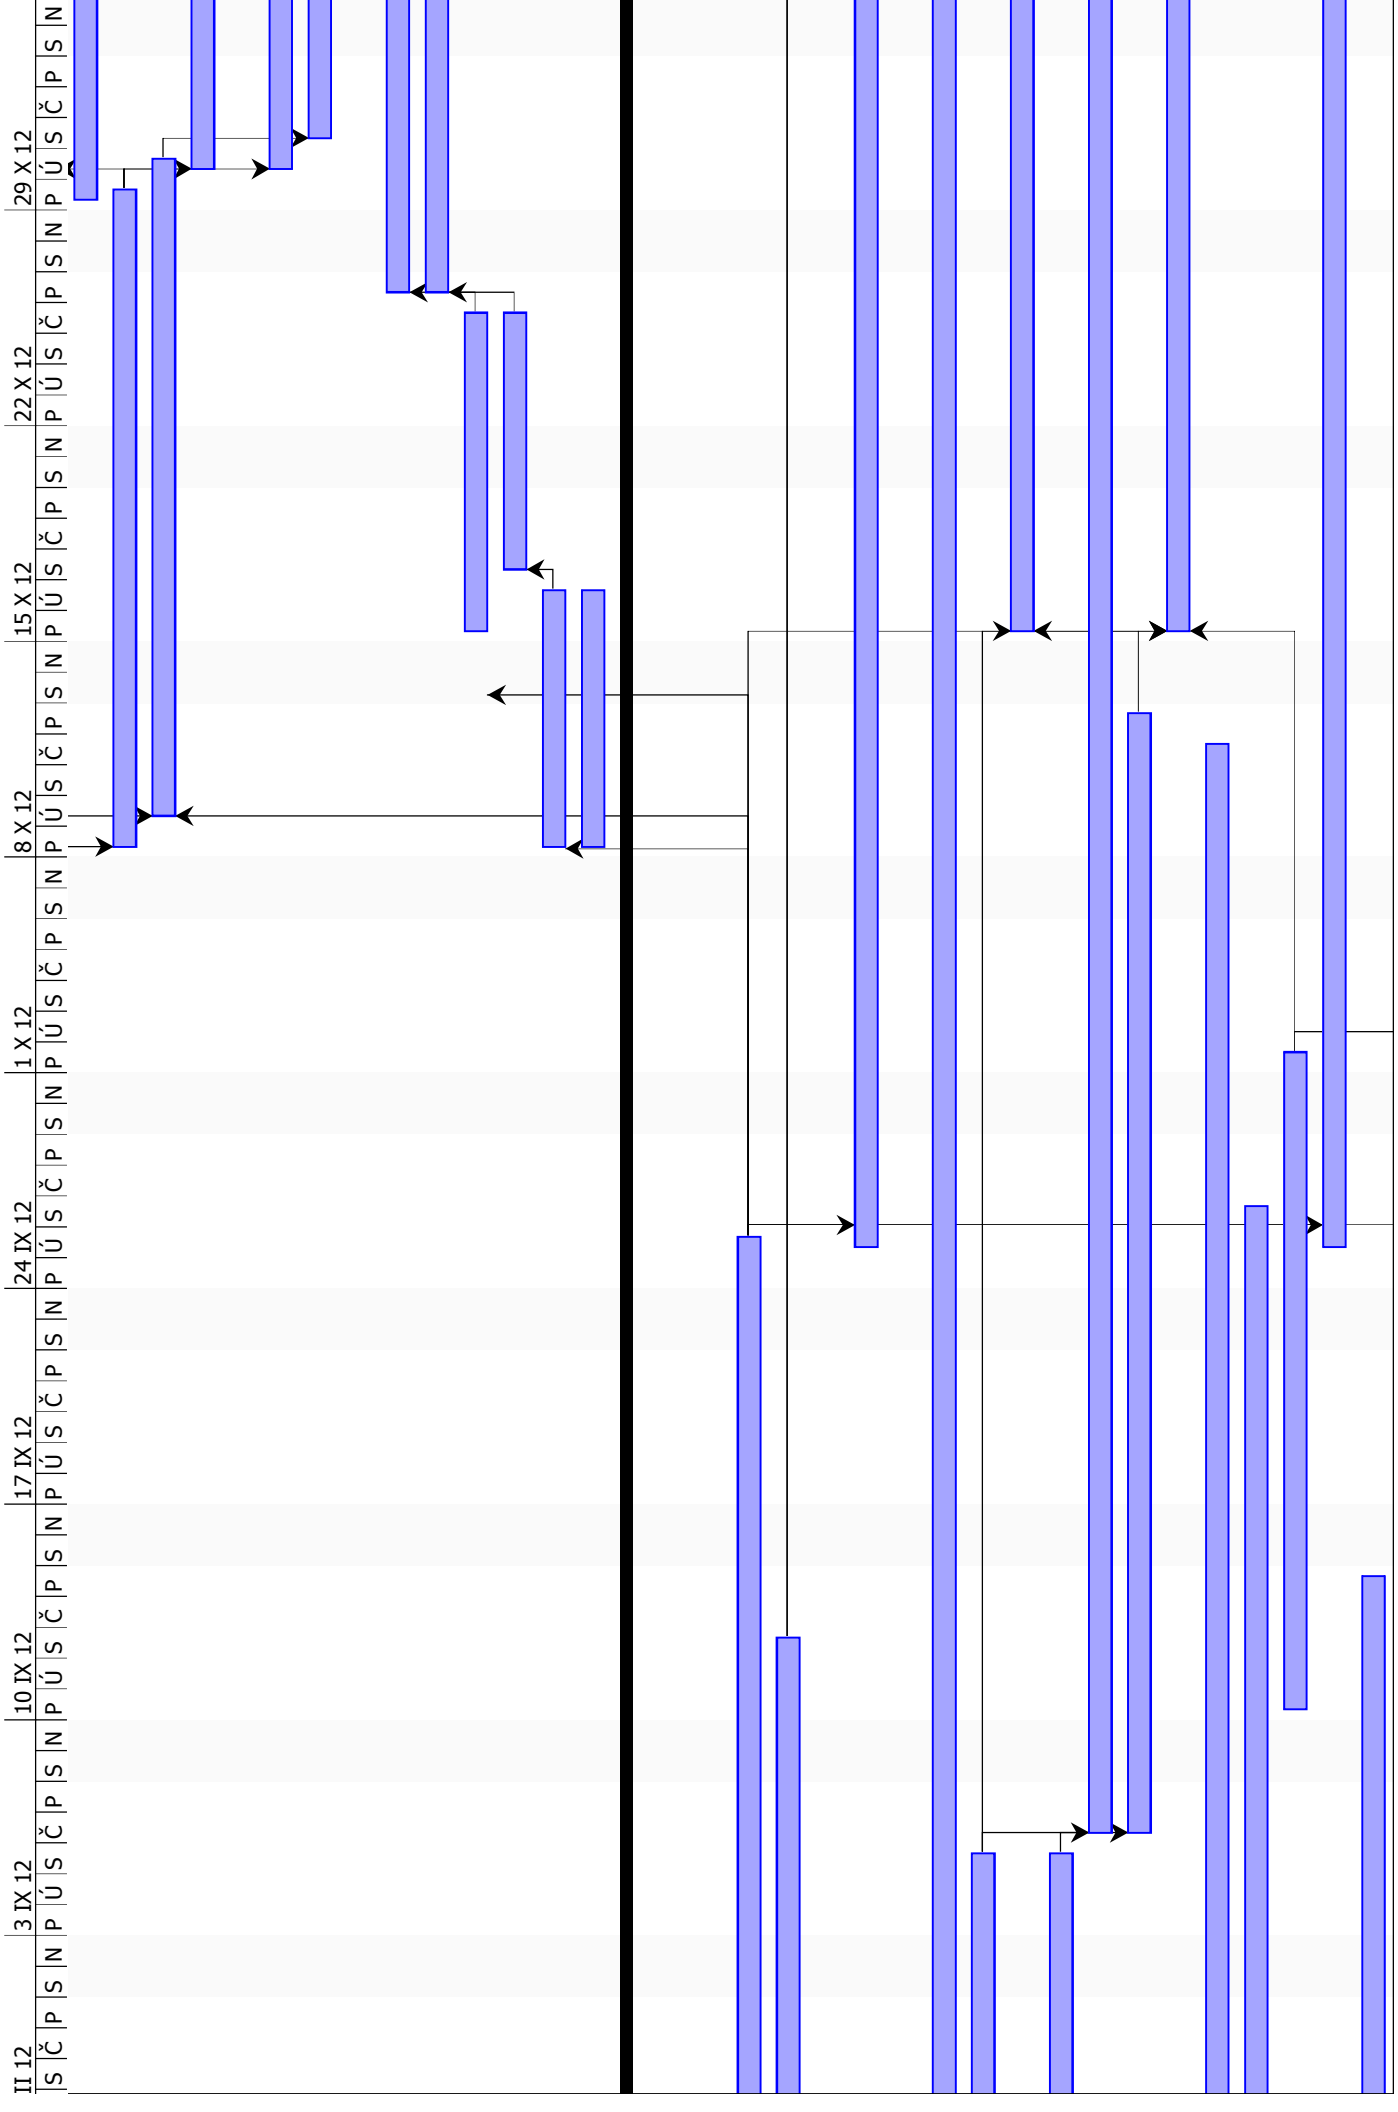

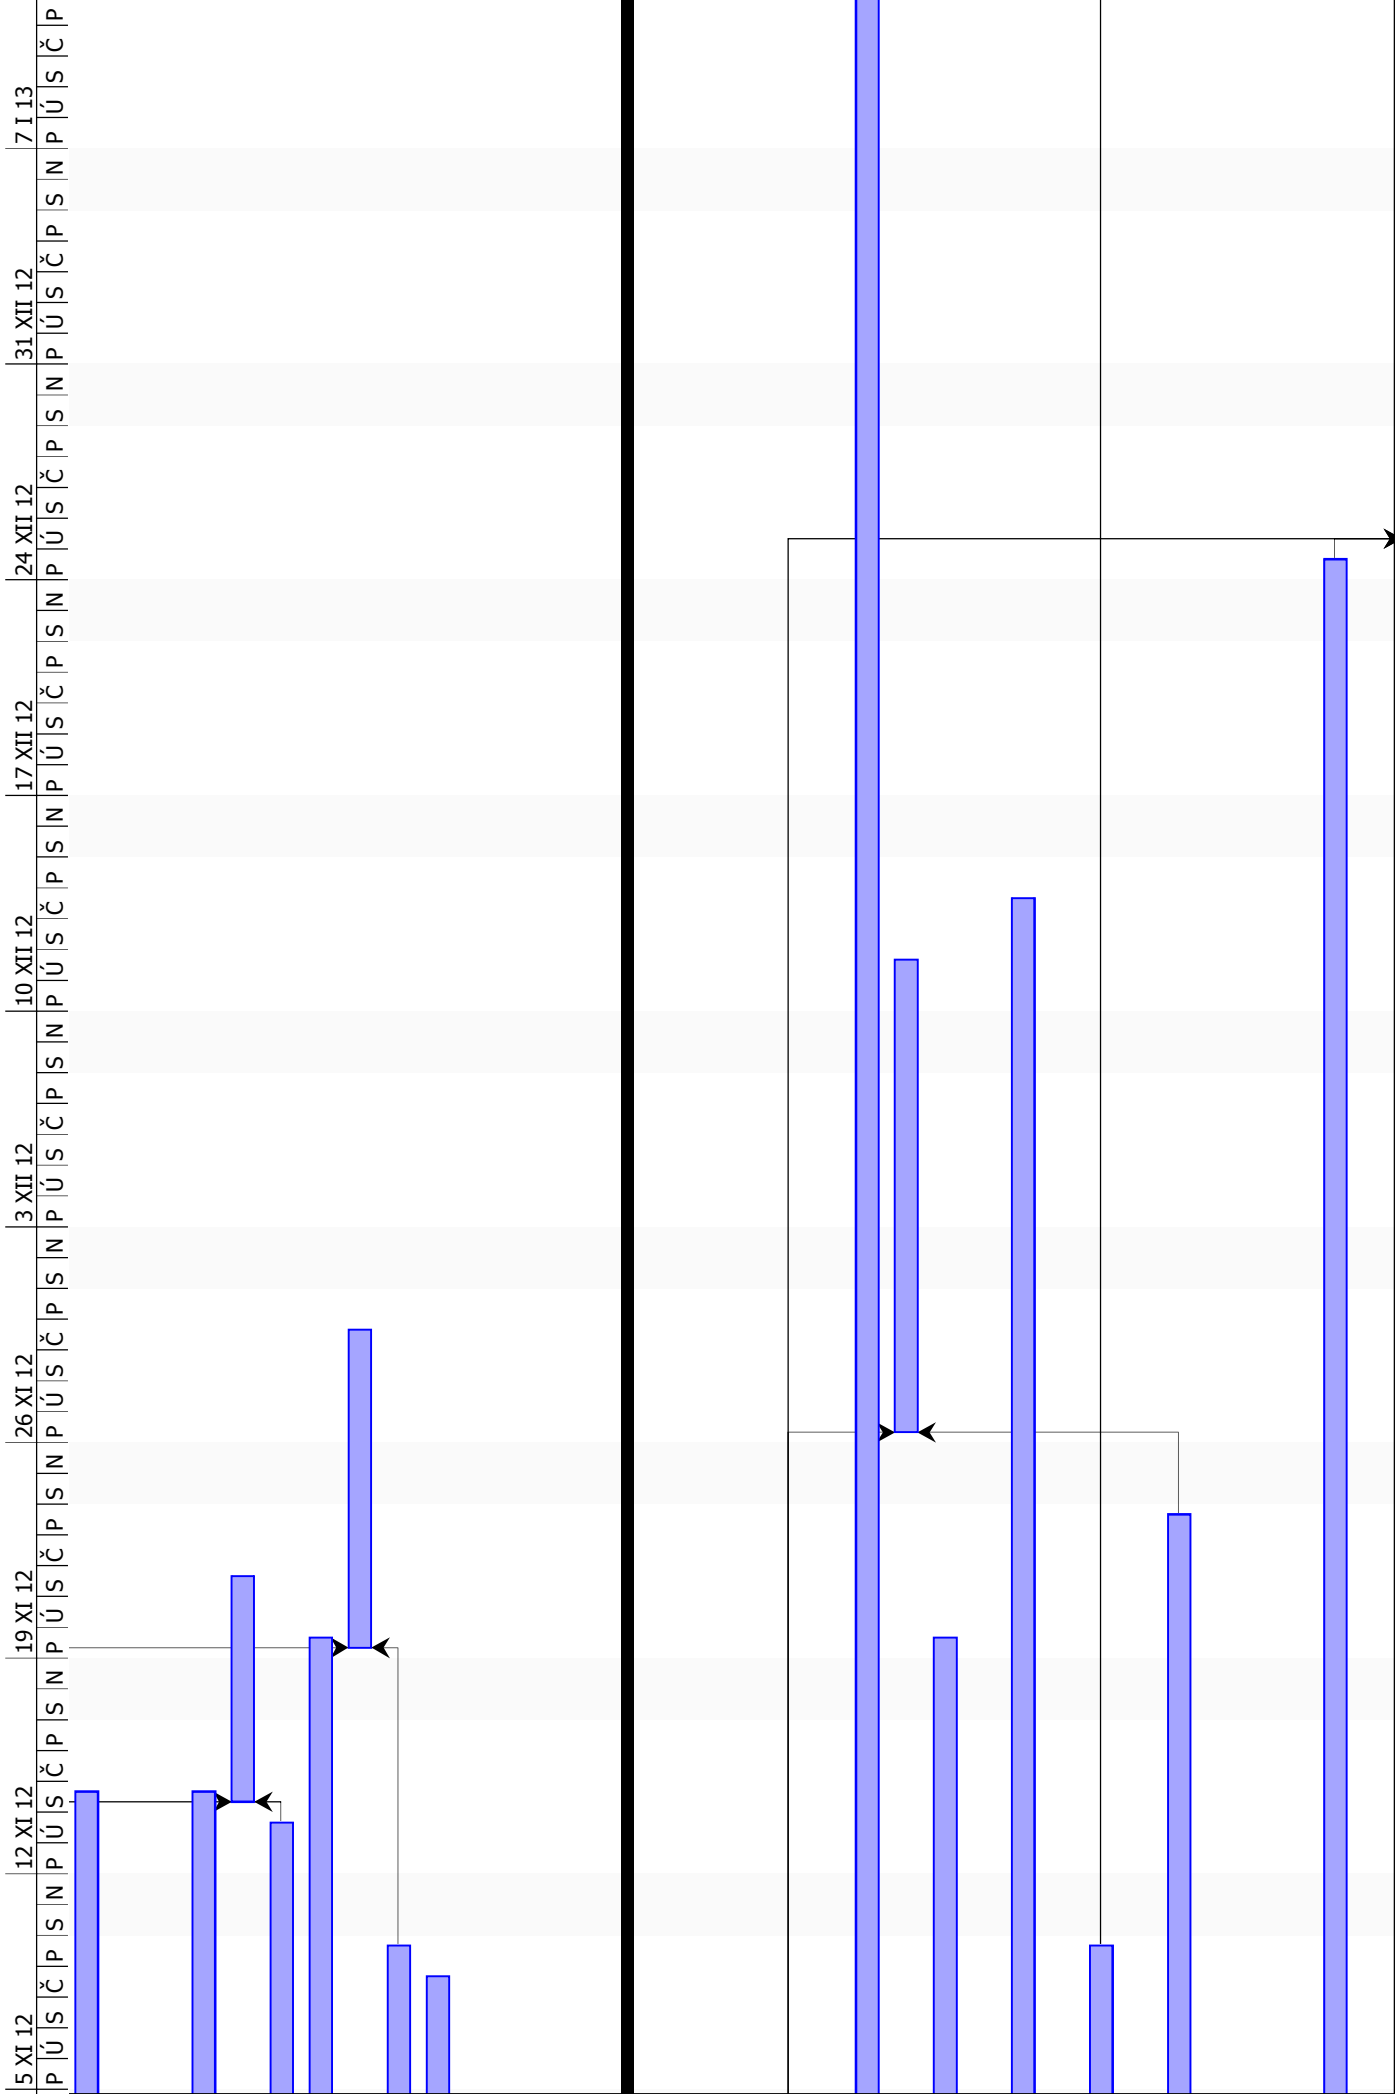













I 13

S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N

23 XII 13

S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N

30 XII 13

S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N

6 I 14

S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N

13 I 14

S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N

20 I 14

S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N

27 I 14

S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N

3 II 14

S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N

10 II 14

S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N

17 II 14

S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N


24 II 14	3 III 14	10 III 14	17 III 14	24 III 14	31 III 14	7 IV 14	14 IV 14	21 IV 14	28 IV 14
P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P	P   Ú   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P	P   Ú   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P	P   Ú   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P	P   Ú   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P	P   Ú   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P	P   Ú   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P	P   Ú   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P	P   Ú   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P	P   Ú   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P

S	N	P	Ú	S	Č	P	S	N	P	Ú	S	Č	P	S	N	P	Ú	S
5 V 14																		
S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S																		
12 V 14																		
S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S																		
19 V 14																		
S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S																		
26 V 14																		
S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S																		


		Jméno	Trvání	Začátek	Konec	Předchůdci	Jména zdrojů
239		Podlahy lité	11 dní	25.12.12 8:00	8.1.13 17:00	237;223	
240		Obklady keramické	43 dní	2.10.12 8:00	29.11.12 17:00	236	
241		Nátěry	26 dní	14.1.13 7:00	18.2.13 17:00	231;246;247;248	
242		Malby	24 dní	30.11.12 8:00	2.1.13 17:00	240	
243		Zdravotechnické instalace	51 dní	7.9.12 8:00	16.11.12 17:00	222FS-13 dní	
244		Vzduchotechnika - dodá...	44 dní	1.9.12 7:00	1.11.12 17:00		
245		Vytápění	56 dní	1.9.12 7:00	19.11.12 17:00		
246		Montáž elektro silnoproud	55 dní	16.9.12 7:00	30.11.12 17:00		
247		Vodovodní přípojka	30 dní	1.11.12 7:00	12.12.12 17:00		
248		Horkovodní přípojka	37 dní?	4.11.12 7:00	25.12.12 17:00		
249		<b>ISO 704.1.1 - Stav.úpra...</b>	<b>57 dní?</b>	<b>13.12.12 8:00</b>	<b>1.3.13 17:00</b>		
250		Svislé a kompletní konstr...	17 dní	11.1.13 7:00	4.2.13 17:00		
251		Úpravy povrchů,podlahy...	17 dní	25.1.13 7:00	18.2.13 17:00		
252		Ostatní konstrukce a prá...	30 dní	13.12.12 8:00	23.1.13 17:00	247	
253		Izolace proti vodě,vlhko...	8 dní	17.1.13 7:00	28.1.13 17:00		
254		Isolace tepelné	7 dní	23.1.13 7:00	31.1.13 17:00		
255		Konstrukce tesařské	8 dní	1.2.13 7:00	12.2.13 17:00		
256		Konstrukce truhlářské	14 dní	21.1.13 7:00	7.2.13 17:00		
257		Podlahy z dlaždic	9 dní?	11.2.13 7:00	21.2.13 17:00		
258		Obklady keramické	9 dní	19.2.13 8:00	1.3.13 17:00	251	
259		Nátěry	6 dní	7.2.13 8:00	14.2.13 17:00	264	
260		Malby	7 dní	12.2.13 8:00	20.2.13 17:00	262	
261		Kanalizace vnitřní	14 dní	21.1.13 7:00	7.2.13 17:00		
262		Rozvody vody a komple...	10 dní	29.1.13 8:00	11.2.13 17:00	253	
263		Vzduchotechnika,dodávk...	15 dní	21.1.13 7:00	8.2.13 17:00		
264		Vytápění	13 dní	21.1.13 7:00	6.2.13 17:00		
265		Rozvody elektro	16 dní	21.1.13 7:00	11.2.13 17:00		
266		<b>ISO 704.2.1 - Stav.úpra...</b>	<b>63 dní?</b>	<b>7.1.13 7:00</b>	<b>3.4.13 17:00</b>		
267		Svislé a kompletní konstr...	16 dní	20.1.13 7:00	11.2.13 17:00		
268		Úpravy povrchů,podlahy...	16 dní	12.2.13 8:00	5.3.13 17:00	267	
269		Ostatní konstrukce a prá...	33 dní	7.1.13 7:00	20.2.13 17:00		
270		Izolace proti vodě,vlhko...	13 dní	21.1.13 7:00	6.2.13 17:00		
271		Isolace tepelné	15 dní	6.3.13 8:00	26.3.13 17:00	268;272	
272		Konstrukce tesařské	18 dní	8.1.13 7:00	31.1.13 17:00		




II.12.	3 IX.12	10 IX.12	17 IX.12	24 IX.12	1 X.12	8 X.12	15 X.12	22 X.12	29 X.12
S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N									

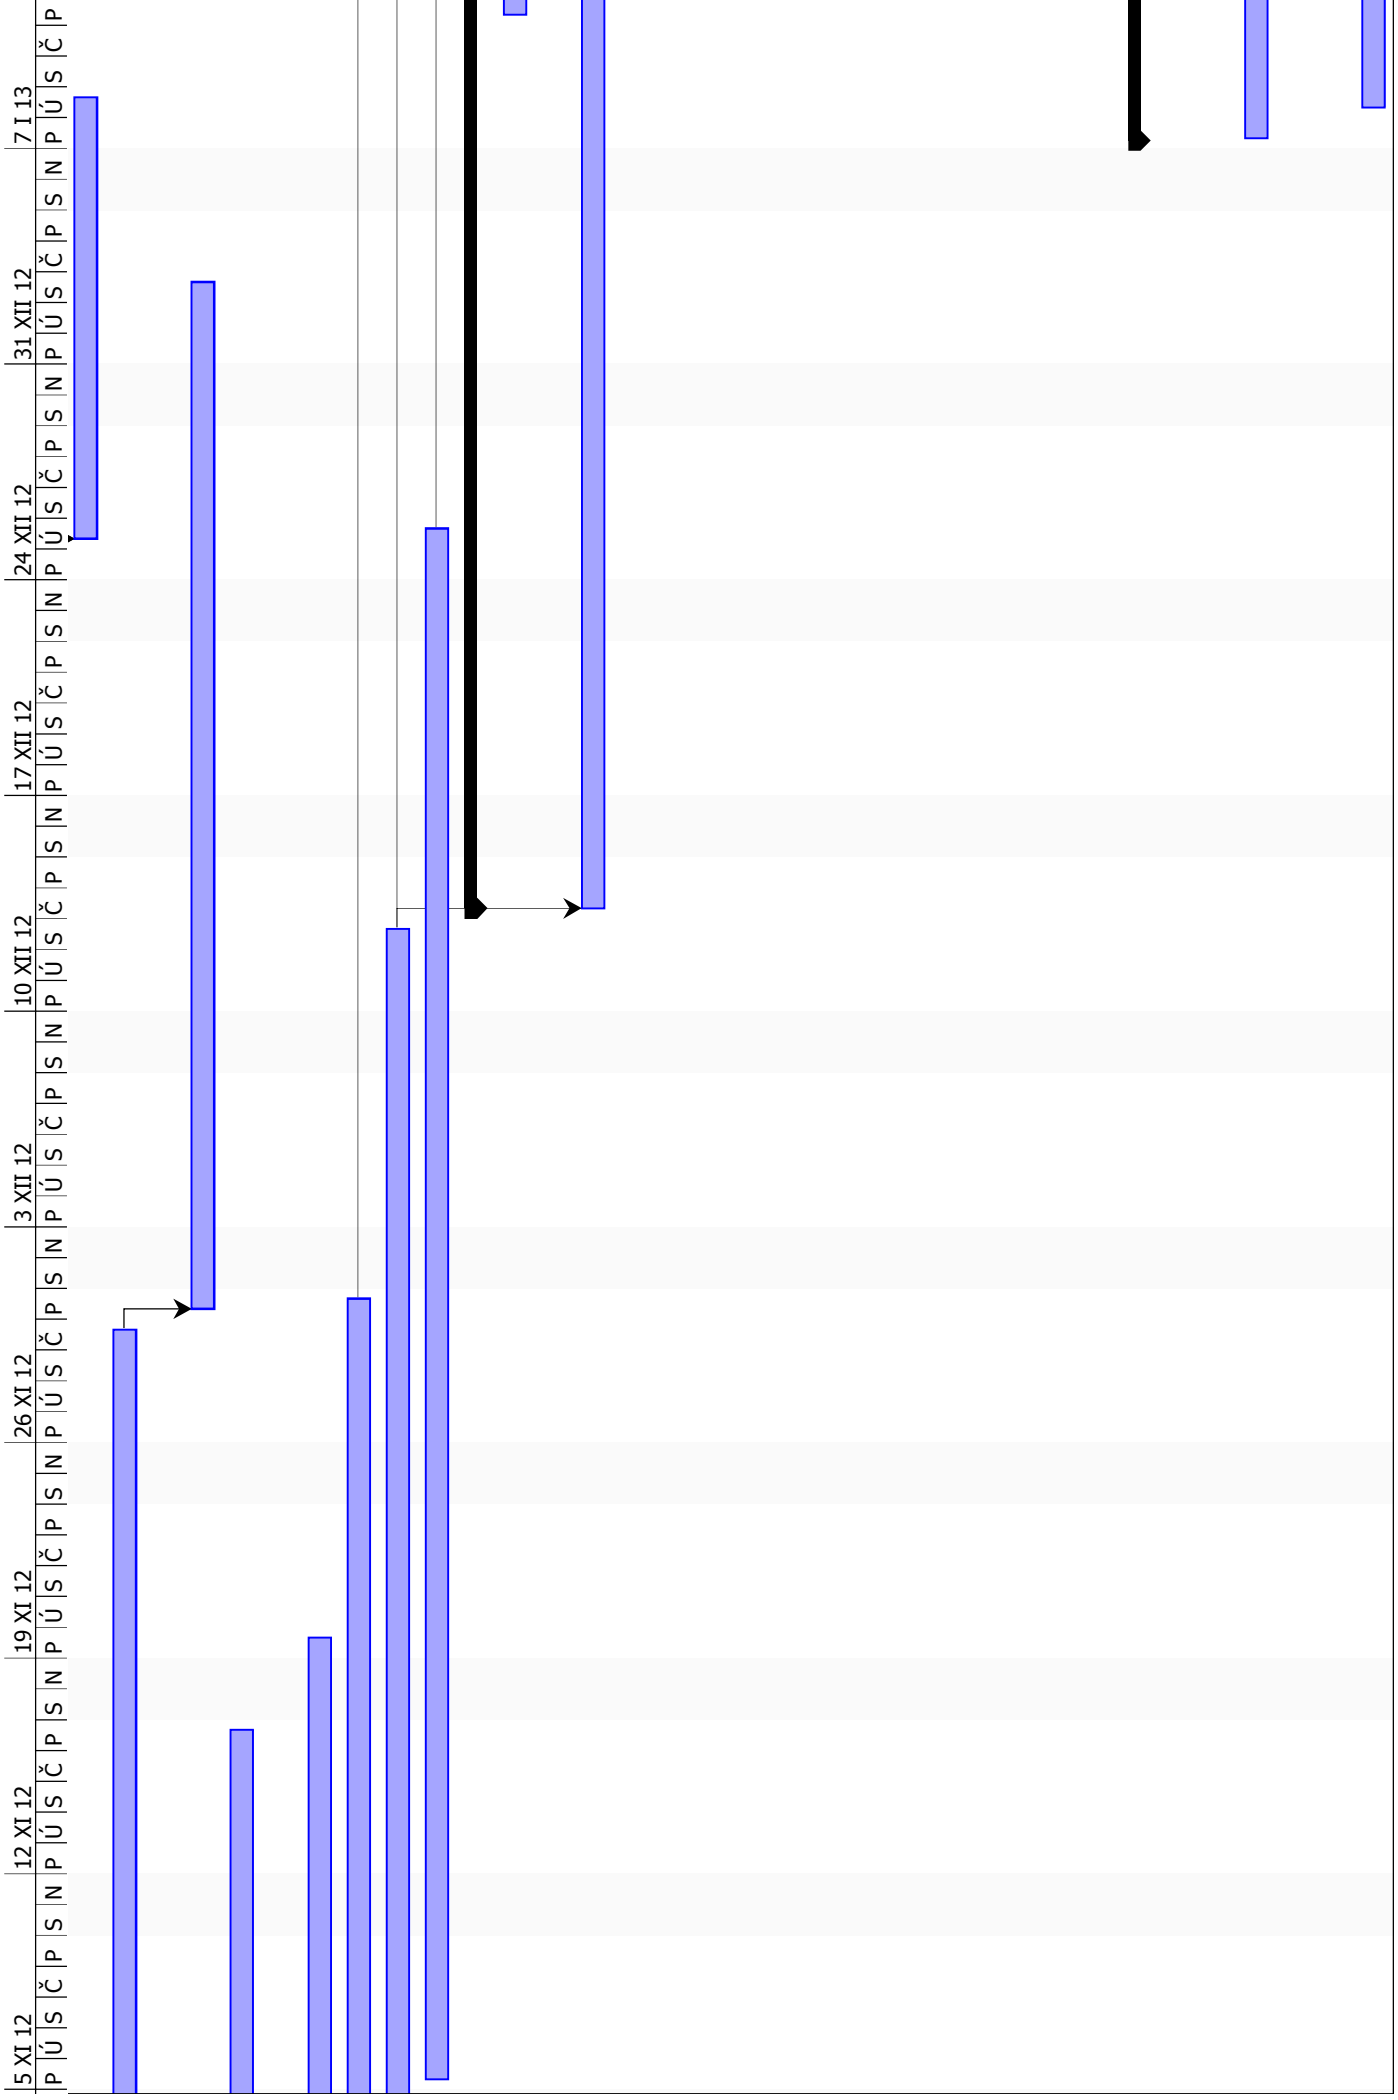



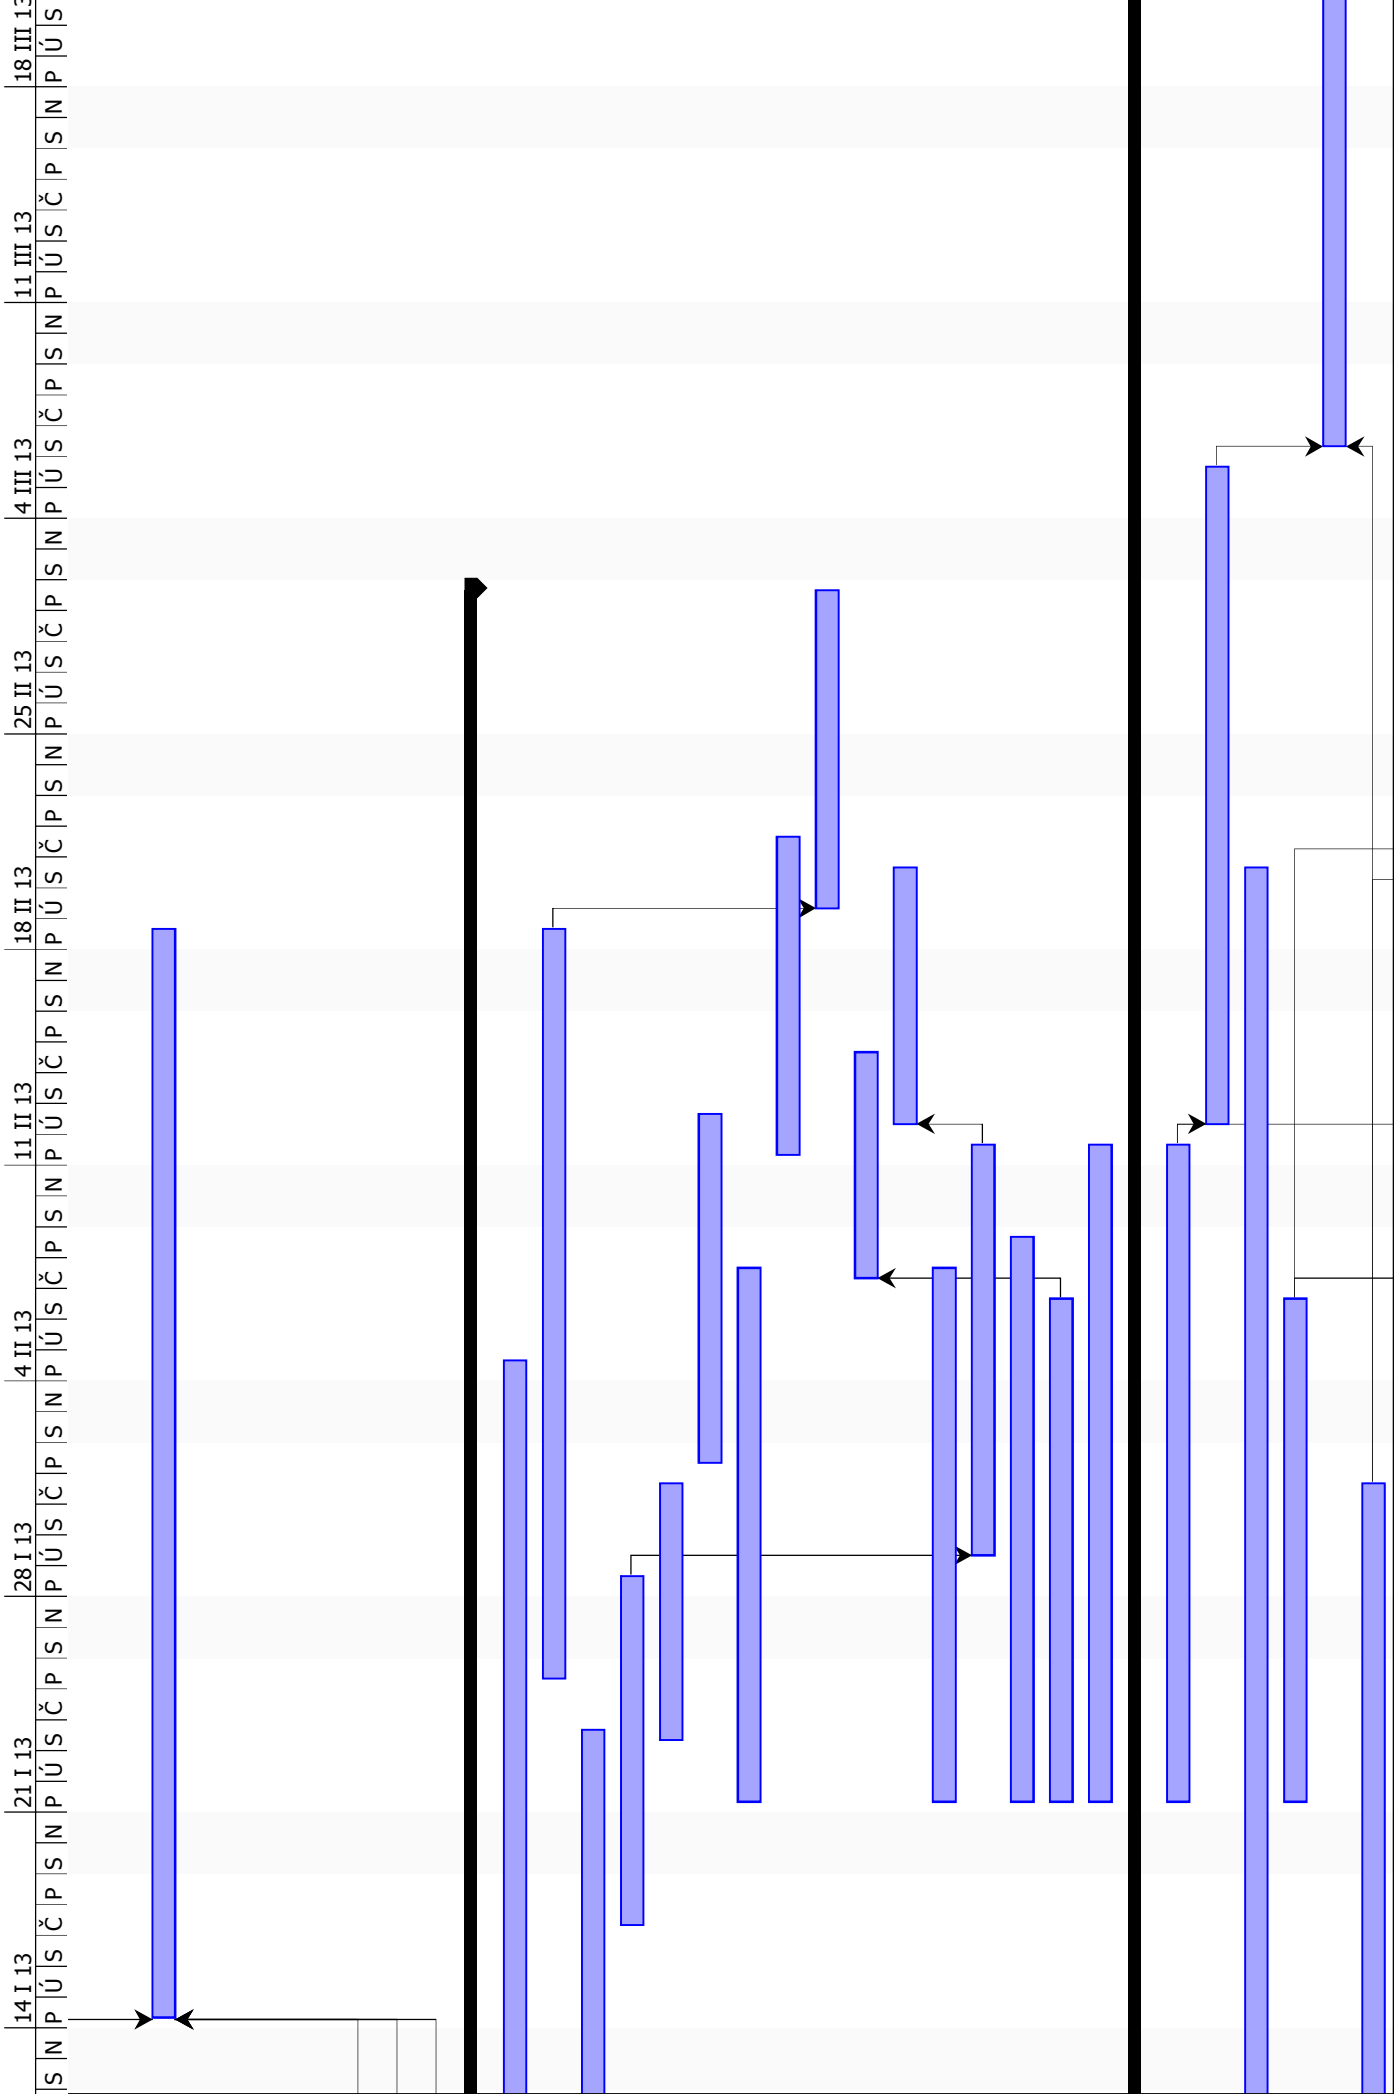

25 III 13	1 IV 13	8 IV 13	15 IV 13	22 IV 13	29 IV 13	6 V 13	13 V 13	20 V 13	27
Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P	Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P	Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P	Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P	Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P	Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P	Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P	Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P	Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P	Č P S N P









I 13	23 XII 13	30 XII 13	6 I 14	13 I 14	20 I 14	27 I 14	3 II 14	10 II 14	17 II 14
S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N	S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N	S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N	S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N	S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N	S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N	S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N	S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N	S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N	S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N



S	N	P	Ú	S	Č	P	S	N	P	Ú	S	Č	P	S	N	P	Ú	S
5 V 14																		
S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S																		
12 V 14																		
S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S																		
19 V 14																		
S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S																		
26 V 14																		
S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S																		





	18.VI.12	N   P   Ú   S   Č			Jméno	Trvání	Začátek	Konec	Předchůdci	Jména zdrojů
273					Konstrukce truhlářské	6 dní? 27.3.13 8:00		3.4.13 17:00	271	
274					Konstrukce zámečnické	12 dní 7.2.13 8:00		22.2.13 17:00	279FS-9 dní;270	
275					Podlahy z dlaždic	16 dní 20.2.13 7:00		13.3.13 17:00	272	
276					Obklady keramické	15 dní 21.2.13 7:00		13.3.13 17:00	270	
277					Malby a nátěry	10 dní? 11.3.13 8:00		22.3.13 17:00	276FS-3 dní	
278					Kanalizace vnitřní	14 dní 28.1.13 7:00		14.2.13 17:00		
279					Rozvody vody a komple...	14 dní 31.1.13 7:00		19.2.13 17:00		
280					Vzduchotechnika,dodávka...	14 dní 30.1.13 7:00		18.2.13 17:00		
281					Vytápění	14 dní 28.1.13 7:00		14.2.13 17:00		
282					Rozvody elektro	14 dní 30.1.13 7:00		18.2.13 17:00		
283					<b>ISO 704.3.1 - Stav.úpra...</b>	<b>57 dní 1.2.13 7:00</b>		<b>22.4.13 17:00</b>		
284					Svislé a kompletní konstr...	11 dní 12.2.13 8:00		26.2.13 17:00	267	
285					Vodorovné konstrukce	20 dní 27.2.13 8:00		26.3.13 17:00	284	
286					Úpravy povrchů,podlahy...	15 dní 4.3.13 7:00		22.3.13 17:00		
287					Ostatní konstrukce a prá...	22 dní 1.2.13 7:00		4.3.13 17:00		
288					Izolace proti vodě,vlhko...	10 dní 8.2.13 7:00		21.2.13 17:00		
289					Isolace tepelné	7 dní 22.3.13 8:00		1.4.13 17:00	285FS-3 dní	
290					Konstrukce truhlářské	5 dní 11.4.13 7:00		17.4.13 17:00		
291					Konstrukce zámečnické	16 dní 1.2.13 7:00		22.2.13 17:00		
292					Podlahy z dlaždic	18 dní 19.3.13 8:00		11.4.13 17:00	286FS-4 dní	
293					Obklady keramické	18 dní 15.3.13 7:00		9.4.13 17:00		
294					Malby a nátěry	13 dní 4.4.13 7:00		22.4.13 17:00		
295					Kanalizace vnitřní	10 dní 1.3.13 7:00		14.3.13 17:00		
296					Rozvody vody a komple...	12 dní 1.3.13 7:00		18.3.13 17:00		
297					Vzduchotechnika,dodávka...	12 dní 1.3.13 7:00		18.3.13 17:00		
298					Vytápění	12 dní 28.2.13 7:00		15.3.13 17:00		
299					Rozvody elektro	14 dní 1.3.13 7:00		20.3.13 17:00		
300					Kanalizační přípojka	10 dní 15.3.13 8:00		28.3.13 17:00	295	
301					<b>ISO 704.4.1 - Stav.úpra...</b>	<b>76 dní 4.3.13 7:00</b>		<b>17.6.13 17:00</b>		
302					Zemní práce	8 dní 4.3.13 7:00		13.3.13 17:00		
303					Zakládání	24 dní 8.3.13 7:00		10.4.13 17:00		
304					Svislé a kompletní konstr...	16 dní 19.4.13 8:00		10.5.13 17:00	313FS-2 dní	
305					Vodorovné konstrukce	27 dní 19.4.13 7:00		27.5.13 17:00		
306					Úpravy povrchů,podlahy...	16 dní 14.5.13 7:00		4.6.13 17:00	310	

25 VI 12	2 VII 12	9 VII 12	16 VII 12	23 VII 12	30 VII 12	6 VIII 12	13 VIII 12	20 VIII 12	27 VI	
P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú	P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú	P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú	P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú	P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú	P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú	P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú	P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú	P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú	P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú	P   S   N   P   Ú

II.12.	3 IX.12	10 IX.12	17 IX.12	24 IX.12	1 X.12	8 X.12	15 X.12	22 X.12	29 X.12
S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N	S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N	S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N	S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N	S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N	S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N	S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N	S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N	S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N	S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N

5 XI 12	12 XI 12	19 XI 12	26 XI 12	3 XII 12	10 XII 12	17 XII 12	24 XII 12	31 XII 12	7 I 13
P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P	P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P	P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P	P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P	P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P	P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P	P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P	P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P	P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P	P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P

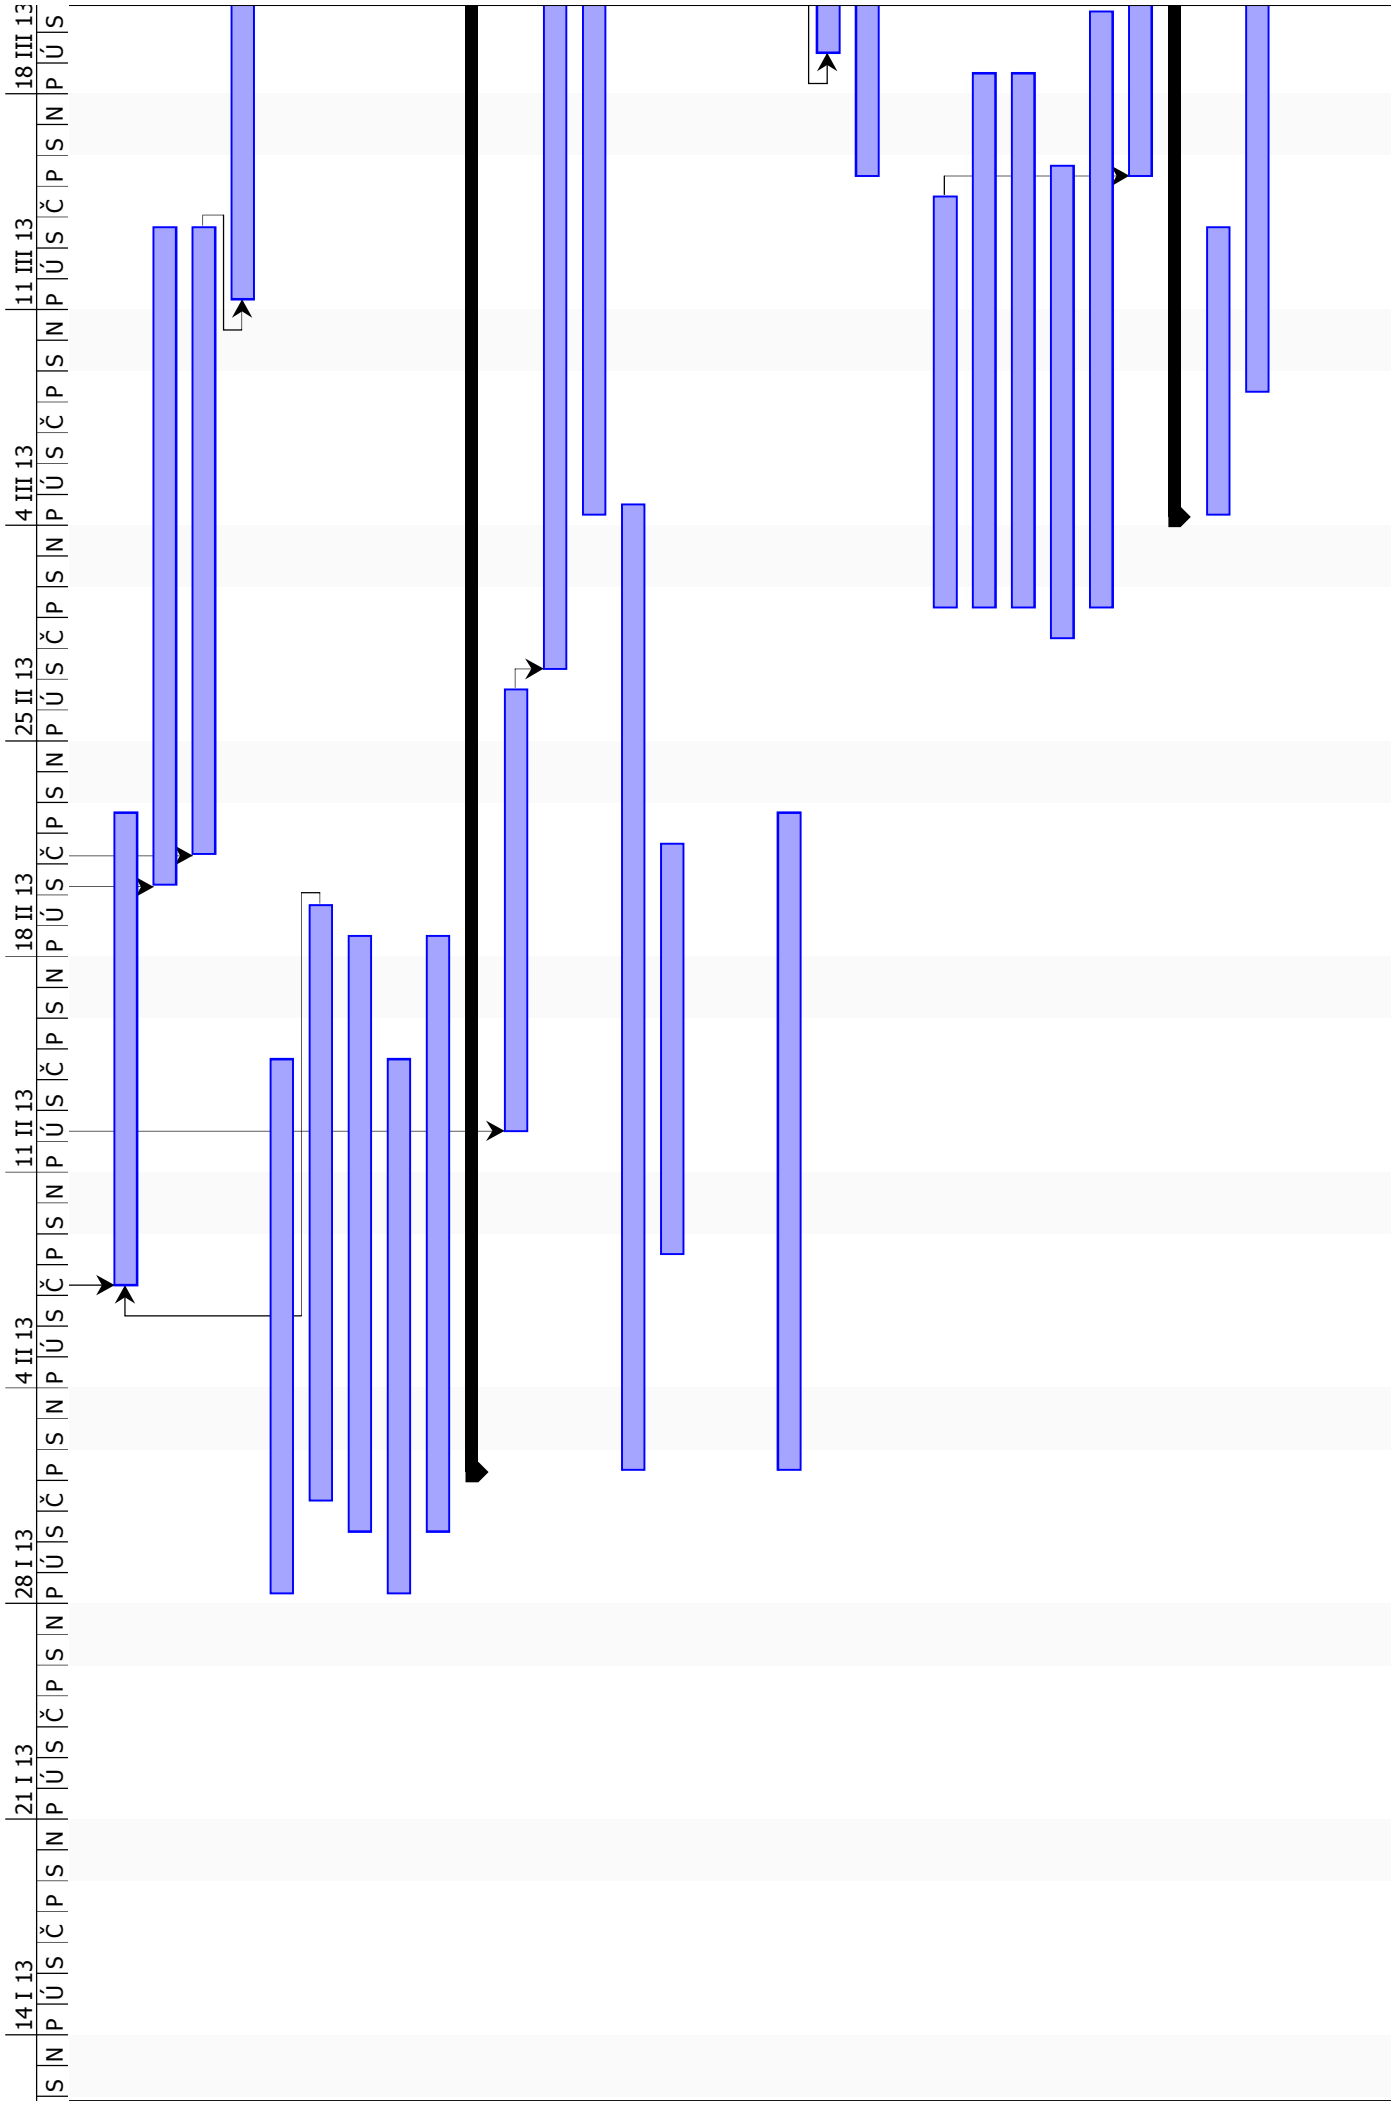

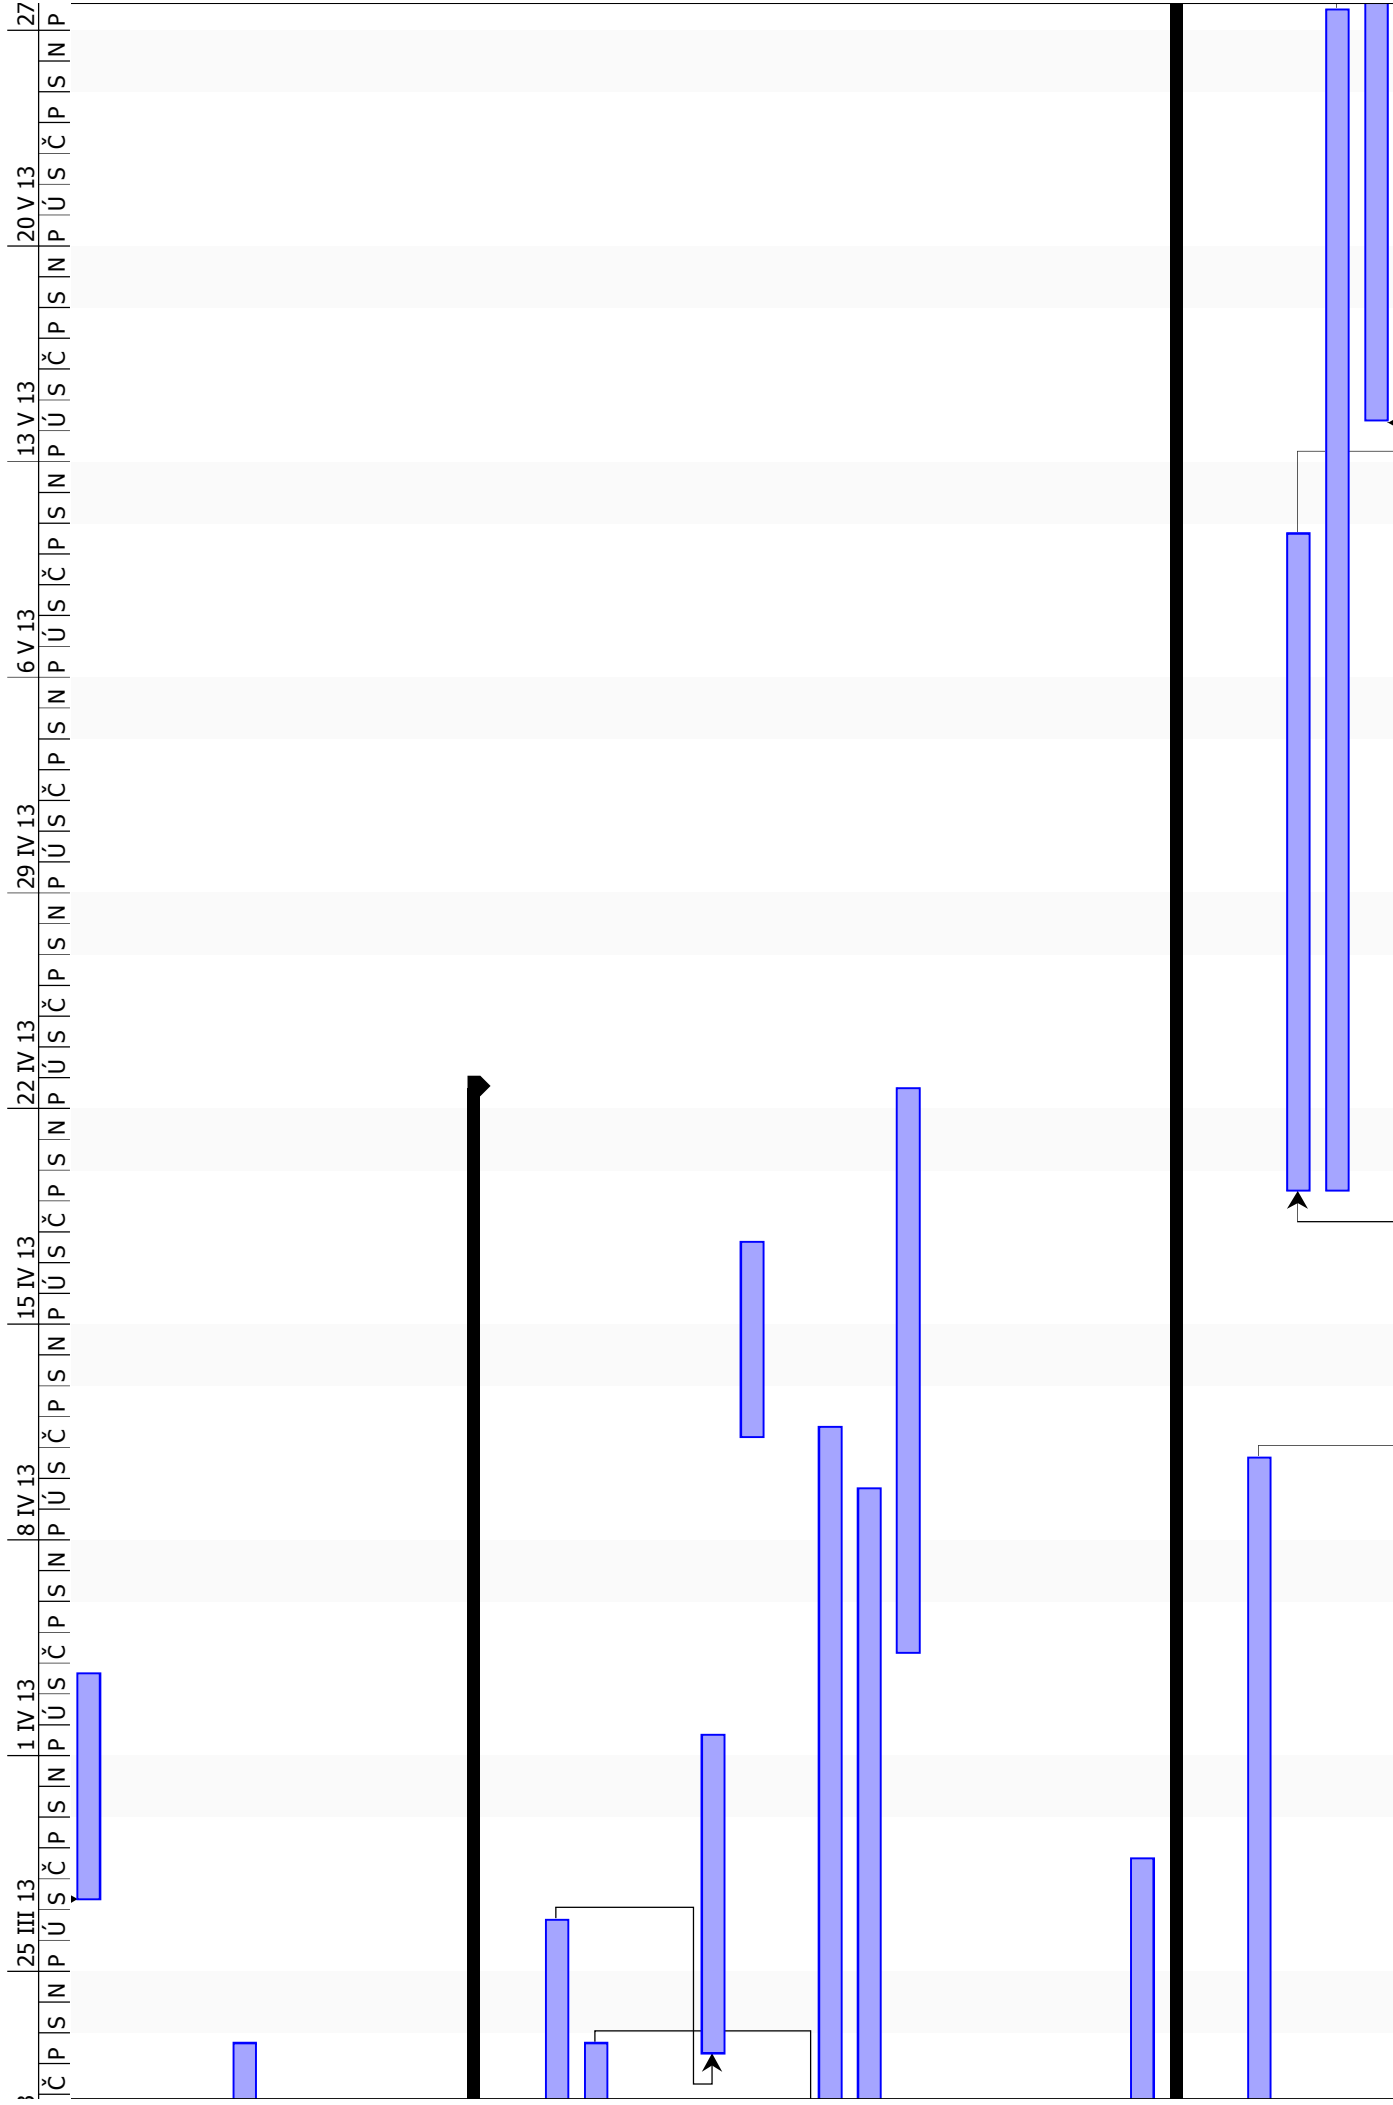

1 V 13	3 VI 13	10 VI 13	17 VI 13	24 VI 13	1 VII 13	8 VII 13	15 VII 13	22 VII 13	29 VII 13	
Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S	P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S	P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S	P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S	P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S	P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S	P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S	P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S	P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S	P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S	P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S

5 VIII 13	N	P	Ú	S	Č	P	S	N	P	Ú	S	Č	P	S	N	P	Ú	S	Č	P	S	N	P	Ú	S	Č						
12 VIII 13	P	Ú	S	Č	P	S	N	P	Ú	S	Č	P	S	N	P	Ú	S	Č	P	S	N	P	Ú	S	Č	P	S	N	P	Ú	S	Č
19 VIII 13	P	Ú	S	Č	P	S	N	P	Ú	S	Č	P	S	N	P	Ú	S	Č	P	S	N	P	Ú	S	Č	P	S	N	P	Ú	S	Č
26 VIII 13	P	Ú	S	Č	P	S	N	P	Ú	S	Č	P	S	N	P	Ú	S	Č	P	S	N	P	Ú	S	Č	P	S	N	P	Ú	S	Č
2 IX 13	P	Ú	S	Č	P	S	N	P	Ú	S	Č	P	S	N	P	Ú	S	Č	P	S	N	P	Ú	S	Č	P	S	N	P	Ú	S	Č
9 IX 13	P	Ú	S	Č	P	S	N	P	Ú	S	Č	P	S	N	P	Ú	S	Č	P	S	N	P	Ú	S	Č	P	S	N	P	Ú	S	Č
16 IX 13	P	Ú	S	Č	P	S	N	P	Ú	S	Č	P	S	N	P	Ú	S	Č	P	S	N	P	Ú	S	Č	P	S	N	P	Ú	S	Č
23 IX 13	P	Ú	S	Č	P	S	N	P	Ú	S	Č	P	S	N	P	Ú	S	Č	P	S	N	P	Ú	S	Č	P	S	N	P	Ú	S	Č
30 IX 13	P	Ú	S	Č	P	S	N	P	Ú	S	Č	P	S	N	P	Ú	S	Č	P	S	N	P	Ú	S	Č	P	S	N	P	Ú	S	Č
7 X 13	P	Ú	S	Č	P	S	N	P	Ú	S	Č	P	S	N	P	Ú	S	Č	P	S	N	P	Ú	S	Č	P	S	N	P	Ú	S	Č







24 II 14	3 III 14	10 III 14	17 III 14	24 III 14	31 III 14	7 IV 14	14 IV 14	21 IV 14	28 IV 14	
P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P	P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P	P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P	P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P	P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P	P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P	P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P	P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P	P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P	P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P	P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P


S	N	P	Ú	S	Č	P	S	N	P	Ú	S	Č	P	S	N	P	Ú	S
5 V 14																		
S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S																		
12 V 14																		
S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S																		
19 V 14																		
S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S																		
26 V 14																		
S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S																		

	18.VI.12	N	P	Ú	S	Č	Jméno	Trvání	Začátek	Konec	Předchůdci	Jména zdrojů
307							Ostatní konstrukce a prá...	17 dní	4.3.13 7:00	26.3.13 17:00		
308							Izolace proti vodě,vlhko...	14 dní	9.4.13 7:00	26.4.13 17:00		
309							Konstrukce tesařské	7 dní	23.5.13 7:00	31.5.13 17:00	310	
310							Konstrukce truhlářské	10 dní	23.4.13 8:00	6.5.13 17:00	313	
311							Konstrukce zámečnické	15 dní	28.5.13 8:00	17.6.13 17:00	305	
312							Malby a nátěry	24 dní	7.5.13 8:00	7.6.13 17:00	310	
313							Dodávka a montáž OK	11 dní	8.4.13 8:00	22.4.13 17:00	303FS-3 dní	
314							Kanalizace vnitřní	14 dní	13.5.13 8:00	30.5.13 17:00	304	
315							Rozvody vody a komple...	11 dní	5.5.13 7:00	20.5.13 17:00		
316							Vytápění	14 dní	5.5.13 7:00	23.5.13 17:00		
317							Rozvody elektro	14 dní	5.5.13 7:00	23.5.13 17:00		
318							<b>ISO 704.5.1 - Stav.úpra...</b>	<b>51 dní</b>	<b>7.1.13 7:00</b>	<b>18.3.13 17:00</b>		
319							Svislé a kompletní konstr...	17 dní	31.1.13 8:00	22.2.13 17:00	321FS-3 dní	
320							Úpravy povrchů,podlahy...	22 dní	11.2.13 8:00	12.3.13 17:00	322	
321							Ostatní konstrukce a prá...	21 dní	7.1.13 7:00	4.2.13 17:00		
322							Izolace proti vodě,vlhko...	11 dní	25.1.13 7:00	8.2.13 17:00		
323							Isolace tepelné	7 dní	10.2.13 7:00	19.2.13 17:00		
324							Konstrukce truhlářské	7 dní	22.2.13 7:00	4.3.13 17:00		
325							Konstrukce zámečnické	22 dní	7.1.13 7:00	5.2.13 17:00		
326							Podlahy z dlaždic	8 dní	20.2.13 8:00	1.3.13 17:00	323	
327							Podlahy lité	10 dní	1.3.13 7:00	14.3.13 17:00		
328							Malby a nátěry	14 dní	27.2.13 8:00	18.3.13 17:00	330	
329							Vytápění	10 dní	25.2.13 8:00	8.3.13 17:00	319	
330							Rozvody elektro	18 dní	1.2.13 7:00	26.2.13 17:00		
331							Přípojka horkovodu	14 dní	7.1.13 7:00	24.1.13 17:00		
332							<b>ISO 704.6.1 - Stav.úpra...</b>	<b>122,12 dní</b>	<b>10.4.13 16:00</b>	<b>27.9.13 17:00</b>		
333							Zemní práce	63 dní	15.4.13 7:00	10.7.13 17:00		
334							Svislé a kompletní konstr...	39 dní	1.6.13 7:00	25.7.13 17:00		
335							Úpravy povrchů,podlahy...	56 dní	17.6.13 7:00	2.9.13 17:00		
336							Ostatní konstrukce a prá...	102 dní	10.4.13 16:00	30.8.13 16:00		
337							Izolace proti vodě,vlhko...	31 dní	22.4.13 7:00	3.6.13 17:00		
338							Povlakové krytiny	54 dní	2.7.13 7:00	13.9.13 17:00		
339							Isolace tepelné	18 dní	6.6.13 7:00	1.7.13 17:00		
340							Konstrukce tesařské	28 dní	20.6.13 7:00	29.7.13 17:00		





II.12.	3 IX.12	10 IX.12	17 IX.12	24 IX.12	1 X.12	8 X.12	15 X.12	22 X.12	29 X.12
S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N	S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N	S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N	S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N	S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N	S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N	S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N	S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N	S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N	S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N


5 XI 12	P	Ú	S	Č	P	S	N	P	Ú	S	Č	P	S	N	P	Ú	S	Č	P	S	N	P	Ú	S	Č	P
12 XI 12	P	Ú	S	Č	P	S	N	P	Ú	S	Č	P	S	N	P	Ú	S	Č	P	S	N	P	Ú	S	Č	P
19 XI 12	P	Ú	S	Č	P	S	N	P	Ú	S	Č	P	S	N	P	Ú	S	Č	P	S	N	P	Ú	S	Č	P
26 XI 12	P	Ú	S	Č	P	S	N	P	Ú	S	Č	P	S	N	P	Ú	S	Č	P	S	N	P	Ú	S	Č	P
3 XII 12	P	Ú	S	Č	P	S	N	P	Ú	S	Č	P	S	N	P	Ú	S	Č	P	S	N	P	Ú	S	Č	P
10 XII 12	P	Ú	S	Č	P	S	N	P	Ú	S	Č	P	S	N	P	Ú	S	Č	P	S	N	P	Ú	S	Č	P
17 XII 12	P	Ú	S	Č	P	S	N	P	Ú	S	Č	P	S	N	P	Ú	S	Č	P	S	N	P	Ú	S	Č	P
24 XII 12	P	Ú	S	Č	P	S	N	P	Ú	S	Č	P	S	N	P	Ú	S	Č	P	S	N	P	Ú	S	Č	P
31 XII 12	P	Ú	S	Č	P	S	N	P	Ú	S	Č	P	S	N	P	Ú	S	Č	P	S	N	P	Ú	S	Č	P
7 I 13	P	Ú	S	Č	P	S	N	P	Ú	S	Č	P	S	N	P	Ú	S	Č	P	S	N	P	Ú	S	Č	P






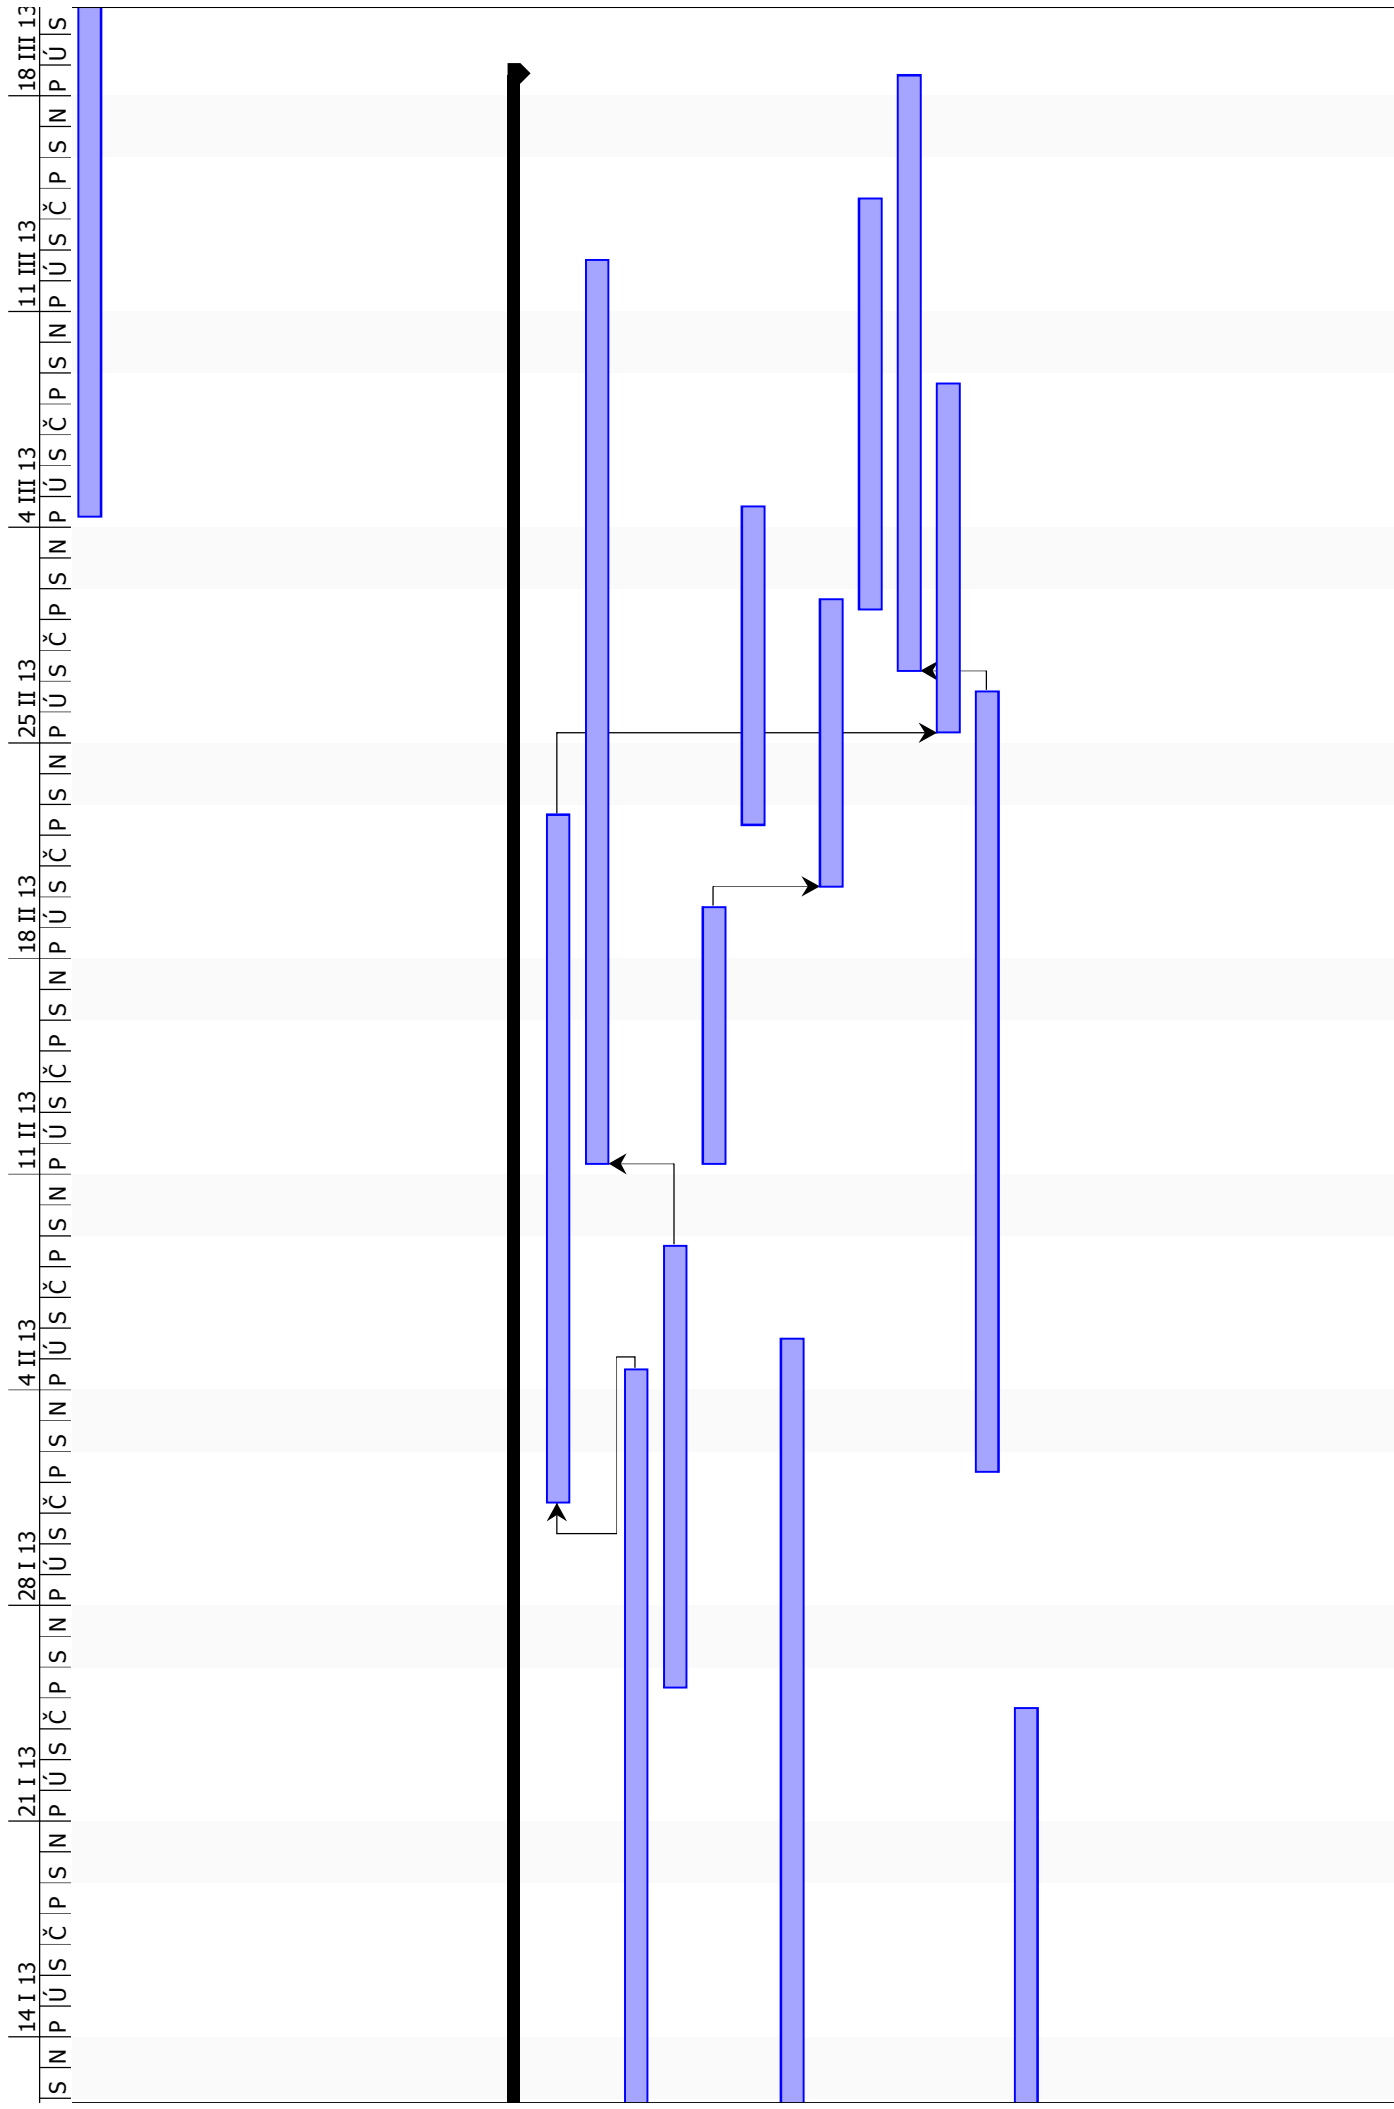

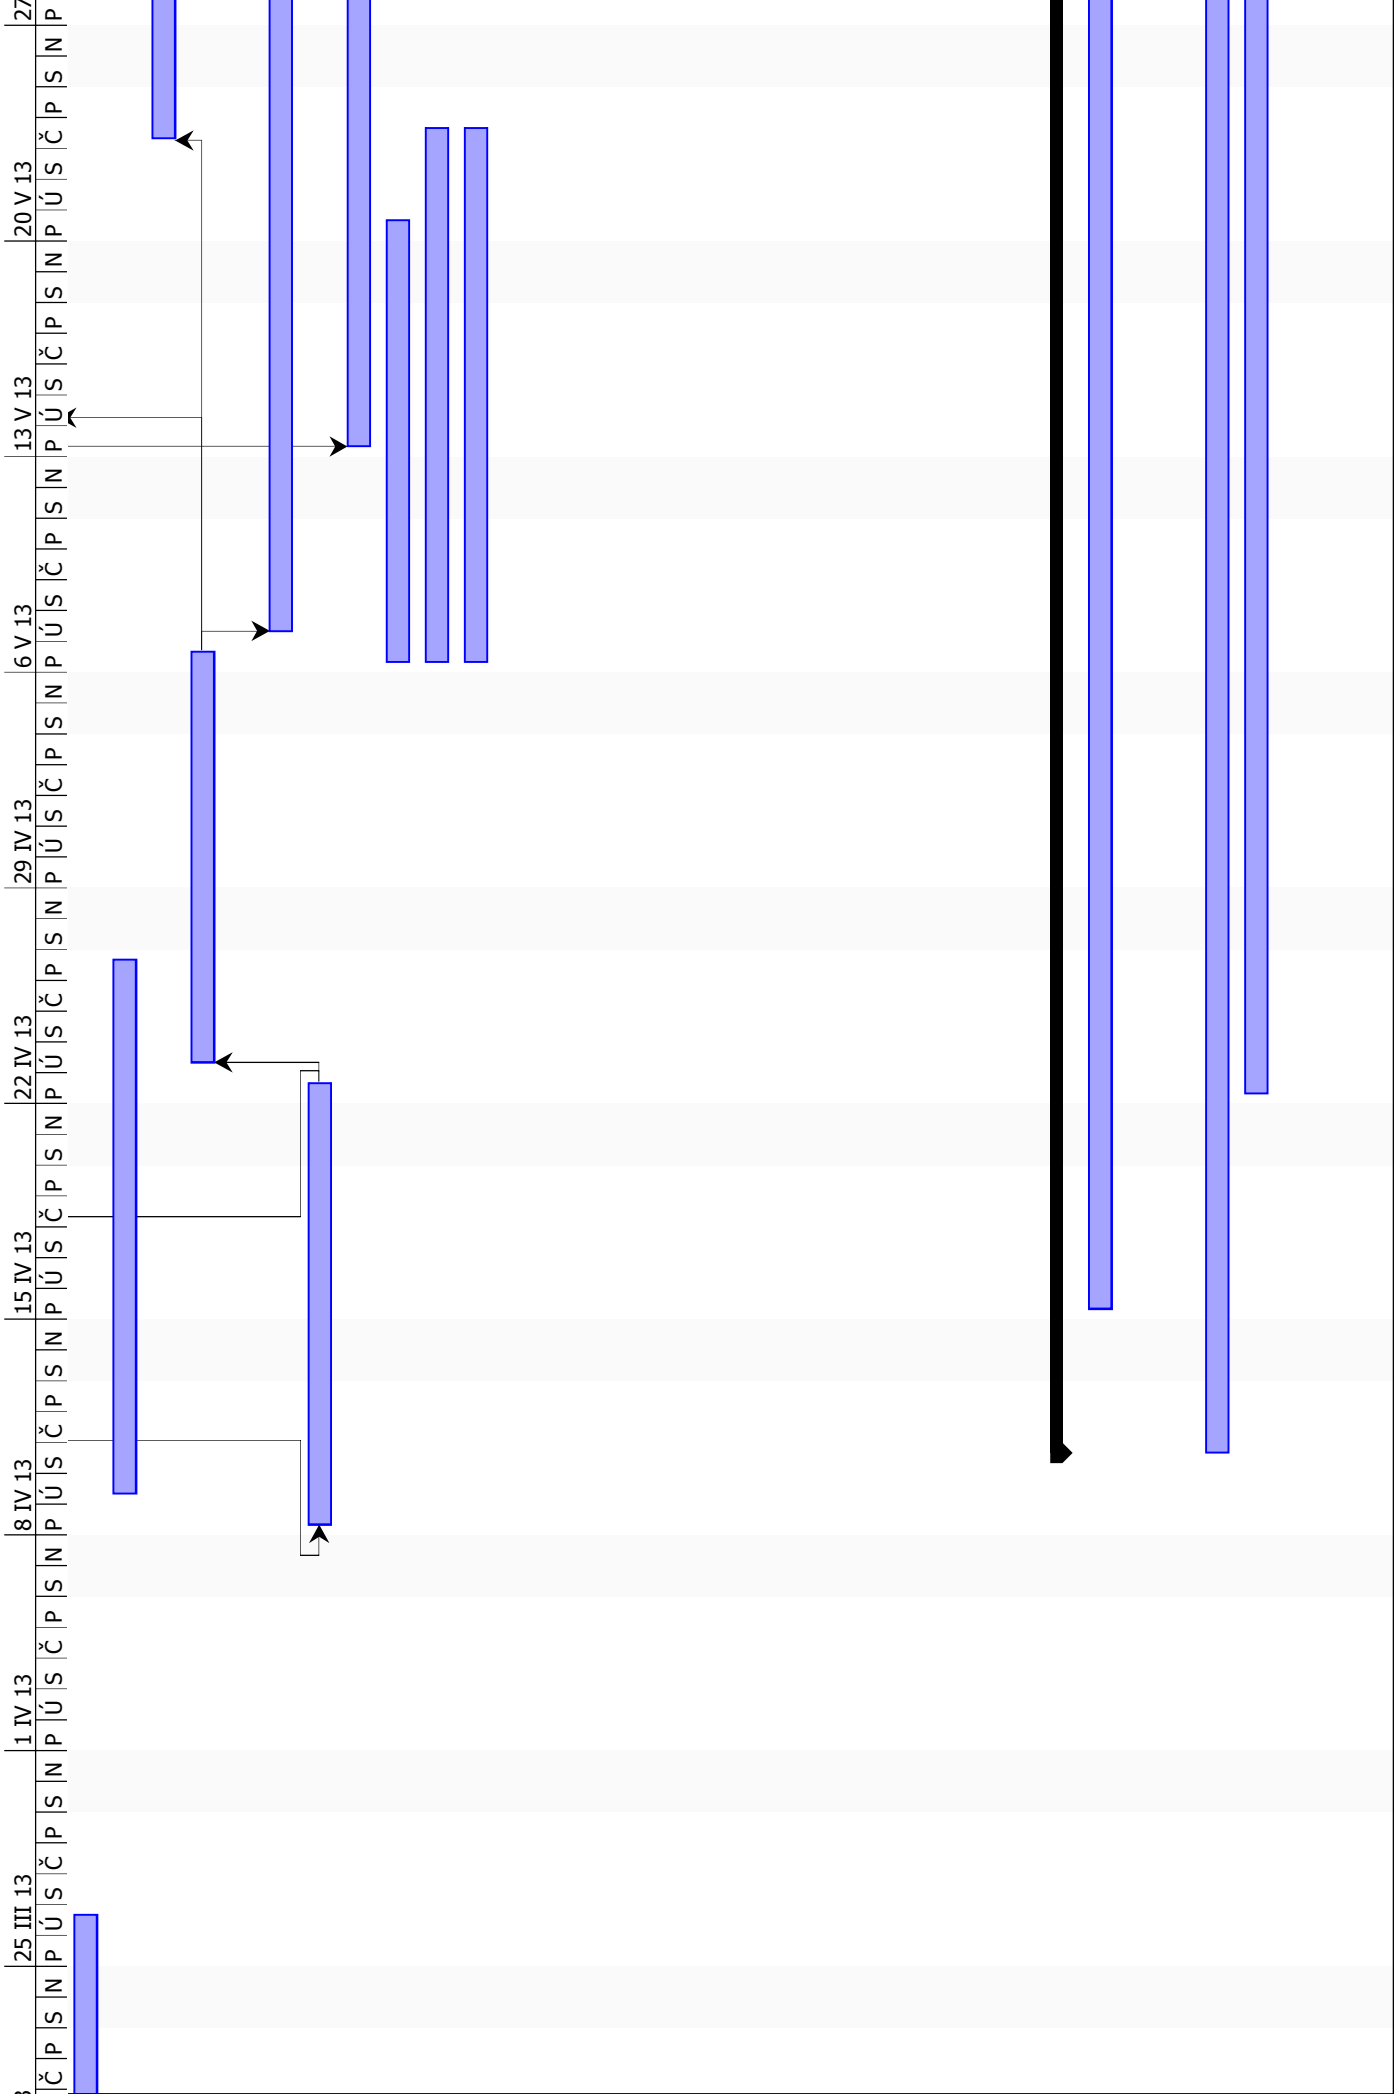

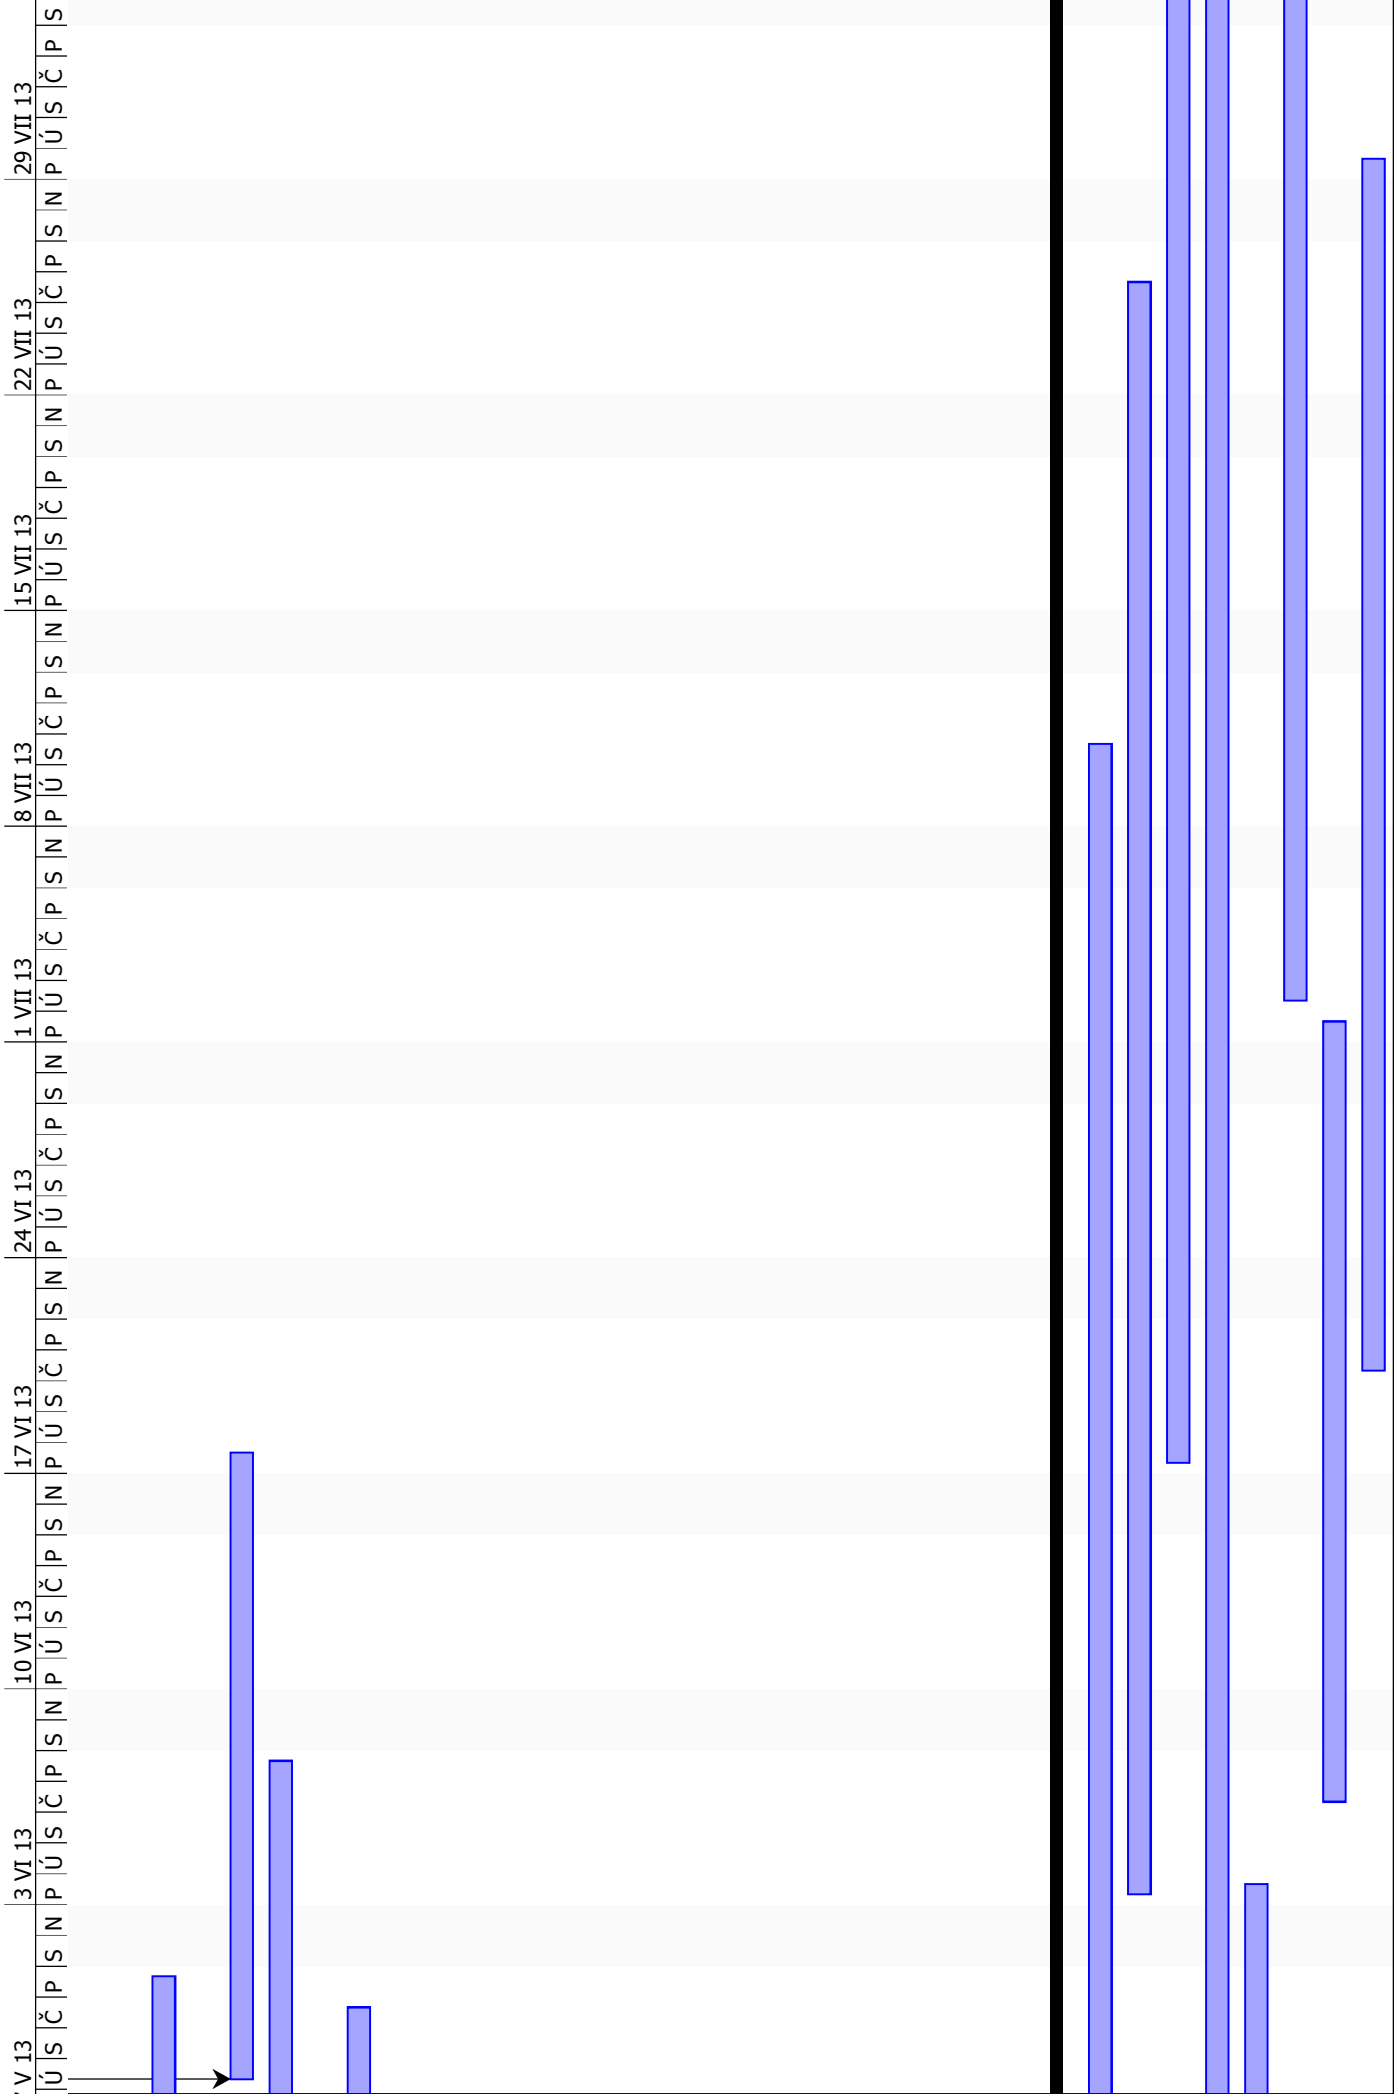

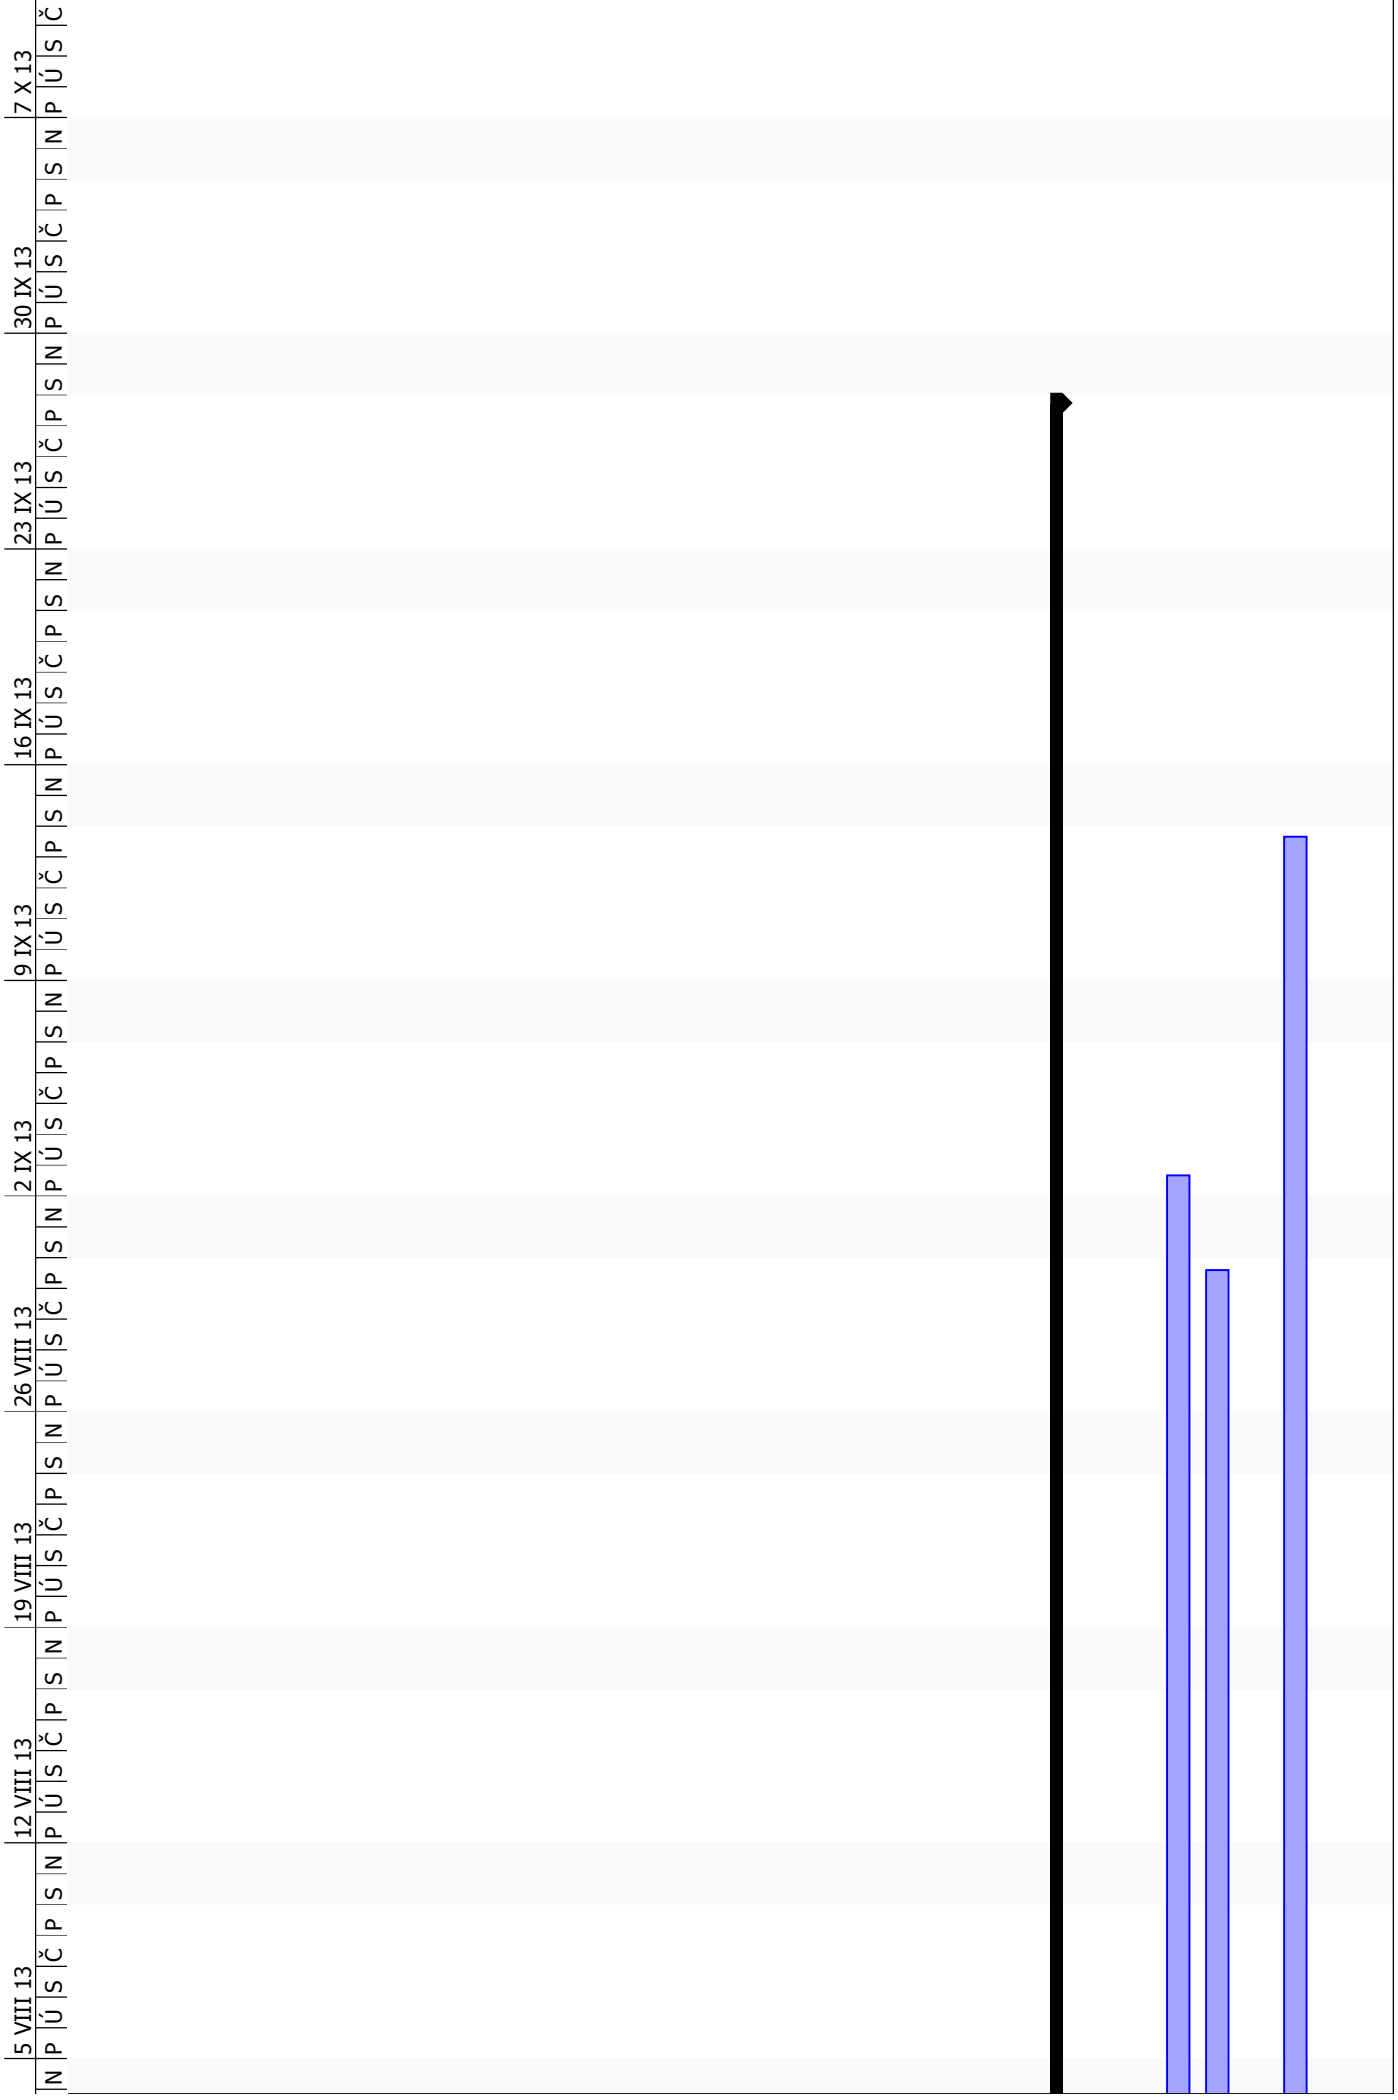

14 X 13	P	S	N	P	Ú	S	Č	P	S	N	P	Ú	S	Č	P	S	N	P	Ú	S	Č	P	S	N	P	Ú	S
21 X 13	P	S	N	P	Ú	S	Č	P	S	N	P	Ú	S	Č	P	S	N	P	Ú	S	Č	P	S	N	P	Ú	S
28 X 13	P	S	N	P	Ú	S	Č	P	S	N	P	Ú	S	Č	P	S	N	P	Ú	S	Č	P	S	N	P	Ú	S
4 X 13	P	S	N	P	Ú	S	Č	P	S	N	P	Ú	S	Č	P	S	N	P	Ú	S	Č	P	S	N	P	Ú	S
11 X 13	P	S	N	P	Ú	S	Č	P	S	N	P	Ú	S	Č	P	S	N	P	Ú	S	Č	P	S	N	P	Ú	S
18 X 13	P	S	N	P	Ú	S	Č	P	S	N	P	Ú	S	Č	P	S	N	P	Ú	S	Č	P	S	N	P	Ú	S
25 X 13	P	S	N	P	Ú	S	Č	P	S	N	P	Ú	S	Č	P	S	N	P	Ú	S	Č	P	S	N	P	Ú	S
2 XII 13	P	S	N	P	Ú	S	Č	P	S	N	P	Ú	S	Č	P	S	N	P	Ú	S	Č	P	S	N	P	Ú	S
9 XII 13	P	S	N	P	Ú	S	Č	P	S	N	P	Ú	S	Č	P	S	N	P	Ú	S	Č	P	S	N	P	Ú	S
16 XI	P	S	N	P	Ú	S	Č	P	S	N	P	Ú	S	Č	P	S	N	P	Ú	S	Č	P	S	N	P	Ú	S

I 13	23 XII 13	30 XII 13	6 I 14	13 I 14	20 I 14	27 I 14	3 II 14	10 II 14	17 II 14	
S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N	S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N	S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N	S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N	S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N	S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N	S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N	S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N	S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N	S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N	S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N









	Jméno	Trvání	Začátek	Konec	Předchůdci	Jména zdrojů	18.VI.12		
							N	P	Č
341	Konstrukce klempířské	52 dní	15.4.13 7:00	25.6.13 17:00					
342	Konstrukce zámečnické	48 dní	14.5.13 7:00	18.7.13 17:00					
343	Malby a nátěry	50 dní	20.7.13 7:00	27.9.13 17:00					
344	<b>ISO 704.7.1 - Stav.úpra...</b>	<b>39 dní</b>	<b>7.1.13 7:00</b>	<b>28.2.13 17:00</b>					
345	Svislé a kompletní konstr...	9 dní	22.1.13 7:00	1.2.13 17:00					
346	Úpravy povrchů,podlahy...	13 dní	14.1.13 7:00	30.1.13 17:00					
347	Ostatní konstrukce a prá...	14 dní	7.1.13 7:00	24.1.13 17:00					
348	Konstrukce zámečnické	16 dní	7.1.13 7:00	28.1.13 17:00					
349	Malby a nátěry	10 dní	29.1.13 8:00	11.2.13 17:00	348				
350	Montáž technologie traf...	13 dní	12.2.13 8:00	28.2.13 17:00	349				
351	<b>ISO 704.8.1 - Stav.úpra...</b>	<b>47 dní</b>	<b>1.2.13 7:00</b>	<b>8.4.13 17:00</b>					
352	Zemní práce	10 dní	8.2.13 7:00	21.2.13 17:00					
353	Zakládání	26 dní	13.2.13 7:00	20.3.13 17:00					
354	Úpravy povrchů,podlahy...	18 dní	14.3.13 7:00	8.4.13 17:00					
355	Ostatní konstrukce a prá...	20 dní	1.2.13 7:00	28.2.13 17:00	346				
356	Izolace proti vodě,vlhko...	14 dní	4.3.13 7:00	21.3.13 17:00					
357	Dodávka a montáž VTZ	21 dní	11.3.13 7:00	8.4.13 17:00					
358	Zařízení siln proudé elektro	20 dní	12.3.13 7:00	8.4.13 17:00					
359	<b>ISO 704.9.1 - Stav.úpra...</b>	<b>35 dní</b>	<b>11.2.13 7:00</b>	<b>29.3.13 17:00</b>					
360	Svislé a kompletní konstr...	12 dní	27.2.13 7:00	14.3.13 17:00					
361	Úpravy povrchů,podlahy...	13 dní	21.2.13 8:00	11.3.13 17:00	362FS-2 dní				
362	Ostatní konstrukce a prá...	10 dní	11.2.13 7:00	22.2.13 17:00					
363	Konstrukce zámečnické	21 dní	11.2.13 7:00	11.3.13 17:00					
364	Malby a nátěry	11 dní	15.3.13 8:00	29.3.13 17:00	360				
365	Technologie - stlačený v...	10 dní	11.2.13 7:00	22.2.13 17:00					
366	Dodávky a montáž elektro	10 dní	9.3.13 7:00	22.3.13 17:00					
367	<b>ISO 705 - Úprava energ...</b>	<b>37 dní</b>	<b>27.8.12 7:00</b>	<b>16.10.12 17:00</b>					
368	Zemní práce	20 dní	27.8.12 7:00	21.9.12 17:00					
369	Svislé a kompletní konstr...	10 dní	27.9.12 7:00	10.10.12 17:00					
370	Úpravy povrchů,podlahy...	7 dní	3.10.12 7:00	11.10.12 17:00					
371	Ostatní konstrukce a prá...	30 dní	5.9.12 7:00	16.10.12 17:00					
372	Izolace proti vodě,vlhko...	7 dní	6.10.12 7:00	16.10.12 17:00					
373	Konstrukce zámečnické	6 dní	6.10.12 7:00	15.10.12 17:00					
374	<b>ISO 706 - Oplocení</b>	<b>40 dní</b>	<b>14.10.12 7:00</b>	<b>7.12.12 17:00</b>					







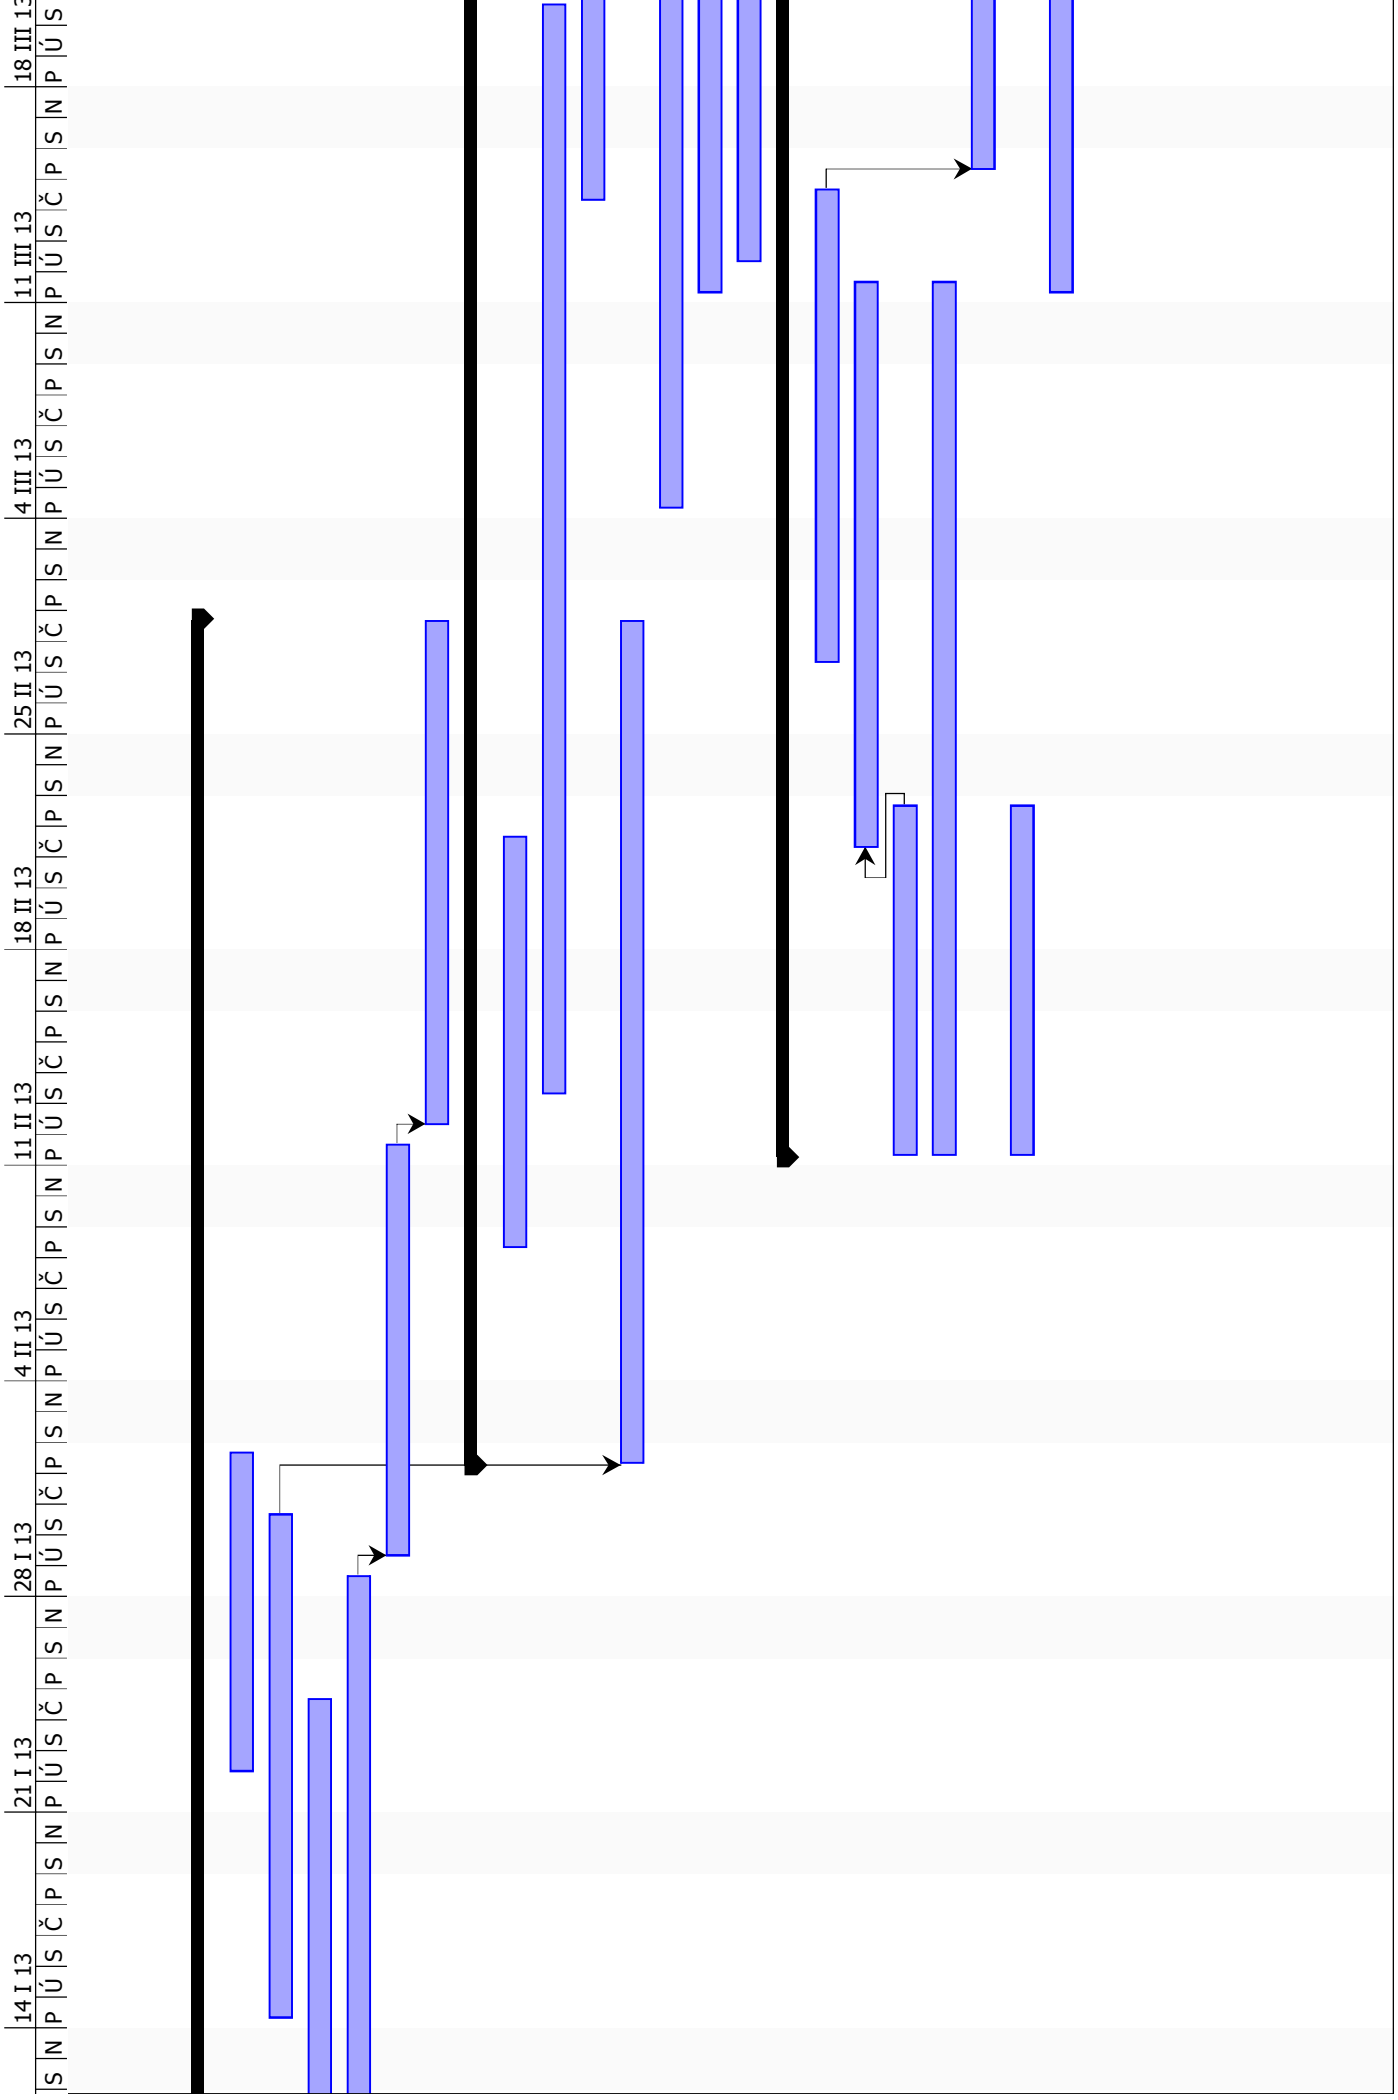

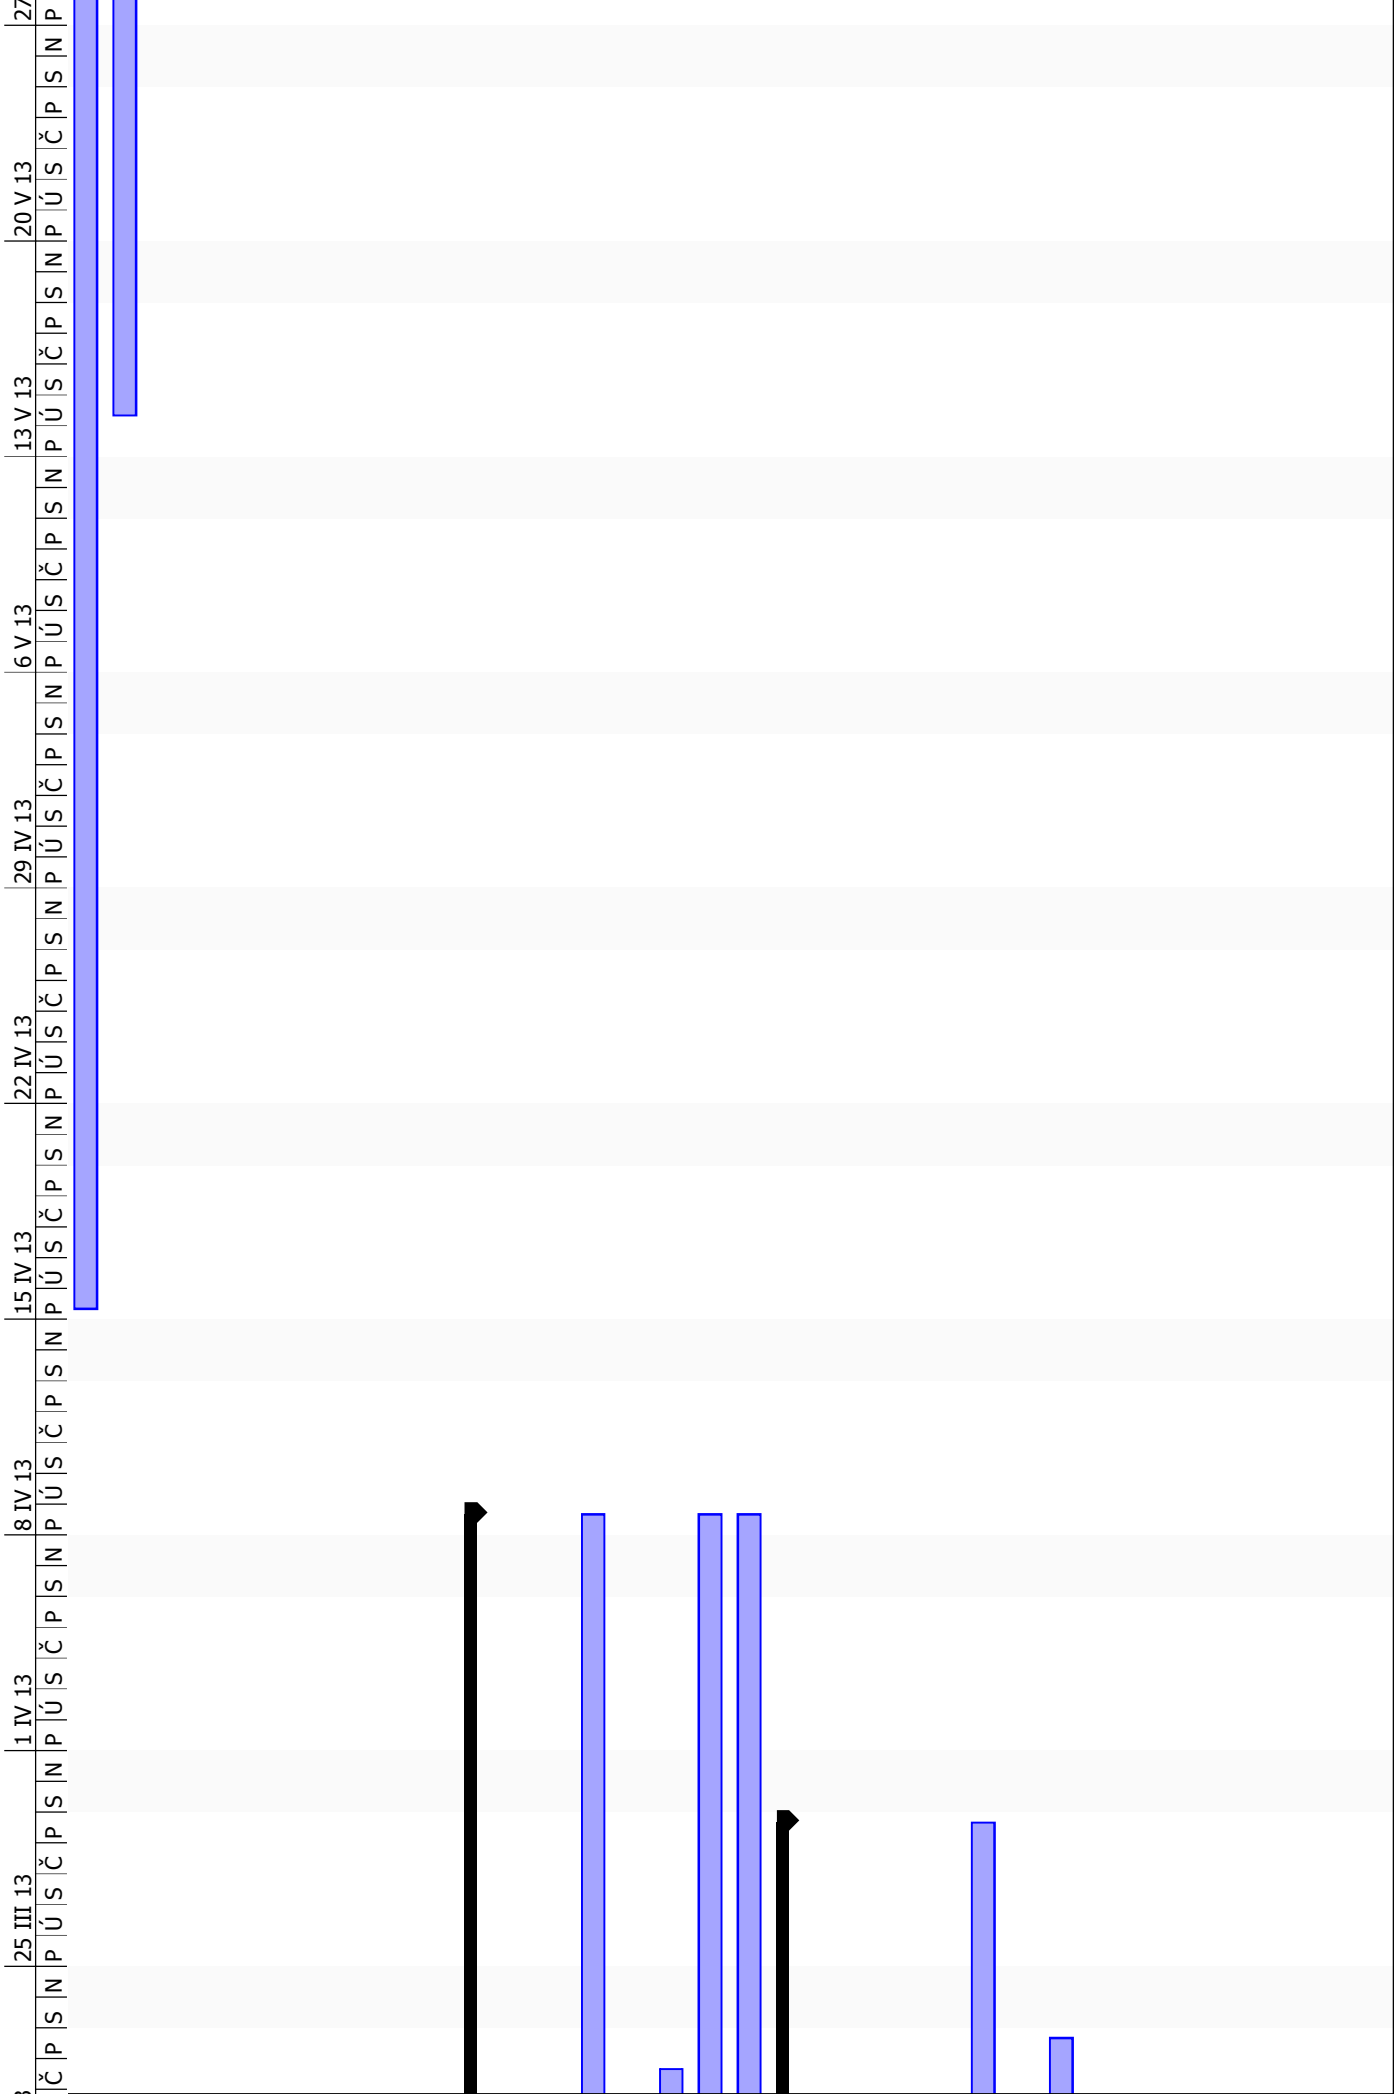

V 13	3 VI 13	10 VI 13	17 VI 13	24 VI 13	1 VII 13	8 VII 13	15 VII 13	22 VII 13	29 VII 13
Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S	Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S	Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S	Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S	Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S	Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S	Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S	Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S	Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S	Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S

5 VIII 13	12 VIII 13	19 VIII 13	26 VIII 13	2 IX 13	9 IX 13	16 IX 13	23 IX 13	30 IX 13	7 X 13	
N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   S   N   P   S   Č   P   S   N   P   S   N   P   S   N   P   S   Č   P   S   N   P   S   Č	N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   S   N   P   S   Č   P   S   N   P   S   N   P   S   N   P   S   Č   P   S   N   P   S   Č	N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   S   N   P   S   Č   P   S   N   P   S   N   P   S   N   P   S   N   P   S   Č   P   S   N   P   S   Č	N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   S   N   P   S   Č   P   S   N   P   S   N   P   S   N   P   S   N   P   S   Č   P   S   N   P   S   Č	N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   S   N   P   S   Č   P   S   N   P   S   N   P   S   N   P   S   N   P   S   Č   P   S   N   P   S   Č	N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   S   N   P   S   Č   P   S   N   P   S   N   P   S   N   P   S   N   P   S   Č   P   S   N   P   S   Č	N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   S   N   P   S   Č   P   S   N   P   S   N   P   S   N   P   S   N   P   S   Č   P   S   N   P   S   Č	N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   S   N   P   S   Č   P   S   N   P   S   N   P   S   N   P   S   N   P   S   Č   P   S   N   P   S   Č	N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   S   N   P   S   Č   P   S   N   P   S   N   P   S   N   P   S   N   P   S   Č   P   S   N   P   S   Č	N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   S   N   P   S   Č   P   S   N   P   S   N   P   S   N   P   S   N   P   S   Č   P   S   N   P   S   Č	N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   S   N   P   S   Č   P   S   N   P   S   N   P   S   N   P   S   N   P   S   Č   P   S   N   P   S   Č














I 13	23 XII 13	30 XII 13	6 I 14	13 I 14	20 I 14	27 I 14	3 II 14	10 II 14	17 II 14
S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N	S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N	S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N	S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N	S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N	S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N	S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N	S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N	S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N	S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N

24 II 14	3 III 14	10 III 14	17 III 14	24 III 14	31 III 14	7 IV 14	14 IV 14	21 IV 14	28 IV 14
P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P	P   Ú   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P	P   Ú   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P	P   Ú   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P	P   Ú   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P	P   Ú   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P	P   Ú   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P	P   Ú   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P	P   Ú   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P	P   Ú   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P



		Jméno	Trvání	Začátek	Konec	Předchůdci	Jména zdrojů
375		Zemní práce	36 dní	14.10.12 7:00	3.12.12 17:00		
376		Zakládání	35 dní	17.10.12 7:00	4.12.12 17:00		
377		Svislé a kompletní konstr...	36 dní	19.10.12 7:00	7.12.12 17:00		
378		Ostatní konstrukce a prá...	13 dní	12.11.12 7:00	28.11.12 17:00		
379		Konstrukce zámečnické	29 dní	29.10.12 7:00	6.12.12 17:00		
380		Nátěry	9 dní	22.11.12 7:00	4.12.12 17:00		
381		Provedení geodetického z...	286 dní	1.3.13 7:00	4.4.14 17:00		
382		Zpracování dokumentace s...	286 dní	1.3.13 7:00	4.4.14 17:00		
383		Předání stavby	16 dní	7.4.14 8:00	28.4.14 17:00	382;381	

25 VI 12	2 VII 12	9 VII 12	16 VII 12	23 VII 12	30 VII 12	6 VIII 12	13 VIII 12	20 VIII 12	27 VI
P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú	P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú	P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú	P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú	P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú	P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú	P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú	P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú	P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú	P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú



5 XI 12	12 XI 12	19 XI 12	26 XI 12	3 XII 12	10 XII 12	17 XII 12	24 XII 12	31 XII 12	7 I 13													
P	Ú	S	Č	P	S	N	Ú	S	Č	P	S	N	Ú	S	Č	P	S	N	Ú	S	Č	P





25 III 13	1 IV 13	8 IV 13	15 IV 13	22 IV 13	29 IV 13	6 V 13	13 V 13	20 V 13	27
Č   P   S   N   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P	Č   P   S   N   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P	Č   P   S   N   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P	Č   P   S   N   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P	Č   P   S   N   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P	Č   P   S   N   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P	Č   P   S   N   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P	Č   P   S   N   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P	Č   P   S   N   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P	Č   P   S   N   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P







I 13	23 XII 13	30 XII 13	6 I 14	13 I 14	20 I 14	27 I 14	3 II 14	10 II 14	17 II 14
S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N	S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N	S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N	S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N	S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N	S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N	S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N	S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N	S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N	S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N   P   Ú   S   Č   P   S   N



S	N	P	Ú	S	Č	P	S	N	P	Ú	S	Č	P	S	N	P	Ú	S
5 V 14				12 V 14				19 V 14				26 V 14						
