

Číslo dodatku objednatele: 3230D1/2017/OI  
Identifikátor veřejné zakázky: IVZ=P16V00000164

**Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 3230/2016/OI/VZKÚ ze dne 30.12.2016**

**Smluvní strany**

---

**Statutární město Ostrava**

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava  
Zastoupené náměstkem primátora

**Metrostav a.s.**

Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8  
zastoupena ředitelem divize I

IČO: 00845451  
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)  
Peněžní ústav:

IČO: 00014915  
DIČ: CZ00014915  
Peněžní ústav:

Číslo účtu:

Číslo účtu: 25000000000000000000  
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u  
Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 758  
č. smlouvy: DZ16010831/Ve

---

dále též jen **objednatel**

dále též jen **zhotovitel**

**Čl. I**

**Základní ustanovení**

Smluvní strany se v souladu s odst. 6, čl. XVII. Závěrečná ujednání, smlouvy o dílo č. 3230/2016/OI/VZKÚ ze dne 30.12.2016 (dále jen „smlouva“) dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 z důvodu vzniklých víceprací během realizace stavby, v rozsahu dle příloh č. 1- 5 tohoto dodatku, a kterých vznik nemohl objednatel ani při vynaložení náležité péče objektivně předvídat, a kterých výskyt ovlivnil i časový průběh realizace, jímž se upravují dále uvedená ustanovení smlouvy.

**Čl. II**

Čl. 2 Předmět smlouvy, odst. 1 se doplňuje o text následujícího znění:

Smluvní strany se dohodly realizovat vícepráce v rozsahu dle přílohy č. 5 - 9 Smlouvy, které tvoří přílohy č. 1- 5 dodatku č. 1

Za přílohu č. 4 smlouvy o dílo se vkládá příloha č. 5 – změnový list č. 1  
Za přílohu č. 5 smlouvy o dílo se vkládá příloha č. 6 – změnový list č. 2  
Za přílohu č. 6 smlouvy o dílo se vkládá příloha č. 7 – změnový list č. 3  
Za přílohu č. 7 smlouvy o dílo se vkládá příloha č. 8 – změnový list č. 4  
Za přílohu č. 8 smlouvy o dílo se vkládá příloha č. 9 – rekapitulace změn

### Čl. III

Cena díla se navyšuje o vícepráce ve výši **365.937,42 Kč bez DPH**, a proto se původní znění odstavce 1 v čl. IV nahrazuje tímto novým zněním:

Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

|                    | Cena bez DPH         | DPH                  | Cena vč. DPH         |
|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Cena celkem</b> | <b>74.182.989,15</b> | <b>15.578.427,72</b> | <b>89.761.416,87</b> |

DPH se bude řídit právními předpisy platnými a účinnými ke dni zdanitelného plnění.

### Čl. IV

Dále se mění v **čl. V Termín plnění** usnesení bodu 7, který nově zní:

7. Celková doba výluk tramvajové dopravy nezbytná k realizaci díla činí celkem 209 kalendářních dnů, přičemž se započítává i každý den, v němž proběhne byť jen krátkodobá výluka. O konání jednotlivých výluk je zhotovitel povinen požádat provozovatele tj. společnost Dopravní podnik Ostrava a.s. nejméně 90 dnů před zahájením dané výluky.

### Čl. V

#### Závěrečná ustanovení

1. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších změn a předpisů: O uzavření tohoto dodatku č. 1 rozhodla rada města usnesením č. 07504/RM1418/106 ze dne 17.10.2017. Tento dodatek se uzavírá v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
2. Tento dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
3. Ostatní ustanovení smlouvy 3230/2016/OI/VZKÚ ze dne 30.12.2016 zůstávají nezměněna.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí se všemi ustanoveními tohoto dodatku č. 1, což stvrzují svými podpisy.
5. Tento dodatek č. 1 se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 3230/2016/OI/VZKÚ ze dne 30.12.2016.
6. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.

7. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 jsou tyto přílohy:

- Příloha č. 1 – změnový list č. 1
- Příloha č. 2 – změnový list č. 2
- Příloha č. 3 – změnový list č. 3
- Příloha č. 4 – změnový list č. 4
- Příloha č. 5 – rekapitulace změn

**Za objednatele**

**Za zhotovitele**

Datum: 19.10.2017


Datum: 19.10.2017

Místo: \_\_\_\_\_

Místo: Ostrava

\_\_\_\_\_  
zmocněnec  
náměstek primátora

\_\_\_\_\_  
ředitel divize 1  
na základě plné moci

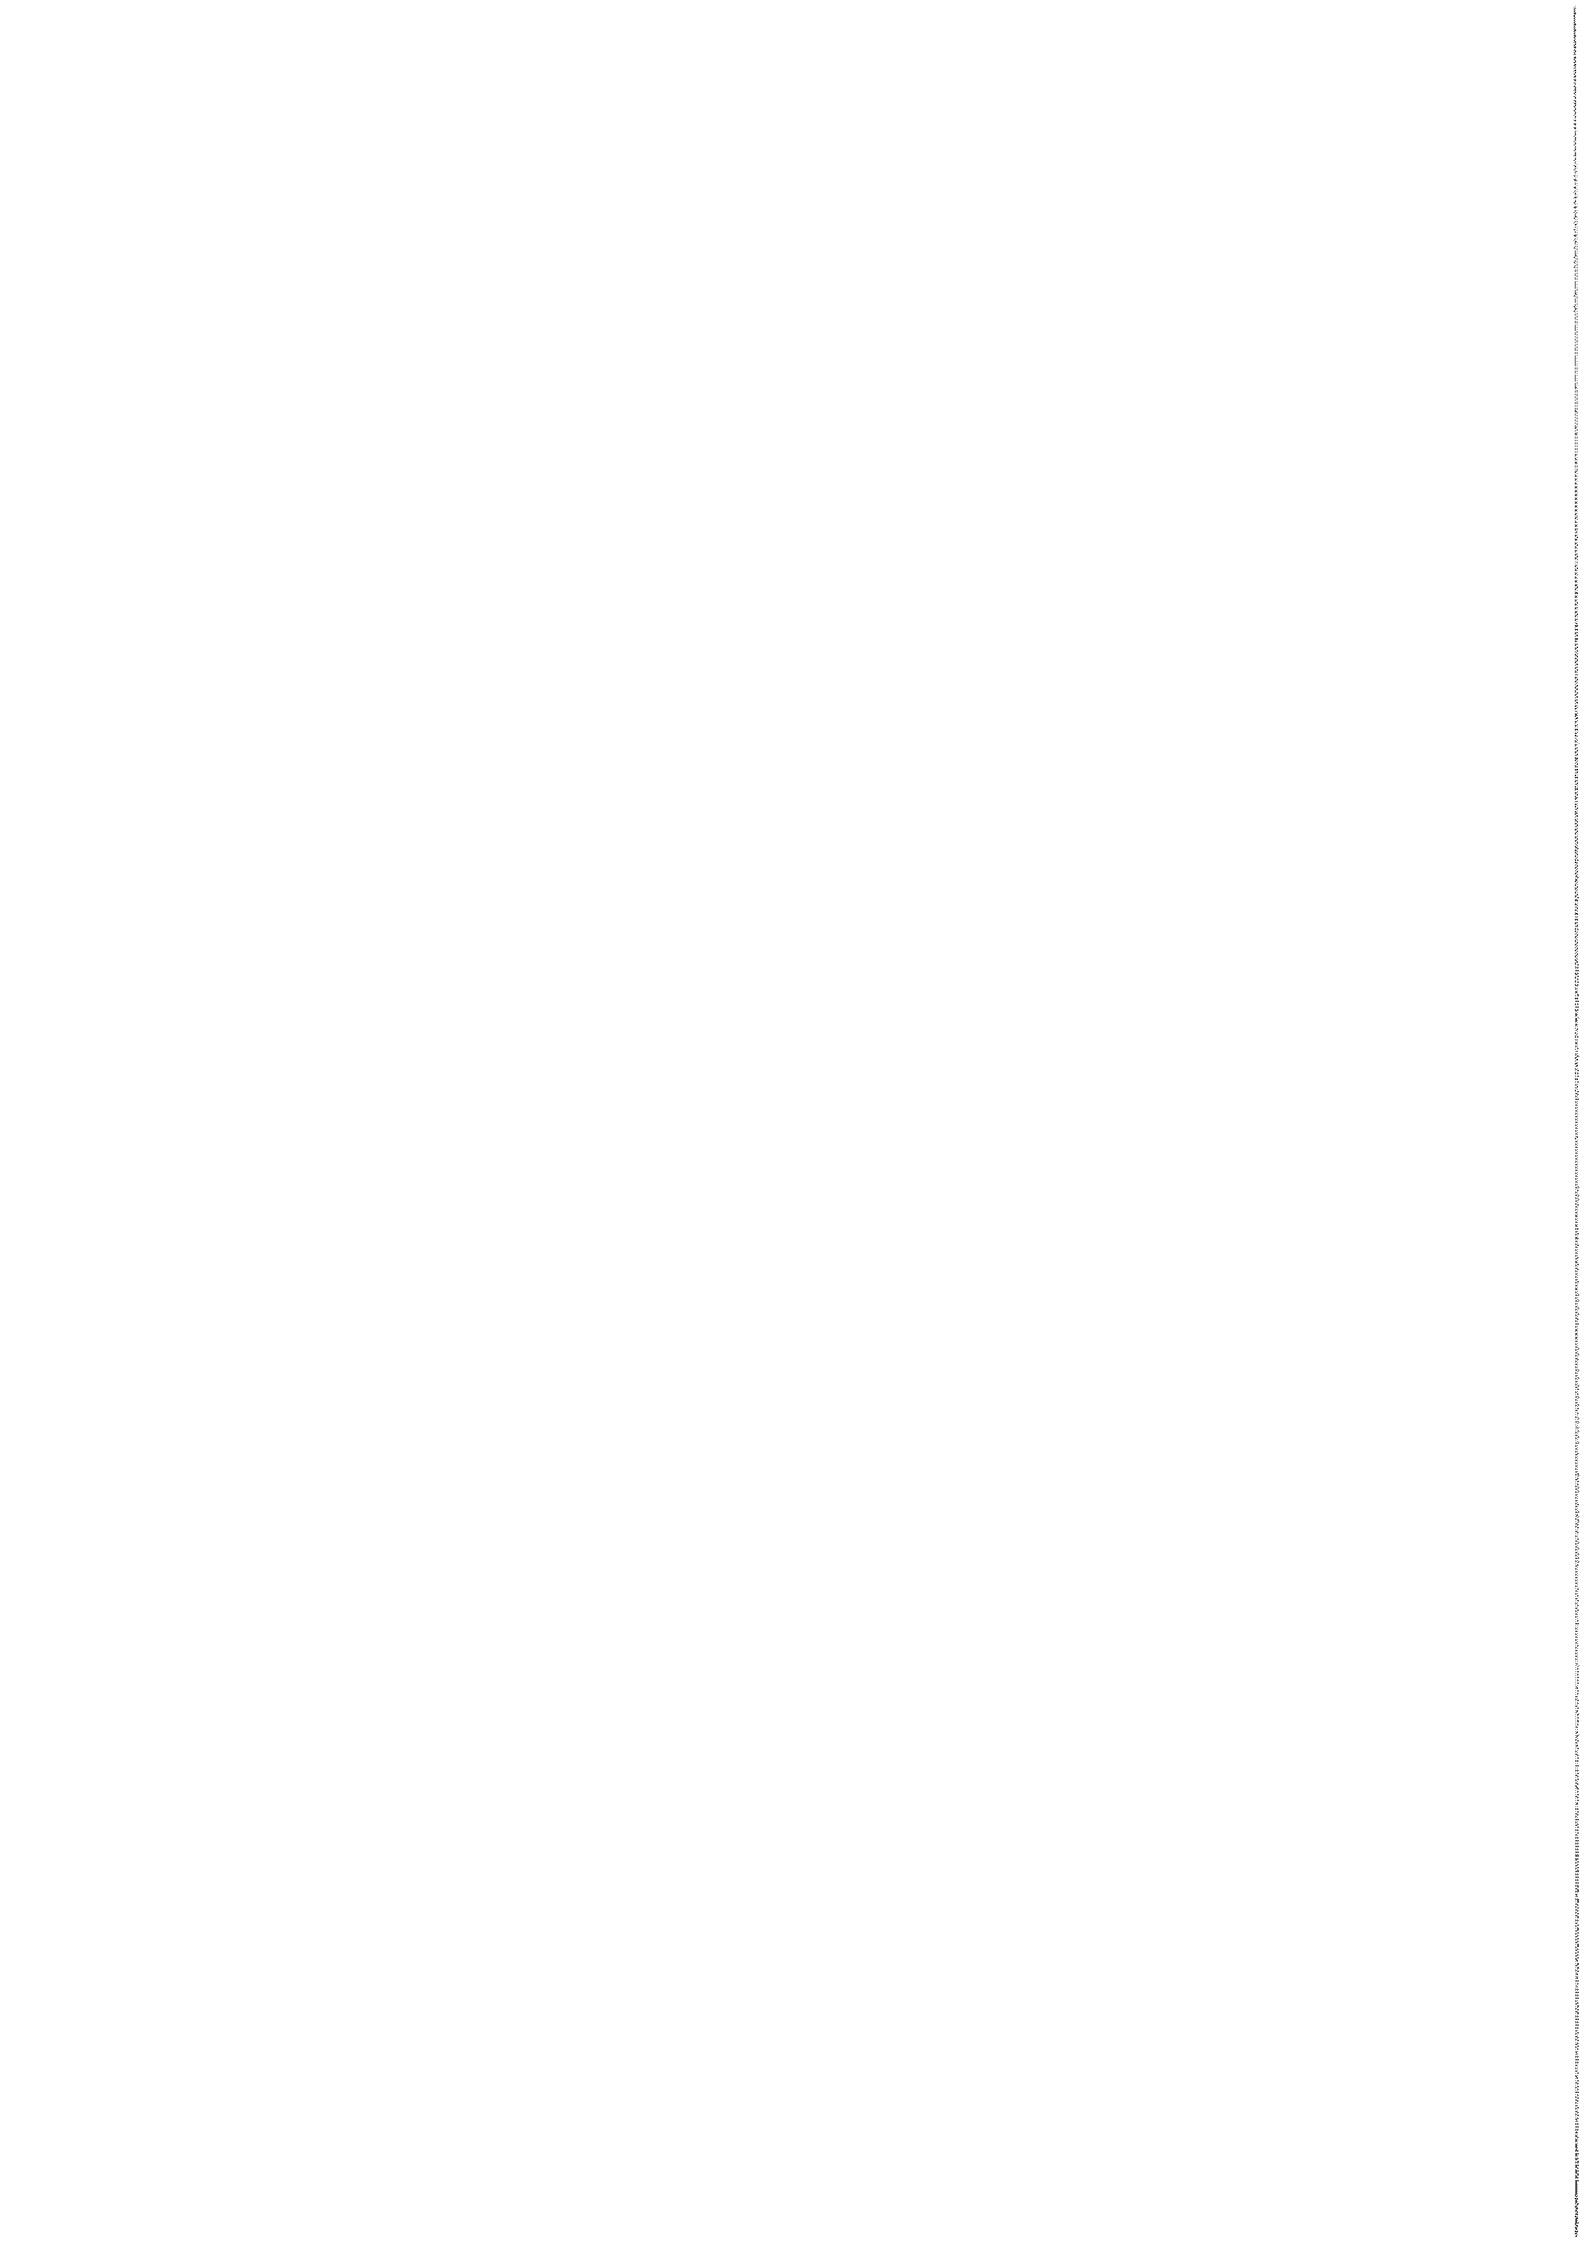

## Evidenční list změny stavby

|  |  |   |
|--|--|---|
| <b>Název a evidenční číslo stavby:</b><br>Tramvajové mosty ul. Pízeňská, ORG 3150<br><br><b>Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):</b><br>Tramvajový most ev.č. 5-022 přes ulici Rudnou - Přechodné dopravní značení | Číslo SO/PS /<br>/ číslo změny SO/PS:<br><br>201.c / 1 | Číslo změny stavby:<br><br><span style="font-size: 2em;">1</span> |
|--|--|---|

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 30.12.2016,  
 číslo smlouvy objednatele: 3230/2016/OI/VZKÚ; číslo smlouvy zhotovitele: DZ16010831/Ve  
**Objednavatel:** Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451  
**Zhotovitel:** Měststav a.s., se sídlem Koželužská 2450/4, Liboň 180 00 Praha 8, IČO: 00014915

**Gen.projektant (autorský dohled):**  
 DOPRAVOPROJEKT OSTRAVA SPOL. S.R.O., se sídlem MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 5/5, 702 00 OSTRAVA, IČO: 42767377  
**Technický dozor stavebníka (TDS):**  
 ENVIROAD s.r.o., se sídlem Masná 1493/8 702 00 OSTRAVA, IČO: 26394438

- Přílohy:**
- 1) Výkres situace
  - 2) Stavební deník + Stavební deník VCP, MP
  - 3) Zápis z kontrolního dne
  - 4) Vyjádření - projektanta DVZ, projektanta DPS a autorského dozoru
  - 5) Fotodokumentace
  - 6) Rekapitulace rozpočtu
  - 7) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet

| Počet paré: | Příjemce :                  |
|-------------|-----------------------------|
| 3 x         | Objednavatel                |
| 1 x         | TDS                         |
| 1 x         | Zhotovitel                  |
| 1 x         | Projektant (autorský dozor) |

**Popis a zdůvodnění změny:**

**Popis:** Změna č. 1 - zřízení provizorních tramvajových zastávek na ulici Pízeňská

**Odůvodnění změny:**  
 Požadované položky na provizorní zastávky na ul. Pízeňské nebyly obsaženy v původním rozpočtu. V zadávací dokumentaci bylo řečeno, že náhradní autobusovou dopravu zajišťuje pro objednatele Dopravní podnik Ostrava a.s. Přípravou zadávacího řízení a nesrovnalostmi v zadání došlo k tomu, že nebyly v rozpočtu nacateny položky na zřízení provizorních zastávek. Dopravní podnik Ostrava a.s. tedy zajišťuje přímo pro objednatele náhradní autobusovou dopravu za vyloučený tramvajový provoz, ale nezajišťuje již zřízení provizorních zastávek vč. přechodného dopravního značení pro organizaci dopravy v návaznosti na tyto zastávky. Tyto práce nejsou v gescl Dopravního podniku Ostrava a.s. a, je nezbytné je provést, a tudíž je nutné je zahrnout do této stavby. Bez těchto prací by nebylo možné zahájit náhradní autobusovou dopravu, a tudíž ani zahájit práce s demolicí mostu. Proto tyto práce zadavatel nemohl předpokládat a jsou nezbytné pro plnění této zakázky.

časový vliv na plnění SoD: **MA VLIV - prodloužení doby plnění - / NEMÁ VLIV**

Údaje v Kč bez DPH:

| Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL | Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby | Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL | Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby | Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL |
|---|---|---|---|--|
| 0,00                                    | 0,00%   | 130 901,59                              | 0,18%   | 130 901,59                             |

**Vyjádření - souhlas se změnou:**

|                               |                            |       |       |        |
|-------------------------------|----------------------------|-------|-------|--------|
| Projektant (autorský dohled): | souhlasím /<br>nesouhlasím | jméno | datum | podpis |
| TDS:                          | souhlasím /<br>nesouhlasím | jméno | datum | podpis |
| Zhotovitel:                   | souhlasím /<br>nesouhlasím | jméno | datum | podpis |
| Objednavatel:                 | souhlasím /<br>nesouhlasím | jméno | datum | podpis |

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpisu ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list Číslo paré:

## Evidenční list změny stavby

|   |   |                                     |
|---|---|-------------------------------------|
| Název a evidenční číslo stavby:<br><b>Tramvajové mosty ul. Pízeňská, ORG 3150</b>   | Číslo SO/PS /<br>/ číslo změny SO/PS:<br><br><b>202.c / 1</b> | Číslo změny stavby:<br><br><b>2</b> |
| Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):<br><b>Tramvajový most ev.č. 6-023 přes tramvajovou a železniční trať - změna signálních plánů křižovatky</b> |   |                                     |

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 30.12.2016,  
 číslo smlouvy objednatele: 3230/2016/OI/VZKÚ; číslo smlouvy zhotovitele: DZ16010831/Ve

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845461

Zhotovitel: Metrostav a.s., se sídlem Koželužská 2450/4, Libeň 180 00 Praha 8, IČO: 00014915

Gen.projektant (autorský dohled):  
 DOPRAVOPROJEKT OSTRAVA SPOL. S.R.O., se sídlem MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 5/6, 702 00 OSTRAVA, IČO: 42767377

Technický dozor stavebníka (TDS):  
 ENVIROAD s.r.o., se sídlem Masná 1493/8 702 00 OSTRAVA, IČO: 25394436

|  |   |
|--|---|
| Přílohy:<br><br>1) Výkres situace<br>2) Stavební deník + Stavební deník VCP, MP<br>3) Zápis z kontrolního dne<br>4) Vyjádření - projektanta DVZ, projektanta DPS a autorského dozoru<br>5) Fotodokumentace<br>6) Rekapitulace rozpočtu<br>7) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet | Počet paré:      Příjemce :<br><br>3 x      Objednatel<br>1 x      TDS<br>1 x      Zhotovitel<br>1 x      Projektant (autorský dozor) |
|--|---|

**Popis a zdůvodnění změny:**  
**Popis:** Změna č. 2 - změna signálních plánů křižovatky

**Odůvodnění změny:**  
 V době zpracování DSP bylo na křižovatce Pízeňská - Horní stávkové řízení dopravy. V době mezi zpracováním DSP a vlastní realizací stavby došlo ke změně systému světelné signalizačního zařízení, jeho rekonstrukcí a změně stávkového systému na dynamické řízení. Proto došlo ke zvětšení náročnosti předpokládaných prací uvažovaných v zadávací dokumentaci. Světelná signalizace křižovatky je v záruční době, záruku nese firma ELTODO. Proto bylo nutné pro eliminaci porušení záruky a vzniku škod ostovít přímo firmu ELTODO. Jedině tato firma může zasahovat do zařízení, aniž by byly porušeny záruky. Z tohoto důvodu bylo nutné zadat tyto práce jen jí. Ve smluvní DPS bylo v soupisu prací uvažováno se zpracováním signálního plánu křižovatek, které se týkaly bezprostředně výstavby tramvajových mostů na ulici Pízeňská. V době zpracování DPS nebylo možné vypracovat signální plán podrobně, protože není možné předvídat, jaký bude provoz, počet linek a intenzita v době opravy a hlavně bylo stávkové řízení dopravy. Nabídka a objednávka na firmu ELTODO je v příloze tohoto ZL.

časový vliv na plnění SoD: **MÁ VLIV - prodloužení doby plnění o ..... / NEMÁ VLIV**

Údaje v Kč bez DPH:

| Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL | Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby | Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL | Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby | Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL |
|---|---|---|---|--|
| <b>0,00</b>                             | <b>0,00%</b>  | <b>150 729,84</b>                       | <b>0,20%</b>  | <b>150 729,84</b>                      |

**Vyjádření - souhlas se změnou:**

|                               |                                       |       |       |        |
|-------------------------------|---------------------------------------|-------|-------|--------|
| Projektant (autorský dohled): | souhlasím /<br><del>nesouhlasím</del> | jméno | datum | podpis |
| TDS:                          | souhlasím /<br><del>nesouhlasím</del> | jméno | datum | podpis |
| Zhotovitel:                   | souhlasím /<br><del>nesouhlasím</del> | jméno | datum | podpis |
| Objednatel:                   | souhlasím /<br><del>nesouhlasím</del> | jméno | datum | podpis |

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

## Evidenční list změny stavby

|   |  |   |
|---|--|---|
| Název a evidenční číslo stavby:<br>Tramvajové mosty ul. Plzeňská, ORG 3150<br>Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):<br>Tramvajový most ev.č. 5-022 přes ulici Rudnou - Přeložka VO | Číslo SO/PS /<br>číslo změny SO/PS:<br>402 / 1 | Číslo změny stavby:<br><p style="text-align: center; font-size: 2em;">3</p> |
|---|--|---|

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 30.12.2016,  
 číslo smlouvy objednatele: 3230/2016/OI/IVZKÚ; číslo smlouvy zhotovitele: DZ16010831/0e  
**Objednavatel:** Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451  
**Zhotovitel:** Metrostav a.s., se sídlem Koželužská 2450/4, Libeň 180 00 Praha 8, IČO: 00014915

**Gen.projektant (autorský dohled):**  
 DOPRAVOPROJEKT OSTRAVA SPOL. S.R.O., se sídlem MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 5/6, 702 00 OSTRAVA, IČO: 42767377  
**Technický dozor stavebníka (TDS):**  
 ENVIROAD s.r.o., se sídlem Masná 1483/8 702 00 OSTRAVA, IČO: 25394436

- Přílohy:**
- 1) Výkres situace
  - 2) Stavební deník + Stavební deník VCP, MP
  - 3) Zápis z kontrolního dne
  - 4) Vyjádření - projektanta DVZ, projektanta DPS a autorského dozoru
  - 5) Fotodokumentace
  - 6) Rekapitulace rozpočtu
  - 7) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet

| Počet paré: | Příjemce :                  |
|-------------|-----------------------------|
| 3 x         | Objednavatel                |
| 1 x         | TDS                         |
| 1 x         | Zhotovitel                  |
| 1 x         | Projektant (autorský dozor) |

**Popis a zdůvodnění změny:**  
**Popis:** Změna č. 3 - Přeložka VO - přílohy kabelů u přílže č.4 SO201

**Odůvodnění změny:**  
 V průběhu výkopových prací u přílže č.4 bylo zjištěno, že kabely veřejného osvětlení vedou pod mostem namísto nad mostem a to v takové blízkosti, že je nutné přeložit. Poloha sítí v projektu vycházela z podkladů správce sítí (Ostravské komunikace), která je odlišná od skutečností. Skutečnou polohu nebylo možné předvídat, a je nutné provést přeložku, aby byla zachována funkčnost veřejného osvětlení. Dále byl odhalen kabel ČEZ, který bylo také nutné přeložit.

**časový vliv na plnění SOd:** ~~MÁ VLIV - prodloužení doby plnění o .....~~ / **NEMÁ VLIV**

Údaje v Kč bez DPH:

| Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL | Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby | Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL | Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby | Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL |
|---|---|---|---|--|
| 0,00                                    | 0,00%   | 53 347,86                               | 0,07%   | 53 347,86                              |

**Vyjádření - souhlas se změnou:**

|                               |                            |       |       |        |
|-------------------------------|----------------------------|-------|-------|--------|
| Projektant (autorský dohled): | souhlasím /<br>nesouhlasím | jméno | datum | podpis |
| TDS:                          | souhlasím /<br>nesouhlasím | jméno | datum | podpis |
| Zhotovitel:                   | souhlasím /<br>nesouhlasím | jméno | datum | podpis |
| Objednavatel:                 | souhlasím /<br>nesouhlasím | jméno | datum | podpis |

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

## Evidenční list změny stavby

|  |  |   |
|--|--|---|
| Název a evidenční číslo stavby:<br><b>Tramvajové mosty ul. Pízeňská, ORG 3150</b><br><br>Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):<br>Tramvajový most ev.č. 5-022 přes ulici Rudnou - SO 201 Tramvajový most ev. č. 5-022 přes ul. Rudnou | Číslo SO/PS /<br>/ číslo změny SO/PS:<br><br>201 / 1 | Číslo změny stavby:<br><br><span style="font-size: 2em;">4</span> |
|--|--|---|

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 30.12.2016, číslo smlouvy objednatele: 3230/2016/OI/VZKÚ; číslo smlouvy zhotovitele: DZ16010831/ve  
 Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451  
 Zhotovitel: Metrostav a.s., se sídlem Koželužská 2460/4, Libeň 160 00 Praha 8, IČO: 00014915

|  |  |
|--|--|
| Gen.projektant (autorský dohled):<br>DOPRAVOPROJEKT OSTRAVA SPOL. S.R.O., se sídlem MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 5/6, 702 00 OSTRAVA., IČO: 42767377<br>Technický dozor stavebníka (TDS):<br>ENVIROAD s.r.o., se sídlem Masná 1493/8 702 00 OSTRAVA, IČO: 25394436 | Přilohy:<br><br>1) Výkres situace<br>2) Stavební deník + Stavební deník VCP, MP<br>3) Zápis z kontrolního dne<br>4) Vyjádření - projektanta DVZ, projektanta DPS a autorského dozoru<br>5) Fotodokumentace<br>6) Rekapitulace rozpočtu<br>7) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet |
|--|--|

**Popis a zdůvodnění změny:**  
Popis: Změna č. 4 - Oprava kanalizační šachty na ul. Rudná  
  
Odůvodnění změny:  
 Při realizaci dopravního značení pro úpravu organizace dopravy, se využívají také přejezdy přes střední dělicí pás, které byly pro tento účel zřízeny. Protože přejezdy nejsou často využívány, byly zaneseny velkou vrstvou nečistot a bahna. Při jejich zprovoznění bylo zjištěno, že asfaltový povrch a šachta kanalizace jsou ve špatném stavu a je nutné provést opravy. Při realizaci projektové dokumentace předchozího stupně nebylo zjištěno jejich skutečný stav vzhledem ke skutečnosti, že přejezdy byly zanesené, přejezd byl nepřístupný v důsledku velkého provozu na sílnici Rudná a namontovaných svodidel. Na základě dopisu policie ČR z 10.4.2017, kde je požadováno okamžité uvedení přejezdů SDP na ul. Rudná do sjízdného stavu a na základě vyjádření prostřednictvím emailu od Moravskoslezského krajského úřadu z 5.4. a z 10.4.2017. a vyjádření ŘSD prostřednictvím emailu z 25.4.2017 dle kterého ŘSD nebude další opravy provádět, bylo rozhodnuto o nutnosti provedení okamžitých oprav zhotovitelem stavby Tramvajové mosty Pízeňská. Zmíněné dopisy jsou přílohou tohoto listu.

časový vliv na plnění SoD: **MÁ VLIV - prodloužení doby plnění o ..... / NEMÁ VLIV**

| Údaje v Kč bez DPH:                     |   |   |   |  |
|---|---|---|---|--|
| Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL | Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby | Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL | Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby | Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL |
| 0,00                                    | 0,00%   | 30 958,13                               | 0,04%   | 30 958,13                              |

**Vyjádření - souhlas se změnou:**

|                               |                            |       |       |        |
|-------------------------------|----------------------------|-------|-------|--------|
| Projektant (autorský dohled): | souhlasím /<br>nesouhlasím | jméno | datum | podpis |
| TDS:                          | souhlasím /<br>nesouhlasím | jméno | datum | podpis |
| Zhotovitel:                   | souhlasím /<br>nesouhlasím | jméno | datum | podpis |
| Objednatel:                   | souhlasím /<br>nesouhlasím | jméno | datum | podpis |

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".  
 Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:



# Rekapitulace změnových listů

Projekt: Tramvajové mosty ul. Pízeňská, mosty 5-022, 5-023

| objekt   | jméno   | cena bez DPH (Kč)    |            |            |           |           |           |           |           |
|----------|---|----------------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|          |   | před změnou          | ZL 1       |            | ZL 2      |           | ZL 3      |           | ZL 4      |
|          |   | vícepráce            | méněpráce  | vícepráce  | méněpráce | vícepráce | méněpráce | vícepráce | méněpráce |
| SO 001   | Demolice tramvajového mostu ev.č. 5-022                         | 3 096 958,66         |            |            |           |           |           |           |           |
| SO 002   | Demolice tramvajového mostu ev.č. 5-023                         | 2 162 836,36         |            |            |           |           |           |           |           |
| SO 201   | Tramvajový most ev. č. 5-022 přes ul. Rudnou                    | 24 262 829,64        | 130 901,59 |            |           |           |           |           |           |
| SO 202   | Tramvajový most ev. č. 5-023 přes železniční a tramvajovou trať | 26 786 288,98        |            | 150 729,84 |           |           |           | 30 958,13 |           |
| SO 401   | Přelozka tracních tramvajových kabelů                           | 2 082 990,98         |            |            |           |           |           |           |           |
| SO 402   | Veřejné osvětlení   | 163 099,80           |            |            |           |           |           |           |           |
| SO 403   | Přelozka kabelů Ovanet  | 0,00                 |            |            |           |           |           | 53 347,86 |           |
| SO 601   | Tramvajová trať - železniční svršek                             | 6 369 153,44         |            |            |           |           |           |           |           |
| SO 602   | Tramvajová trať - železniční spodek                             | 172 297,55           |            |            |           |           |           |           |           |
| SO 603   | Tramvajová trať - splitka                                       | 2 872 480,83         |            |            |           |           |           |           |           |
| SO 604   | Tramvajové vedení   | 2 676 670,57         |            |            |           |           |           |           |           |
| SO 605   | Signalizace provizorního jednokolejového pásu                   | 2 042 594,60         |            |            |           |           |           |           |           |
| SO 606   | Úprava trakce dráhy   | 38 500,00            |            |            |           |           |           |           |           |
| SO 607   | Přelozka optického kabelu ČD-T                                  | 0,00                 |            |            |           |           |           |           |           |
| SO 608.1 | Úprava sdělovacích kabelů SŽDC                                  | 586 460,80           |            |            |           |           |           |           |           |
| SO 608.2 | Úprava zabezpečovacího kabelu SŽDC                              | 307 205,82           |            |            |           |           |           |           |           |
| SO 609   | Úprava kabelu 6kv SŽDC  | 197 783,70           |            |            |           |           |           |           |           |
|          | <b>CELKEM</b>   | <b>73 817 051,73</b> |            |            |           |           |           |           |           |
|          | celkem vícepráce  | 365 937,42           |            |            |           |           |           |           |           |
|          | celkem méněpráce  | 0,00                 |            |            |           |           |           |           |           |
|          | celkem změny  | 365 937,42           |            |            |           |           |           |           |           |
|          | procento z celkové ceny   | 0,50%                |            |            |           |           |           |           |           |

